

工 程 周 报

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济
农业生态大棚集中并网发电项目

2017 年 09 月 15 日第 24 期

常州正衡电力工程
常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期：2017 年 09 月 15 日



1、主要工程施工进度

分项工程	施工工序	计划完成	实际完成	累计完成	工程总量	备注
	定位、放线	100%	100%	100%	100%	1期
		100%	100%	100%	100%	2期
光伏区	支架基础打桩	100%	100%	100%	100%	1期
		10%	5%	95%	100%	2期
	支架安装	100%	100%	100%	100%	1期
		10%	3%	93%	100%	2期
	组件安装	100%	100%	100%	100%	1期
		20%	2%	90%	100%	2期
	防雷接地系统	100%	100%	100%	100%	1期
		20%	5%	80%	100%	2期
	35KV箱逆变基础	100%	100%	100%	100%	1期
		5%	5%	100%	100%	2期
	35KV箱逆变安装	100%	100%	100%	100%	1期
		20%	10%	90%	100%	2期
	汇流箱安装	100%	100%	100%	100%	1期
		20%	0%	85%	100%	2期
	汇流箱接线	100%	100%	100%	100%	1期
		20%	2%	77%	100%	2期
	汇流箱开口电压测量	100%	100%	100%	100%	1期
		20%	5%	80%	100%	2期
	汇流箱到逆变器接线	100%	100%	100%	100%	1期
		50%	0%	70%	100%	2期
35KV箱变-内部接线	100%	100%	100%	100%	1期	
	40%	5%	80%	100%	2期	
电缆敷设及接线	100%	100%	100%	100%	1期	
	40%	5%	80%	100%	2期	
监控、测控系统	0%	0%	0%	100%		
场区道路	100%	100%	100%	100%	1期	
	20%	0%	90%	100%	2期	
场地围栏	20%	10%	100%	100%	1期	
	20%	20%	20%	100%	2期	
35KV配电房	SVG基础及安装	100%	100%	100%	100%	
	SVG设备安装	100%	100%	100%	100%	
	SVG接线	100%	100%	100%	100%	
	接地变压器基础及安装	100%	100%	100%	100%	
	接地变设备安装	100%	100%	100%	100%	
	接地变接线	100%	100%	100%	100%	
	防雷接地系统安装	100%	100%	100%	100%	

	避雷系统	100%	100%	100%	100%	
	接地变安装	100%	100%	100%	100%	
	管理区道路	100%	100%	100%	100%	
	配电房地面施工	100%	100%	100%	100%	
	配电房基础开挖	100%	100%	100%	100%	
	配电房底板浇筑	100%	100%	100%	100%	
	配电房基础浇筑	100%	100%	100%	100%	
	配电房砌墙	100%	100%	100%	100%	
	配电房门窗安装	100%	100%	100%	100%	
	配电房水电安装	100%	100%	100%	100%	
	配电房外墙保温	100%	100%	100%	100%	
	配电房屋面防水	100%	100%	100%	100%	
	配电房楼顶施工	100%	100%	100%	100%	
	综合楼内墙粉墙	100%	100%	100%	100%	
	给排水	100%	100%	100%	100%	
	配电房装璜	100%	100%	100%	100%	
	房内四周接地	100%	100%	100%	100%	
	房内照明	100%	100%	100%	100%	
	高压柜安装	100%	100%	100%	100%	
	低压柜安装	100%	100%	100%	100%	
	控制屏安装	100%	100%	100%	100%	
	二次接线	100%	100%	100%	100%	
综合楼	综合楼地面施工	100%	100%	100%	100%	
	综合楼基础开挖	100%	100%	100%	100%	
	综合楼底板浇筑	100%	100%	100%	100%	
	综合楼基础浇筑	100%	100%	100%	100%	
	综合楼砌墙	100%	100%	100%	100%	
	综合楼门窗安装	100%	100%	100%	100%	
	综合楼水电安装	100%	100%	100%	100%	
	综合楼外墙保温	100%	100%	100%	100%	
	综合楼屋面防水	100%	100%	100%	100%	
	综合楼楼顶施工	100%	100%	100%	100%	
	综合楼内墙粉墙	100%	100%	100%	100%	
	给排水	100%	100%	100%	100%	
	综合楼装璜	100%	100%	100%	100%	
	房内四周接地	100%	100%	100%	100%	
房内照明	100%	100%	100%	100%		
绿化施工	种植土	0%	0%	0%	100%	
	植物材料进场	0%	0%	0%	100%	
	草坪、地被栽植工程	0%	0%	0%	100%	

	计算机监控系统	0%	0%	0%	100%	
	场区电缆耐压	100%	100%	100%	100%	1期
	配电房内设备耐压	100%	100%	100%	100%	
	配电设备定值、调试	100%	100%	100%	100%	
外线 施工	塔基础开挖	100%	100%	100%	100%	共计 28 个
	塔基础浇筑	100%	100%	100%	100%	
	杆塔组装	100%	100%	100%	100%	
	杆塔架线	100%	100%	100%	100%	
发电试运行		100%	100%	100%	100%	已并网

2、设备材料交付进度

序号	设备名称	本周交付数量	累计交付数量	合同总量	备注
1	支架	100%	100%（一期）	100%	已进场
		15%	100%（二期）	100%	已进场
2	组件	100%	100%（一期）	100%	已进场
		20%	100%（二期）	100%	已进场
3	逆变	100%	100%	100%	已进场
4	升压变	100%	100%	100%	已进场
5	电缆	5%	95%	100%（二期）	3*120、2*95 3*50、3*70 3*95
6	电气设备	100%	100%	100%	一二次
7	预制管桩	5%	100%	100%	已进场

3、本周人员出勤率情况

序号		出勤率	备注
1	组件安装	16人	二期
2	支架安装	12人	二期
3	组件公母头串接	4人	二期
4	阵列间接地焊接	2人	二期

5	桩头支柱防腐	2人	二期
6	二期汇流箱安装、电缆头制作	15人	二期
7	4平方线板面会线	8人	二期
7	二期剩余土地打桩、桩头支柱焊接	6人	二期
8	二期电缆沟开挖、回填	4人	二期
9	二期电缆放线	12人	二期
10	二期围栏安装	2人	二期
	管理人员	6人	89人

4、图纸会审及设计交底情况：

1、监理单位对工艺的要求提出注意重点要求总包按标准、按图纸、按工艺严格施工。

5、主要工序和设备材料质量情况

序号	问题描述	监理工作联系单 / 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	二期个别檩条与支架间螺丝未上	监理工作联系单 CZGF-25	未整改	
2	二期檩条弹簧垫未上	整改消缺记录表	未整改	

6、款项支付情况

7、安全文明施工情况

序号	问题描述	会议纪要/ 监理工作联系单/	是/否已整改	备注
----	------	-------------------	--------	----

		监理工程师通知单		
1	现场个别施工人员不戴安全帽		未整改	

8、存在问题及对策建议

序号	存在问题	对策建议	备注
1	站区及光伏区二期接地扁铁规格问题	按图施工	
2	施工方拖欠工人工资导致不定期停工	施工方自行协调处理	

9、下周主要工作事项


序号	主要事项内容	责任人	备注
1	电缆沟开挖、接地沟开挖、回填（二期）	总包	
2	桩头支柱防腐	总包	
3	交直流电缆接线	总包	
4	二期箱逆变安装、接线	总包	
5	阵列间接地焊接	总包	
6	二期打桩，支架安装，组件安装、桩头支柱焊接	总包	
7	二期汇流箱安装、接线	总包	
8	二期4平方线板面会线	总包	
9	二期围栏安装	总包	
10	一期场区围栏消缺	总包	
11	一期场区问题消缺	总包	监理发出消缺联系单

10、工程照片





二期剩余土地桩机打桩
2017-09-12

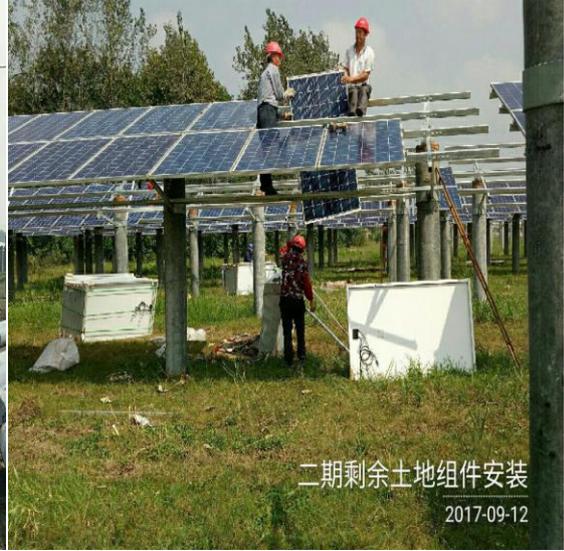

二期剩余土地组件安装
2017-09-12



二期剩余土地檩条安装
2017-09-12



二期剩余土地桩头支柱焊接
2017-09-12



二期剩余土地箱逆变基础
2017-09-12



二期剩余土地管桩布料
2017-09-13



二期剩余土地阵列间接地焊接
2017-09-13



国家电网人员场区视察
2017-09-13



二期箱逆变安装
2017-09-14



二期组件安装
2017-09-14



二期围栏施工
2017-09-14



二期箱逆变基础拆模
2017-09-14



二期剩余土地汇流箱接线
2017-09-15



二期剩余土地环网接地沟开挖
2017-09-15



接地扁铁防腐
2017-09-15



二期剩余土地支架安装
2017-09-15



二期剩余土地环网接地
2017-09-15
