

监理周报

项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站送出输变电工程




时间 2017/11/22

项目地：禹州市苌庄乡梨园沟村

本周 施工 概括	一、220kV 线路送出工程： 1、G9-G10、通道协调 2、G8-G16 架线 3、G19-G23 架线、附件安装 4、G24-龙门架导线、附件安装 5、G16-G17 树木清障 二、35kV 集电线路工程： 1、C11 电缆沟通道协调 2、地埋电缆运输 3、资料整理、报审 三、升压站 1、资料整理、报审 2、IP 地址办理 3、联调联试厂家到场协调
施工 质量 问题	升压站、220kV 线路、35kV 线路质量均在可控范围内。
材料 进场 情况	无
材料 进场 检验	无
隐蔽 验收 情况	升压站：无 220 线路：无 35 线路：无
发文	升压站：联系单 1 份、通知单无

情况	220 线路：联系单无、通知单无 35 线路：联系单 1 份、通知单无														
安全 情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围														
下周 工作 重点	1、 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检验验收 做好现场材料的进场管控 升压站： 1、 剩余电气消缺 2、 联调联试 11 月 24 号开始 3、 资料报审 220kV 线路送出工程： 1、 G8-G16 附件安装 2-3 天内完成 2、 接地电阻测试 3、 标志标牌悬挂 4、 资料报审 35kV 集电线路工程： 1、 C11 下塔电缆敷设计划 11 月 24 号开始 2、 下塔电缆连接 3、 接地电阻测试 4、 标志标牌悬挂 5、 资料报审 3、 保证安全施工、做好安全检查记录														
天气	<table><tr><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td></tr><tr><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>雪</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td></tr></table>	16	17	18	19	20	21	22	晴	晴	晴	雪	晴	晴	晴
16	17	18	19	20	21	22									
晴	晴	晴	雪	晴	晴	晴									

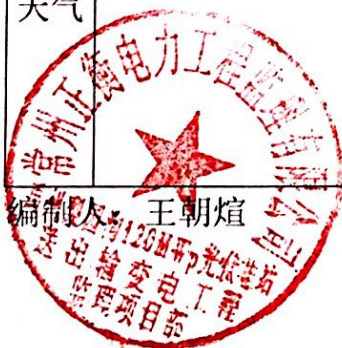

编制时间： 2017 年 11 月 22 日
