

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 03 期

项目： 青岛海誉车辆机械有限公司一期 6MW 分布式屋顶光伏发电项目		填报周期：2017 年 5 月 1 日— 5 月 7 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、檩条安装完成 30%；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装		檩条安装完成 30%。		
6、逆变器及箱变				
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况		有支架安装图纸，其他未见。		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架、夹具	2017 年 4 月 7 日 -2017 年 4 月 30 日	夹具已到货 100%； 檩条到货 30%	夹具累计到货 100%； 檩条累计到货 30%；
	组件，电	2017 年 4		

	缆, 逆变器, 汇流箱	月 8 日 -2017 年 5 月 2 日		
	开关站, 对 侧站一二 次设备、电 缆, 外线电 缆	2017 年 4 月 8 日 -2017 年 5 月 2 日		
11、人员/机械 情况				
三、截止本周工程建设进度与施工组织设计的进度比对及分析:				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施 (简述)
1、首个基础施 工				
2、首套组件安 装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单 元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调 的问题				
未解决的协调 问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开 关站工程				


4、组件区域工程	檩条安装全部完成；
5、逆变/箱变工程	基础开挖；
6、外线工程	
7、其他	

填报人： 常青 审核人： 胡德林 时间： 2017年05月07日

工程现场照片（含文字描述）：



檩条进场

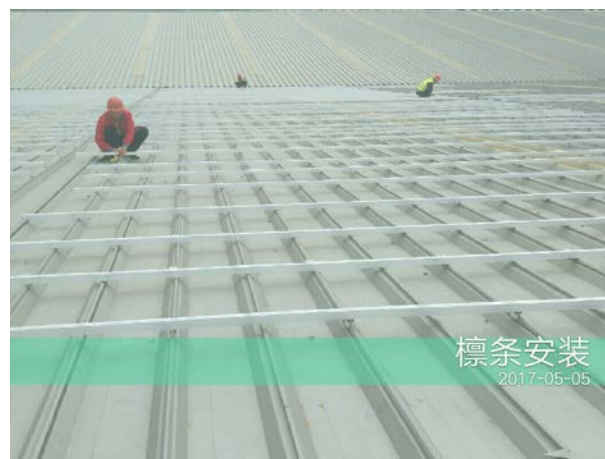

檩条安装
