

监 理 周 报

项目名称：丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

编号：GFED——001

项目地：丽江古城区吉祥商贸城

时间：2017/05/19

本周 施工 概况	1、围栏防护安装完成 4 个屋顶； 2、夹具安装完成 2 个屋顶； 3、箱变基础开挖完成 2 个； 4、支架安装完成 2 个屋顶； 5、外线电缆敷设完成约 400 米； 6、厂区电缆沟路面切割完成约 30 米；
施工 质量 情况	安装夹具时，部分夹具上胶漏打；部分支架连接处间隙过大
材料进场 情况	良好
材料 进场 检验	良好
隐蔽 验收 情况	
发文 情况	
收文 情况	


安全情况	个别施工人员未戴安全帽，已口头通知并整改完毕。						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在 15 人左右。						
天气	15	16	17	18	19	20	21
	小雨	小雨	多云	多云	晴	晴	晴

编制人：兰海宇 审核人：

编制时间：2017 年 05 月 19 日

支架进场测量

外线电缆敷设

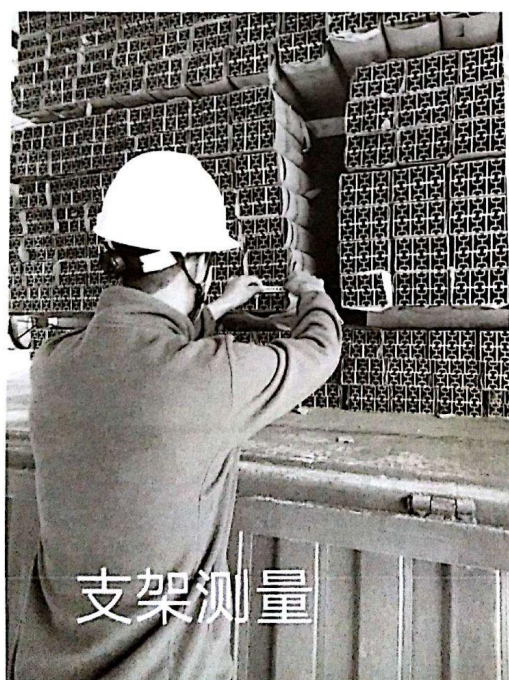

支架测量




外线电缆敷设

1—7#屋顶夹具安装



7#屋面夹具安装

箱变基础开挖

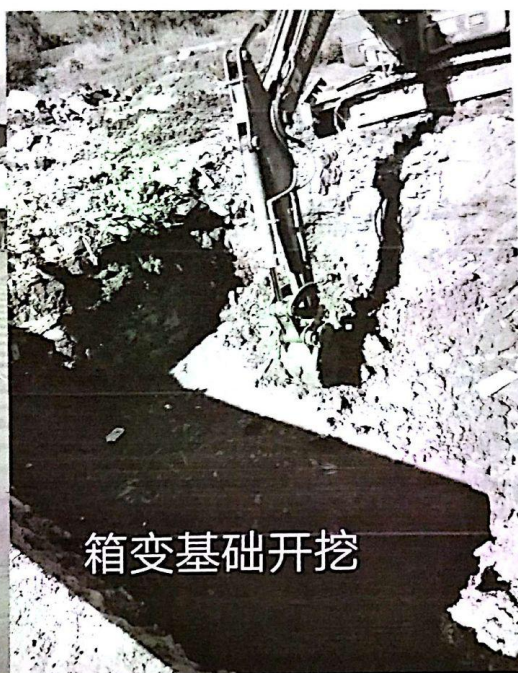


箱变基础开挖

安全情况	个别施工人员未戴安全帽，已口头通知并整改完毕。						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在 15 人左右。						
天气	15	16	17	18	19	20	21
	小雨	小雨	多云	多云	晴	晴	晴

编制人：兰海宇 审核人：

编制时间：2017 年 05 月 19 日

支架进场测量

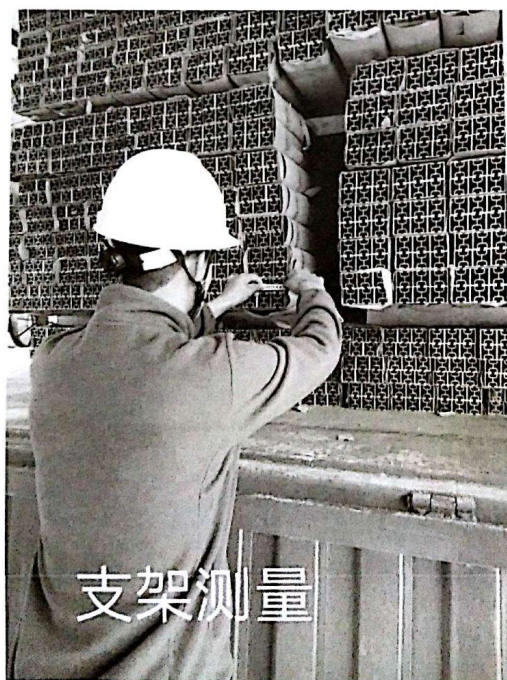

支架测量

外线电缆敷设




外线电缆敷设

1—7#屋顶夹具安装



7#屋面夹具安装

箱变基础开挖

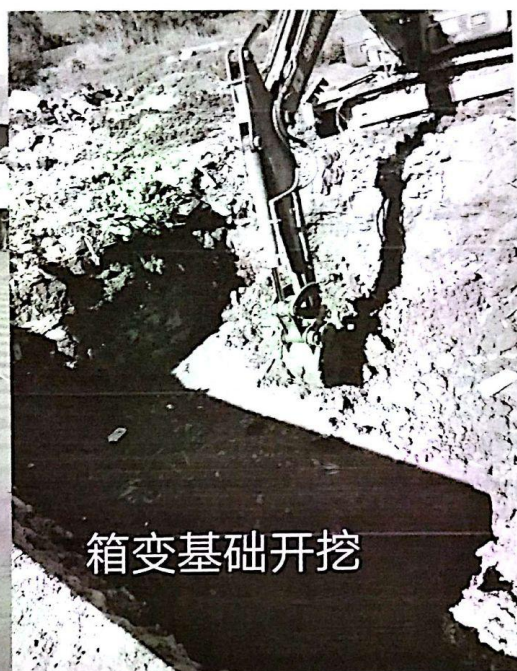

箱变基础开挖
