

监 理 周 报

项目名称：丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

编号：GFJD—004

项目地：丽江古城区吉祥商贸城

时间：2017/06/09

本周 施工 概况	1、围栏防护安装完成； 2、夹具安装完成 4 个屋顶；（一共安装完成 16 个屋顶） 3、箱变基础开挖完成；（一共开挖完成 9 个基础） 4、支架安装完成 6 个屋顶；（一共安装完成 16 个屋顶） 5、外线电缆敷设完成；（一共敷设完成 5180 米） 6、厂区电缆沟路面切割完成； 7、屋顶组件安装完成；（一共安装完成 16 个屋顶） 8、箱变基础混凝土浇筑完成；（一共浇筑完成 9 个基础） 9、逆变器、汇流箱平台加工及安装完成 7 个屋顶； 10、光伏区电缆敷设完成 500 米；
施工 质量 情况	部分组件安装不顺直；部分支架螺帽不紧固；部分支架连接处间隙过大。
材料进场 情况	良好
材料 进场 检验	良好
隐蔽 验收 情况	4#、5#、8#、9#箱变基础钢筋模板加工及混凝土浇筑


发文情况							
收文情况							
安全情况	高空作业时，个别施工人员未系安全带，已口头通知并整改完毕；个别施工人员佩戴安全帽不规范，已口头通知并整改完毕；个别施工人员在现场有抽烟现象，已口头通知。						
下周工作要点	1、逆变器、汇流箱平台加工机安装完成； 2、厂区电缆敷设完成； 3、开关站一次、二次设备安装及接线完成；						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在 80 左右。						
天气	5	6	7	8	9	10	11
	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴

编制人：兰海宇 审核人：


编制时间：2017年06月09日



9#箱变基础混凝土浇筑

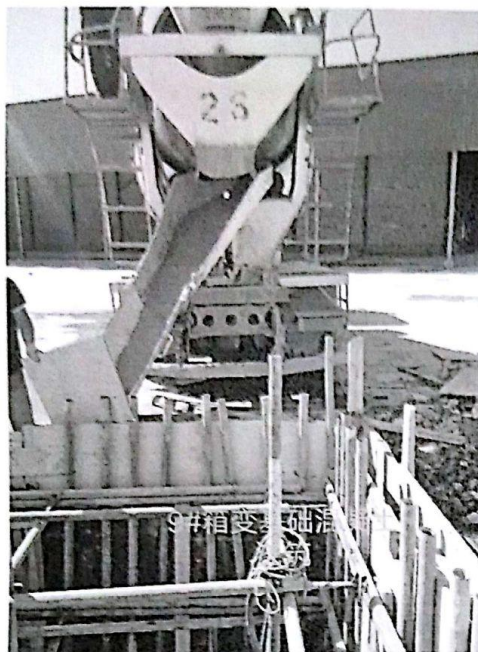

2—8#屋顶组件安装

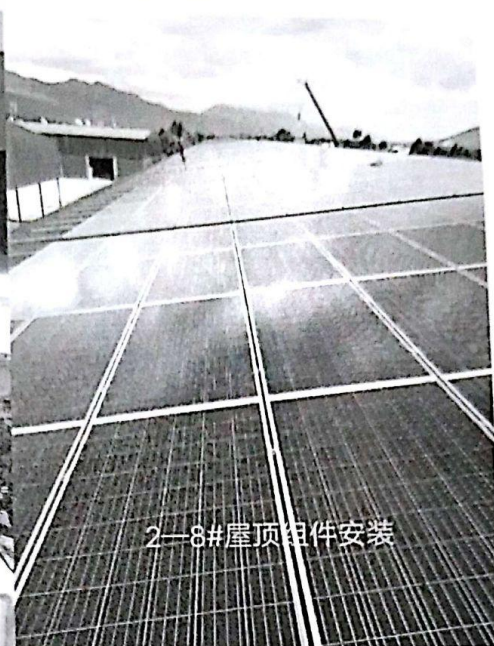

逆变器、汇流箱安装



光伏区电缆敷设

8#箱变做耐压试验



电缆敷设
