

监 理 周 报

项目名称：丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

编号：GFFD—005

项目地：丽江古城区吉祥商贸城

时间：2017/06/16

本周 施工 概况	<ol style="list-style-type: none">1、围栏防护安装完成；2、夹具安装完成 16 个屋顶；（5MW 屋顶夹具已安装完成）3、箱变基础开挖完成；（一共开挖完成 9 个基础）4、支架安装完成 16 个屋顶；（5MW 屋顶支架已组装完成）5、组件安装完成 16 个屋顶；（5MW 屋顶组件已安装完成）6、逆变器、汇流箱平台加工及安装完成 4 个屋顶；（一共安装完成 11 个屋顶）7、光伏区电缆敷设完成 500 米；（一共敷设完成 1000 米）8、4 平方直流电缆敷设完成 10 个屋顶；9、桥架安装完成 10 个屋顶；10、开关站一次、二次设备调试；
施工 质量 情况	安装夹具时，部分夹具上胶漏打；部分支架连接处间隙过大；部分组件安装不顺直
材料进场 情况	良好
材料 进场 检验	良好
隐蔽 验收 情况	施工现场电缆敷设

发文情况							
收文情况							
安全情况	个别施工人员佩戴安全帽不规范，已口头通知并整改完毕；吊装作业时，现场未放置安全标语标牌，已口头通知并整改完毕。						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在 80 人左右。						
天气	12	13	14	15	16	17	18
	晴	晴	阵雨	晴	晴	晴	多云


编制人：兰海宇 审核人：

编制时间：2017年06月16日



厂区电缆敷设

2-4#屋顶桥架安装

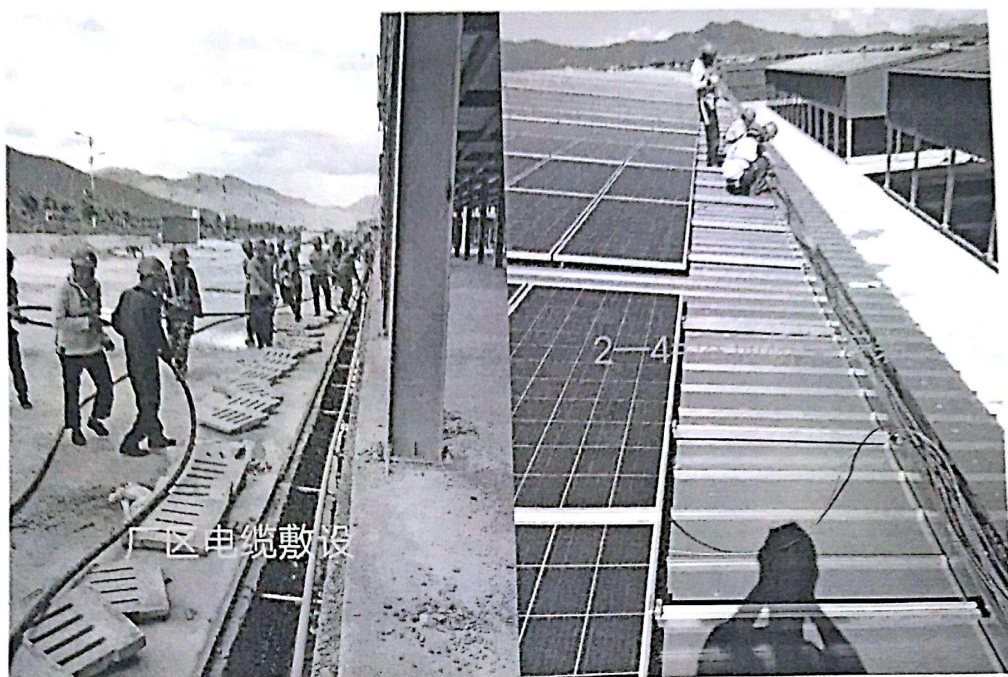

开关站设备调试
