

监 理 周 报

项目名称：丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

编号：GFJD—007

项目地：丽江古城区建材家居商城

时间：2017/06/30

本周 施工 概况	1、围栏防护安装完成； 2、夹具一共安装完成 16 个屋顶； 3、箱变基础开挖完成；（一共开挖完成 9 个基础） 4、支架一共安装完成 16 个屋顶； 5、外线电缆敷设完成；（一共敷设完成 5180 米） 6、厂区电缆沟路面切割完成； 7、屋顶组件一共安装完成 16 个屋顶； 8、箱变基础混凝土浇筑完成；（一共浇筑完成 9 个基础） 9、逆变器、汇流箱平台加工及安装完成 16 个屋顶； 10、光伏区电缆敷设完成； 11、6 月 29 日项目并网投运；
施工 质量 情况	部分桥架安装不顺直；部分支架螺帽不紧固；部分支架连接处间隙过大。
材料进场 情况	良好
材料 进场 检验	良好
隐蔽	厂区电缆敷设

伏

验收情况							
发文情况							
收文情况							
安全情况	高空作业时，个别施工人员未系安全带，已口头通知并整改完毕；个别施工人员佩戴安全帽不规范，已口头通知并整改完毕；个别施工人员在现场有抽烟现象，已口头通知。						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在 60 人左右。						
天气	26	27	28	29	30	1	2
	中雨	多云	晴	阵雨	中雨	多云	中雨

编制人：兰海宇 审核人：


编制时间：2017 年 06 月 30 日




项目顺利并网投运



1#箱变合闸

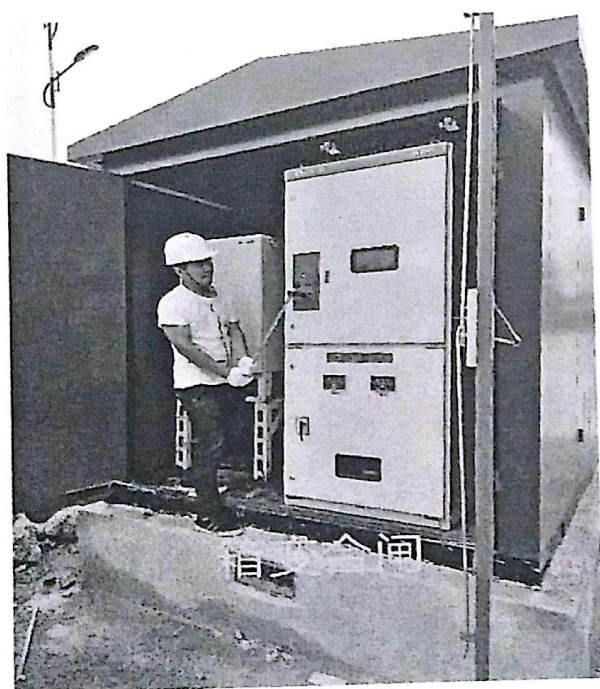

2—1#屋顶支架组装

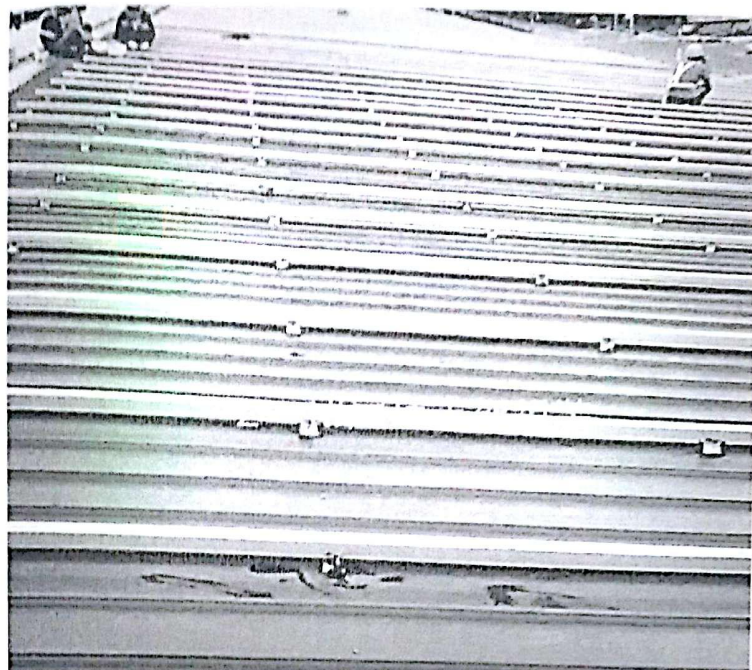

1—6#屋顶组件安装

