

陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 周 报

（9 月 第 3 周 共累计*2 周）

编 制 时 间：2017.09.16

监理单位编制人：杨铃铃

监理单位审核人：生金文

常州正衡电力工程监理有限公司

陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监理部

项目名称：陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：陕西顺协盈建筑工程有限公司

一、 工程概况：

工程地点位于西安经济技术开发区泾渭工业园泾诚路中段 8 号 工程项目规模

项目本期规模 2206.09 千瓦，规划规模为 4000 千瓦，经双方商定，本项目电能消纳方式为全额上网。

二、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基础、电缆沟等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1		车棚基础施工	基础开挖及回填	基础开挖回填	100%
2		厂房加固	联合厂房加固	联合厂房加固	100%
3					
4					
5					

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、架空线路及电缆、其他电气安装等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
----	------	--------	----------	----------	------------

1		车棚框架施工	立柱及斜梁焊接	立柱及斜梁焊接	100%
2					
3					
4					
5					

3、进度情况分析：

四、进场材料、构配件、设备一览表

序号	（进场材料、构配件、设备）名称	进场时间 （年月日）	进场数量 （单位）	拟用部位
1				暂无材料进场
2				
3				
4				
5				

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

管理人员：杨铃铃

2、施工单位：陕西顺协盈建筑工程有限公司

（1）管理人员：冯登辉

（2）生产工人：

土建专业：

安装专业：

六、施工质量检查情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
----	--------	------	----------

1	材料、 构配 件、设 备进场 验收	1	合格证质量报告以检查
		2	
		3	
		4	
		5	
2	监理旁 站项目	1	
		2	
		3	
		4	
		5	
3	施工质 量检查 记录	1、现场安全文明施工	
		2、车棚基础深度宽度测量	监理检查记录表
		3、立柱拖板焊接	
		4	
		5	
4	隐蔽工 程质量 验收	1、德仕 2#屋面及联合厂房屋面加固验收	仓房加固初验
		2	
		3、	
		4	
		5	
5	分部分 项工程 验收	1、车棚焊接及厂房加固	监理初验记录表
		2	
		3	
		4	
		5	
6	其他	1	
		2	
		3	
		4	

七、施工质量问题

（一）上周质量问题的整改情况（完成时间、达到的合格标准）。

1、土建工程质量问题：

2、安装工程质量问题：

3、其他质量问题：

（二）本周检查的质量问题（出现部位、原因等）及整改要求（完成时间、达到的合格标准）

1、土建工程质量问题：车棚立柱基础混凝土抹面出现裂痕，且不规则以要求重

新整改。

2、安装工程质量问题：联合厂房南部烤漆车间加固采用打孔加固方式且东部第一快未加固

3、其他质量问题：车棚东部斜拉筋紧固不到位

八、安全文明施工

星期天对电气人员进场进行安全技术交底会议并形成会议纪要

九、沟通协调

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

1、设计变更：

2、工程签证：

3、其他：

十一、天气统计表。

日期 天气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴			晴				
雨						雨	雨
阴	阴	阴		阴	阴		
雾							
温湿度							

十二、监理工作统计表：

序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议	1		1	
2	审批施工组织设计（方案）				
3	审核施工图纸				
4	发出监理通知				
5	审批分包单位				
6	原材料审批				
7	构配件审批				
8	设备审批				
9	分项（检验批）工程质量验收	2		2	车棚及厂房加固验收
10	分部（子分部）工程质量验收				
11	不合格项验收				
12	监理抽查复试				
13	监理见证取样				
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备				
15					
16					

十三、本周监理工作小结：本周主要进行厂房加固及车棚施工作业，现场质量及安全方面基本可控，并对完成施工的车棚及厂房加固初验，并对检查出的问题进行记录形成初验记录表，送呈业主及施工单位限期整改。电气人员进场进行爬梯焊接

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	车棚喷底漆	面漆完成及偶撑安装
图片	 图片格式大小：6*8	
文字描述		

图片	拉筋安装 	 屋面偶撑检查
文字描述	屋面拉筋检查	厂房加固后修复
图片		 车棚焊接

二、质量检查影像

文字描述		
-------------	--	--

图 片	 饰品厂库双成加固	 屋面检查
文字 描述	采光带未恢复到原位	
图 片		
文字 描述		

图 片		
--------	--	--

三、质量问题影像

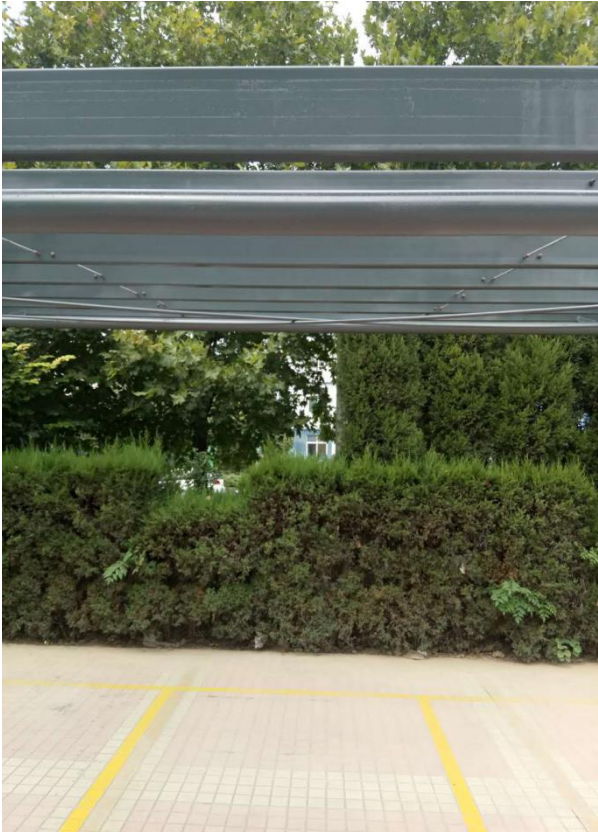
文字 描述	车棚拉筋松动	立柱基础抹面不规范
图 片		
文字 描述		

图 片		
文字 描述		
图 片		

四、安全文明施工影像

文字 描述		
图 片		
文字		安全带安全帽齐全

描述		
图 片		
文字 描述	爬梯焊接	安全员在岗
图 片		

五、其他施工事宜影像

文字 描述		
----------	--	--

图 片		
文字 描述		
图 片		
文字 描述		
图 片		
