


编号: ZJH/ZJL-20171210

监 理 周 报

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300kw 分布式光伏发电项目

2017 年 12 月 第二期 (总第六期)

监理项目部 (章):

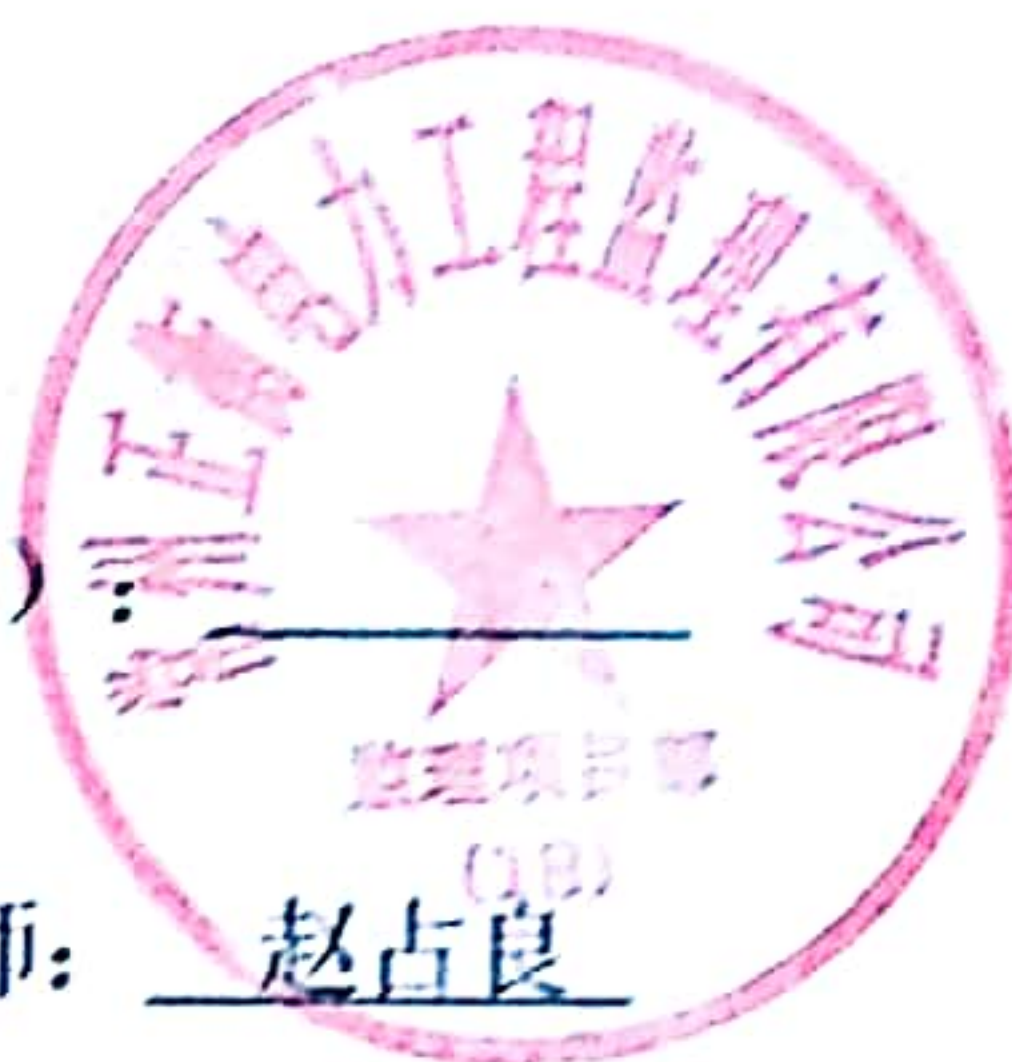

总监理工程师: 赵占良

报告日期: 2017 年 12 月 10 日

监理周报

一、本周工程实施情况（形象进度表、照片）

1、施工进度：

水泥顶屋面支架基础浇筑全部完成；拆模完成；

2、设计图纸情况

图纸未见；

3、工程资料情况

已上报，已审批；

4、质量、安全情况

本周进行水泥顶屋面支架基础混凝土拆模工作，由于气温较低，施工单位拆模前确保混凝土有足够的养护凝固时间，拆模后混凝土外观较好，符合要求；

安全文明措施到位，现场工人均佩戴安全帽，并工完场清；

5、需协调事宜

无；

二、本周监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

1、工程进度控制：

自 12 月 5 日支架基础拆模后由于支架材料未进场，现场已停止施工，监理要求施工单位抓紧落实支架材料进场事宜，并发出联系单。

2、工程质量控制：

监督施工单位确保混凝土养护时间后进行拆模，拆模时规范施工，杜绝野蛮作业，经查拆模后现场情况较好，符合要求；

3、安全生产管理控制：

监督施工单位做好现场安全文明管理工作，确保现场所有人员佩戴安全帽等劳保用品，下班前做到工完场清；

三、工程存在问题及建议

现场由于支架材料未进场已停工，已发联系单要求施工单位抓紧落实；

四、下周监理工作重点

1、与建设单位代表一起检查现场情况并确定设备基础位置；

2、管理好现场安全文明情况和支架安装质量；



常州正衡电力工程监理有限公司监理
海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

2017 年 12 月 10 日
