


编号: Z11JL-Z1B-20180107

监 理 周 报

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

2018年01月 第一期(总第十期)

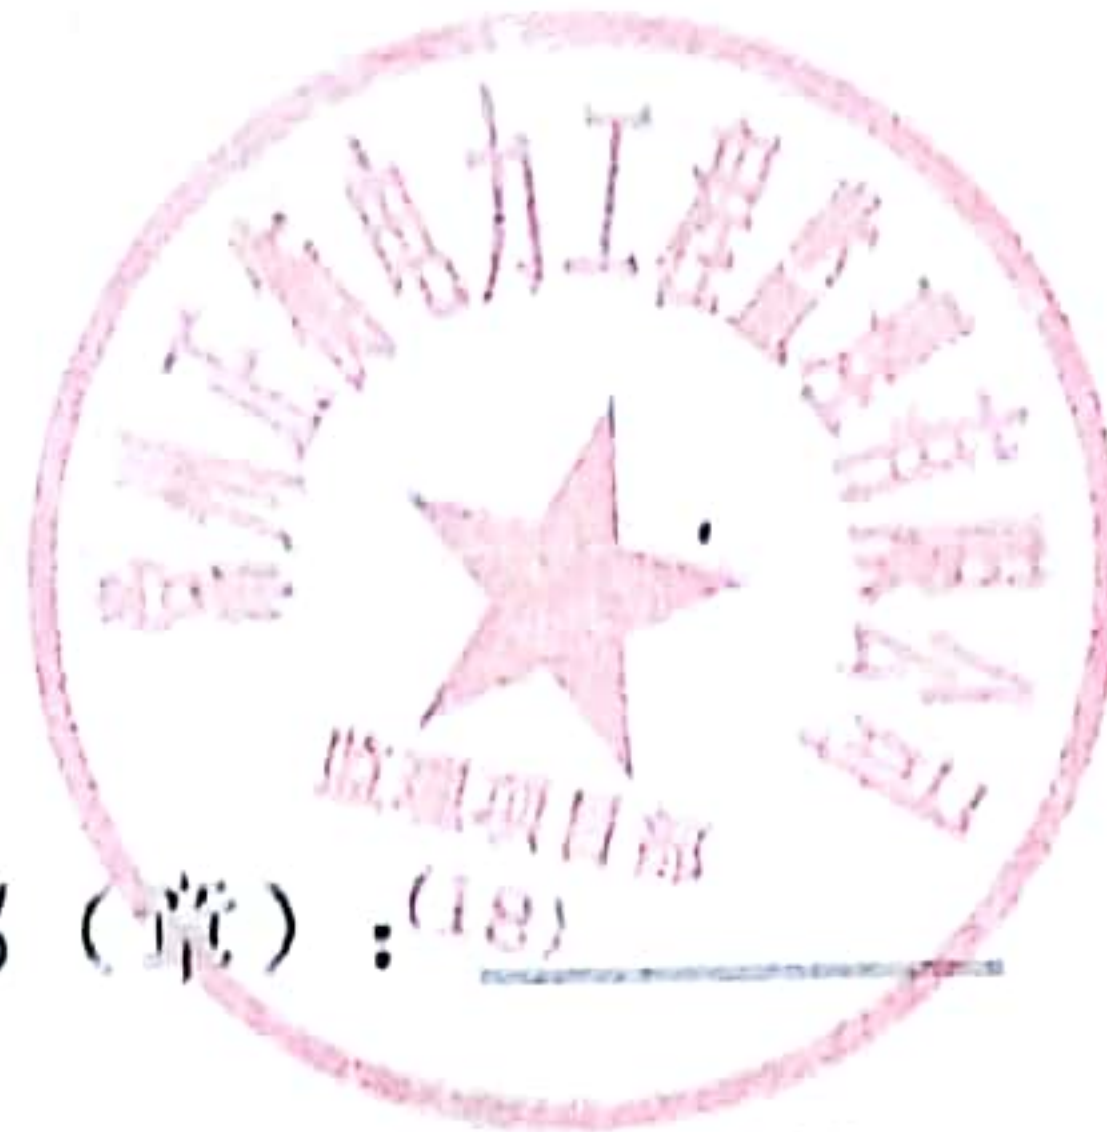

监理项目部 (章): (18)

总监理工程师: 赵良

报告日期: 2018年01月07日

监理周报

一、本周工程实施情况（形象进度表、照片）

1、施工进度：

无进度；

2、设计图纸情况

图纸未见；

3、工程资料情况

已上报，已审批；

4、质量、安全情况

2018年1月2日彩钢瓦屋面组件进场吊装分散；

2018年1月5日至6日组件安装；

现场安装质量合格，安全文明措施到位，符合要求；

5、需协调事宜

无；

二、本周监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

1、工程进度控制：

要求施工单位组织好人员抓紧组件安装的同时提醒施工单位下雨天现场为确保安全停止现场施工；

2、工程质量控制：

现场监督施工单位组件安装，并发出监理工作联系单，提醒组件安装质量注意事项；

3、安全生产管理控制：

现场监督施工单位安全文明情况，旁站组件吊运分散工作，下发监理工作联系单要求施工单位雨天停止施工；

三、工程存在问题及建议

无；

四、下周监理工作重点

监督施工现场的组件安装质量和安全文明情况，确保质量合格和安全无事故；

常州正衡电力工程监理有限公司 监理

海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

2018年01月07日
