

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 第 三 期

项目：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2017 年 11 月 5 日—11 月 11 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
至 2017 年 11 月 11 日止，焊装车间卸料平台搭设完成，屋面围栏搭设完成，屋面夹具安装完成 95%，檩条安装完成 70%；总装车间西侧箱变基础开挖完成，基础垫层浇筑完成，基础地梁浇筑完成，基础圈梁浇筑完成 70%，电缆沟开挖完成 90%，卸料平台搭设完成，屋面围栏搭设完成 80%；辅料库后侧箱变基础挖土完成，基础地梁浇筑完成，基础圈梁浇筑完成，基础墙面粉刷完成 70%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、组件安装	暂无施工			
6、逆变器及箱变	暂无施工			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	暂无施工			
9、出图情况	已出			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	檩条	2017.11.5	2017.11.7	50%
	夹具	2017.10.11	2017.10.13	50%

	组件	2017.11.5	2017.11.5	10%
11、人员/机械情况	挖机一台 吊车一台 施工人员 50 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	无	无	无	
2、首套组件安装	无	无	无	
3、线路倒送电	无	无	无	
4、首个发电单元并网	无	无	无	
5、全容量并网	无	无	无	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	焊装车间檩条、夹具大面积安装			
5、逆变/箱变工程	箱逆变基础施工			
6、外线工程	无			

7、其他

无



填报人: 廖国定 审核人: 梅迪 时间: 2017 年 11 月 11 日



工程现场照片(含文字描述):

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

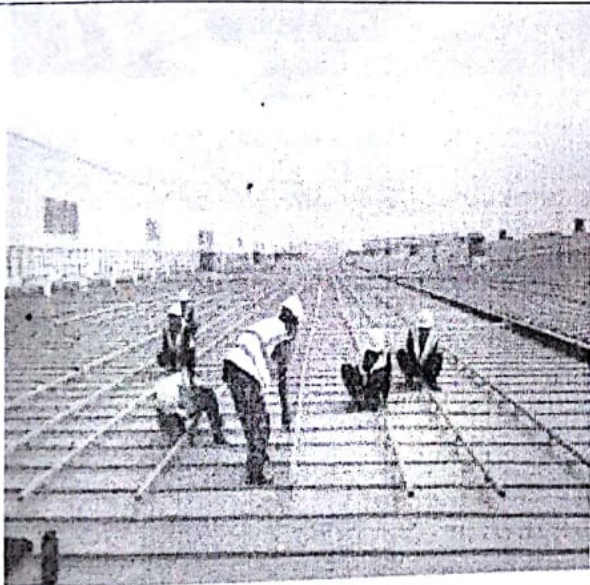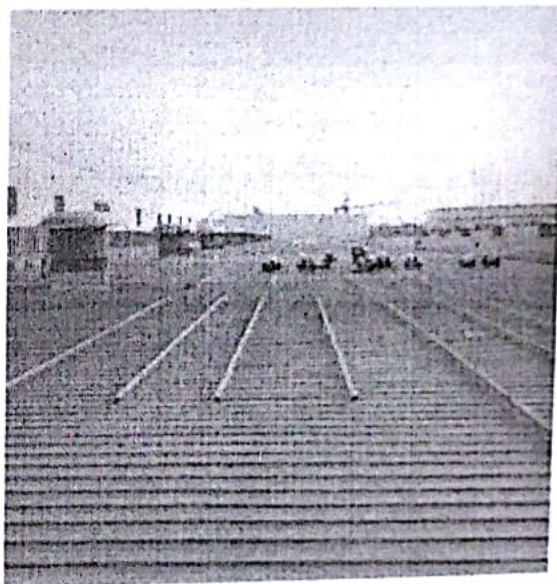文字描述	焊装车间屋面檩条安装	焊装车间屋面檩条安装
图片		
文字描述	辅料库后侧钢管焊接	辅料库后侧墙面粉刷
图片		

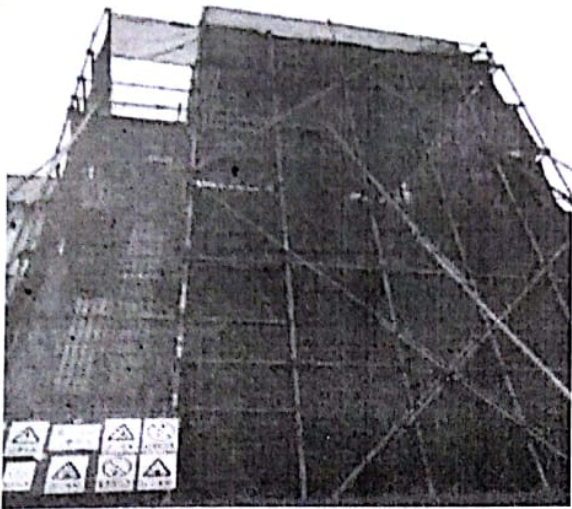
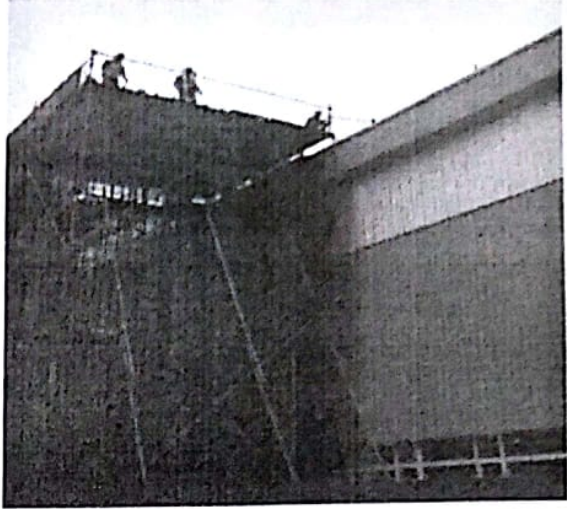
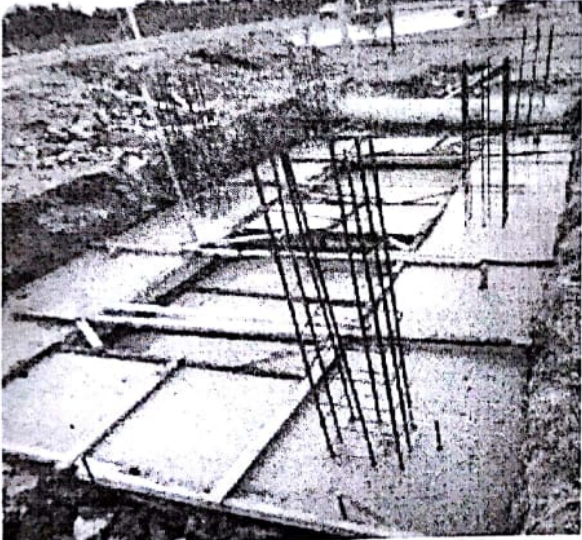

文字 描述	总装车间西侧卸料平台挂牌使用	总装车间西侧屋面临边围护
图片		
文字 描述	总装车间西侧电缆沟开挖	总装车间西侧电缆沟开挖
图片		
文字 描述	总装车间西侧基础墙砖砌筑	总装车间西侧基础墙砖砌筑

图 片		
文字 描述	总装车间西侧基础地梁浇筑	总装车间西侧基础圈梁浇筑
图 片		

二、质量检查影像

文字 描述	辅料库后侧材料抽检	
图 片		

文字描述	坪装车间屋面檩条安装检查质量	
图片		

三、安全文明施工影像

文字描述	材料吊运旁站	材料吊运旁站
图片		
