

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 第 九 期

项目：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2017 年 12 月 17 日—12 月 23 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
至 2017 年 12 月 24 日止，焊装车间卸料平台搭设完成，屋面围栏搭设完成，屋面夹具安装完成 100%，檩条安装完成 80%，组件已开始吊装分散，桥架开始修建；总装车间西侧箱变基础开挖完成，基础垫层浇筑完成，基础地梁浇筑完成，基础圈梁浇筑完成，电缆沟开挖完成，卸料平台搭设完成，屋面围栏搭设完成 80%，屋面定点划线完成 40%，夹具安装已完成 10%，檩条已分散；辅料库后侧箱变基础挖土完成，基础地梁浇筑完成，基础圈梁浇筑完成，基础墙面粉刷完成，三台箱变已吊运开始接线，电缆沟开挖完工，高低压电缆、光纤已敷设完工，高压柜已拼接完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、组件安装	焊装车间安装檩条 80%，总装车间定位画线 40%，夹具安装 10%			
6、逆变器及箱变	箱变基础修筑完成 80%，吊装三台箱变			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	高压柜耐压试验			
9、出图情况	已出			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	电缆	2017.12.20	2017.12.20	1000M
	配电柜	2017.12.18	2017.12.18	2 台

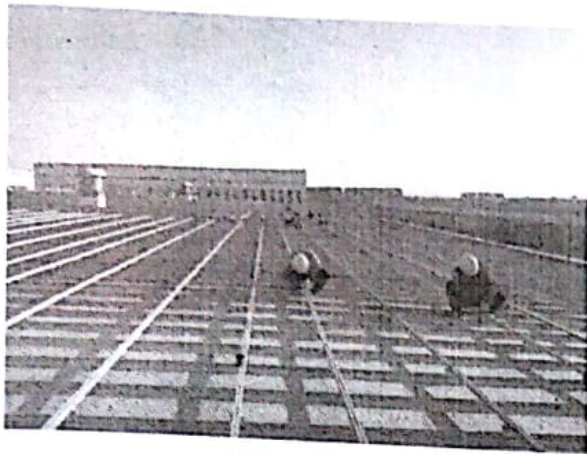
	电缆桥架	2017.12.20	2017.12.20	50%
11、人员/机械情况	吊车一辆 施工人员 60			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析:				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施(简述)
1、首个基础施工	无	无	无	
2、首套组件安装	无	无	无	
3、线路倒送电	无	无	无	
4、首个发电单元并网	无	无	无	
5、全容量并网	无	无	无	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	焊装车间安装檩条 80%，总装车间定位画线 40%，夹具安装 10%			
5、逆变/箱变工程	箱变基础修筑完成 80%，吊装三台箱变			
6、外线工程	无			
7、其他	无			

填报人: 邵米 审核人: 梅发 时间: 2017 年 12 月 23 日

工程现场照片(含文字描述):

一、形象进度影像

文字描述 图片	总装车间屋顶吊装夹具檩条	12#箱变基础抹灰
	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称：浙江吉利汽车湖州V5项目 12MW分布式光伏发电站 地址：浙江省湖州市长兴县煤山镇 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 2017/12/18	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称：浙江吉利汽车湖州V5项目 12MW分布式光伏发电站 地址：浙江省湖州市长兴县煤山镇 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 2017/12/18
文字描述 图片	总装车间檩条分散	7#8#箱变基础砼浇筑
	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称：浙江吉利汽车湖州V5项目 12MW分布式光伏发电站 地址：浙江省湖州市长兴县煤山镇 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 2017/12/18	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称：浙江吉利汽车湖州V5项目 12MW分布式光伏发电站 地址：浙江省湖州市长兴县煤山镇 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 2017/12/19
文字描述 图片	挖电缆沟	
	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称：浙江吉利汽车湖州V5项目 12MW分布式光伏发电站 地址：浙江省湖州市长兴县煤山镇 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 2017/12/21	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称：浙江吉利汽车湖州V5项目 12MW分布式光伏发电站 地址：浙江省湖州市长兴县煤山镇 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 2017/12/21

文字描述	夹具安装	敷设电缆管道
图片		
文字描述	砌电缆井	箱变基础回填
图片		
文字描述	高压电缆安装	箱变吊装
图片		

文字描述	高压柜安装	高压电缆接头
图片		

二、质量检查影像

文字描述	夹具检查	夹具检查
图片		
文字描述	电缆管道检查	箱变耐压测试



三、安全文明施工影像

文字描述	逆变基础砼浇筑旁站
图片	
文字描述	箱变吊装旁站
图片	
