

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 第 二 十 二 期

项目：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2018 年 4 月 23 日—4 月 29 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
至 2018 年 4 月 29 日止，焊装车间屋顶桥架盖板完工 100%，屋面垃圾清理，防锈工作已全部做到位；总装车间屋顶桥架盖板完工 80%；生产车间桥架盖板、扁铁固定开始安装；箱变基础周围土地整平铺砖完成 40%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、组件安装	焊装车间，扁铁接地 100%；总装车间夹具安装 100%，檩条安装 100%，组件安装完成 100%；生产车间檩条安装 100%，组件安装 100%			
6、逆变器及箱变	箱变基础修筑完工，箱变已全部吊装到位，电缆沟完工			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	暂无			
9、出图情况	已出			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
11、人员/机械	吊车一辆 施工人员 40			

情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析:				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施(简述)
1、首个基础施工	无	无	无	
2、首套组件安装	无	无	无	
3、线路倒送电	无	无	无	
4、首个发电单元并网	无	无	无	
5、全容量并网	无	无	无	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	焊装车间,扁铁接地 100%;总装车间夹具安装 100%, 檩条安装 100%, 组件安装完成 100%;生产车间檩条安装 100%, 组件安装 100%			
5、逆变/箱变工程	箱变基础修筑完工,箱变已全部吊装到位,电缆沟完工			
6、外线工程	无			
7、其他	无			

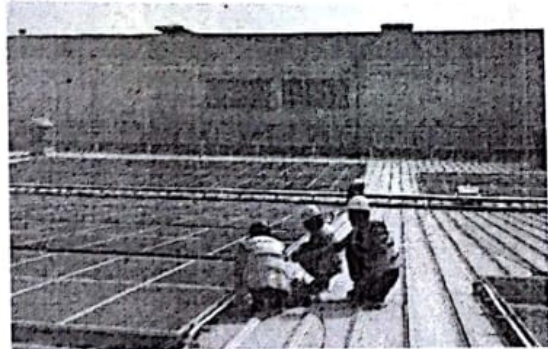
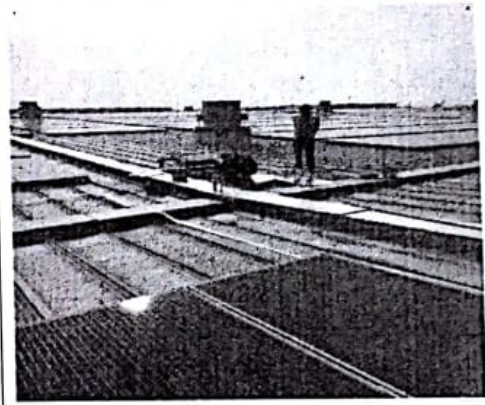
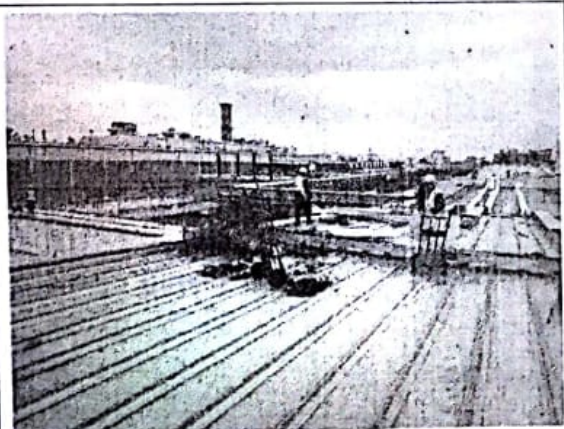
填报人: 郭光涛 审核人: 张波 时间: 2018 年 4 月 27 日

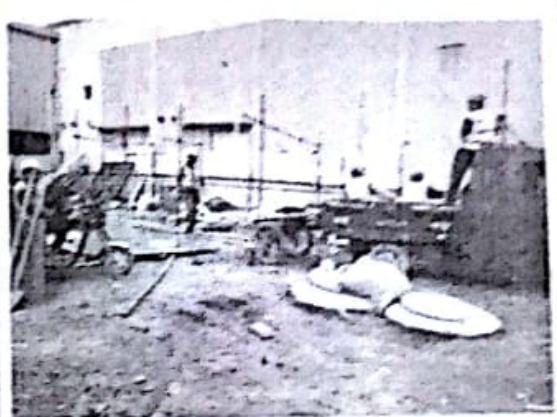
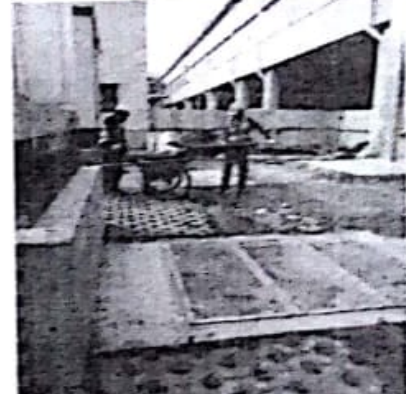


工程现场照片(含文字描述):

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	焊装车间桥架盖板	
图片		
文字描述	焊装车间涂刷防锈漆	
图片		
文字描述	总装车间桥架盖板运输安装	
图片		

文字描述	材料整理	
图片		
文字描述	箱变周围整平统跨	
图片		

二、其他施工事宜影像

文字描述	垃圾未及时清理	
图片	
