

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018年 第三十期

项目：浙江金刚汽车路桥V项目基地 12MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2018年4月9日—4月15日		
一、项目总体建设进度汇总：				
至2018年4月15日止，焊装车间扁铁接地完成100%；总装车间屋顶夹具安装已完成90%，檩条安装已完成90%，组件安装完成90%，桥架安装完成100%，四平方线敷设完成100%，直流电缆敷设完成100%，直流电缆头制作完成100%；生产车间檩条安装已完成90%，组件安装完成80%，桥架安装完成60%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、组件安装	焊装车间，扁铁接地100%；总装车间夹具安装90%，檩条安装90%，组件安装完成90%；生产车间檩条安装90%，组件安装80%			
6、逆变器及箱变	箱变基础修筑完工，箱变已全部吊装到位，电缆沟完工			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	暂无			
9、出图情况	已出			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施

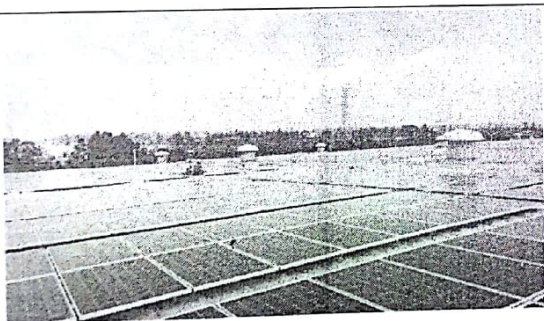
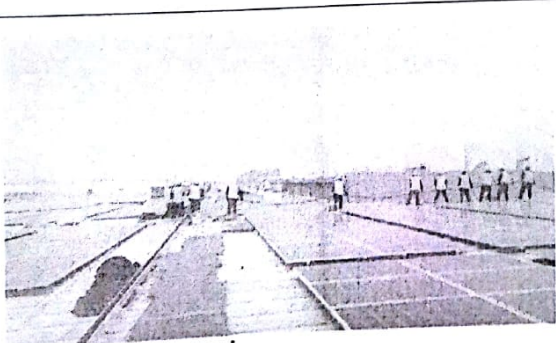
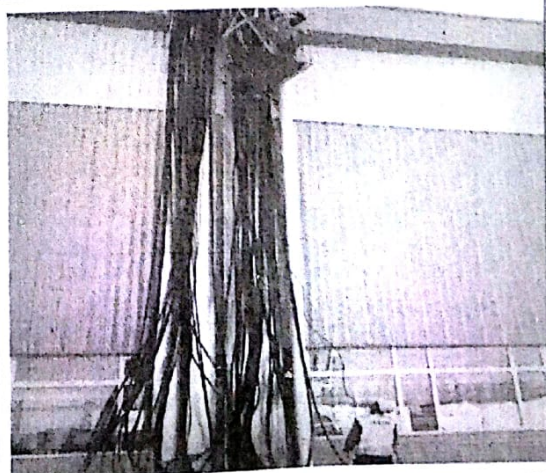
14、人员/机械情况	吊车一辆 施工人员 40			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	无	无	无	
2、首套组件安装	无	无	无	
3、线路倒送电	无	无	无	
4、首个发电单元并网	无	无	无	
5、全容量并网	无	无	无	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	焊装车间，扁铁接地 100%；总装车间夹具安装 90%，檩条安装 90%，组件安装完成 90%；生产车间檩条安装 90%，组件安装 80%			
5、逆变/箱变工程	箱变基础修筑完工，箱变已全部吊装到位，电缆沟完工			
6、外线工程	无			
7、其他	无			

填报人：新永强 审核人：梅波 时间：2018 年 4 月 15 日

工程现场照片（含文字描述）：

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	电缆终端制作	
图片		
文字描述	生产车间组件安装	
图片		
文字描述	生产车间直流电缆敷设	
图片		

文字描述	总装车间高铁接地	
图片		
文字描述	生产车间桥架安装	生产车间汇流箱安装
图片		
文字描述	生产车间 MC4 接头制作	
图片		

文字描述	生产车间四平方敷设	
图片		
