

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 第 十 一 期

2018 年 第 1 期

项目：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2017 年 12 月 31 日—2018 年 1 月 6 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
至 2017 年 1 月 6 日止，焊装车间卸屋面夹具安装完成 100%，檩条安装完成 100%，组件安装 100%，桥架安装 70%；总装车间西侧 9 台逆变器变电缆沟开挖，镀锌钢管敷设已完成 50%，电缆井砌筑完成 50%；总装车间屋顶定点划线完成，夹具安装已完成 30%，檩条安装已完成 10%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、组件安装	焊装车间安装檩条 100%，组件安装 100%；总装车间定位画线 100%，夹具安装 30%，檩条安装 10%			
6、逆变器及箱变	箱变基础修筑完工，箱变已全部吊装到位			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	暂无			
9、出图情况	已出			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施
11、人员/机械	吊车一辆 施工人员 70			

情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析:				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施(简述)
1、首个基础施工	无	无	无	
2、首套组件安装	无	无	无	
3、线路倒送电	无	无	无	
4、首个发电单元并网	无	无	无	
5、全容量并网	无	无	无	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	焊装车间安装檩条 100%，组件安装 100%；总装车间定位画线 100%，夹具安装 30%，檩条安装 10%			
5、逆变/箱变工程	箱变基础修筑完工，箱变已全部吊装到位			
6、外线工程	无			
7、其他	无			

填报人: 郭光强 审核人: 梅波 时间: 2018 年 1 月 6 日

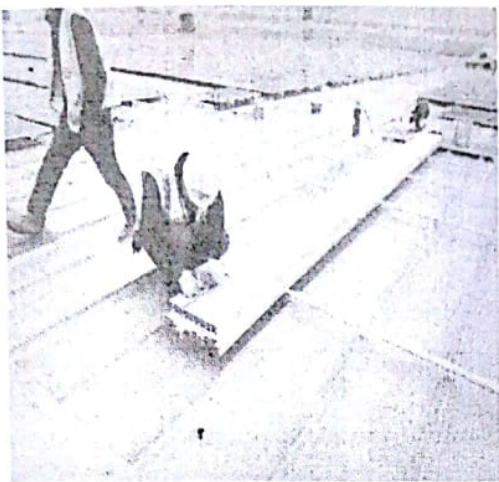


工程现场照片(含文字描述):

项目监理周报影像文件

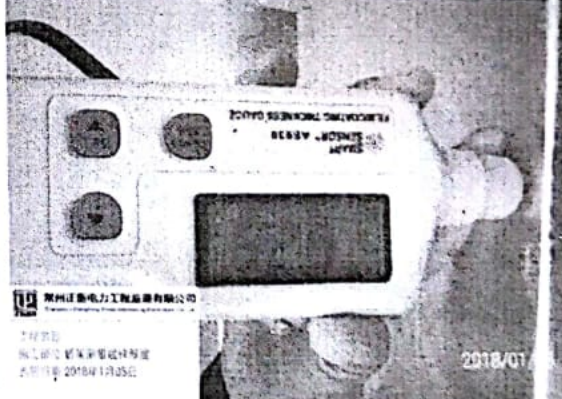
一、形象进度影像

文字描述	挖管网	
图片	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称：常州正衡汽车修理厂V型缸 12MW分布式光伏并网发电 项目 施工地点：常州正衡汽车修理厂 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 拍摄日期：2018年1月01日	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称：常州正衡汽车修理厂V型缸 12MW分布式光伏并网发电 项目 施工地点：常州正衡汽车修理厂 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 拍摄日期：2018年1月04日
文字描述	箱变吊装	
图片	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称：常州正衡汽车修理厂V型缸 12MW分布式光伏并网发电 项目 施工地点：常州正衡汽车修理厂 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 拍摄日期：2018年1月01日	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称：常州正衡汽车修理厂V型缸 12MW分布式光伏并网发电 项目 施工地点：常州正衡汽车修理厂 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 拍摄日期：2018年1月01日
文字描述	组件分散	组件安装
图片		

文字描述	桥架安装	总装车间涂刷防锈漆
图片		
文字描述	电缆管网敷设	破路管网回填
图片		
文字描述	砌电缆井	
图片		

文字描述	电缆套管敷设	标条固定
	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称: 110kV金坛变电站技改工程 标段: 220kV母线及电压互感器室工程 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 2018/01/05	

二、质量检查影像

文字描述	镀锌检测	
图片	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称: 110kV金坛变电站技改工程 标段: 220kV母线及电压互感器室工程 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 2018/01/05	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称: 110kV金坛变电站技改工程 标段: 220kV母线及电压互感器室工程 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 2018/01/05
	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称: 110kV金坛变电站技改工程 标段: 220kV母线及电压互感器室工程 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 2018/01/05	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称: 110kV金坛变电站技改工程 标段: 220kV母线及电压互感器室工程 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 2018/01/05

三、安全文明施工影像

文字描述	电缆管道建设旁站	
图片	 常州正衡电力工程监理有限公司 2018/01/06	
