

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 第 十七 期

项目：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2018 年 3 月 18 日—3 月 24 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
至 2018 年 3 月 24 日止，焊装车间扁铁接地完成 100%；总转车间屋顶夹具安装已完成 90%，檩条安装已完成 90%，组件安装完成 90%，桥架安装完成 70%；生产车间护栏完成，刷防锈漆完成 100%，夹具安装完成 100%，檩条安装已完成 40%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、组件安装	焊装车间，扁铁接地 10%；总装车间夹具安装 90%，檩条安装 90%，组件安装完成 90%，桥架完成 70%；生产车间，檩条安装 40%			
6、逆变器及箱变	箱变基础修筑完工，箱变已全部吊装到位，电缆沟完工			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	暂无			
9、出图情况	已出			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

11、人员/机械情况	吊车一辆 施工人员 70			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	无	无	无	
2、首套组件安装	无	无	无	
3、线路倒送电	无	无	无	
4、首个发电单元并网	无	无	无	
5、全容量并网	无	无	无	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	焊装车间，扁铁接地 10%；总装车间夹具安装 90%，檩条安装 90%，组件安装完成 90%，桥架完成 70%；生产车间，檩条安装 40%			
5、逆变/箱变工程	箱变基础修筑完工，箱变已全部吊装到位，电缆沟完工			
6、外线工程	无			
7、其他	无			

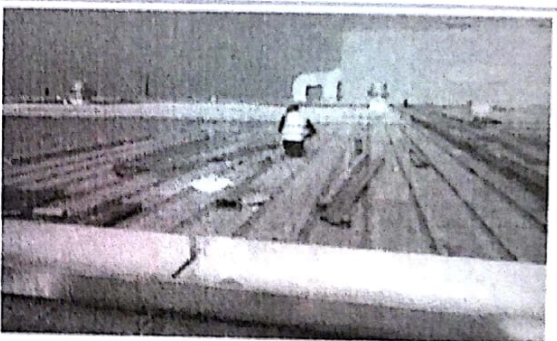
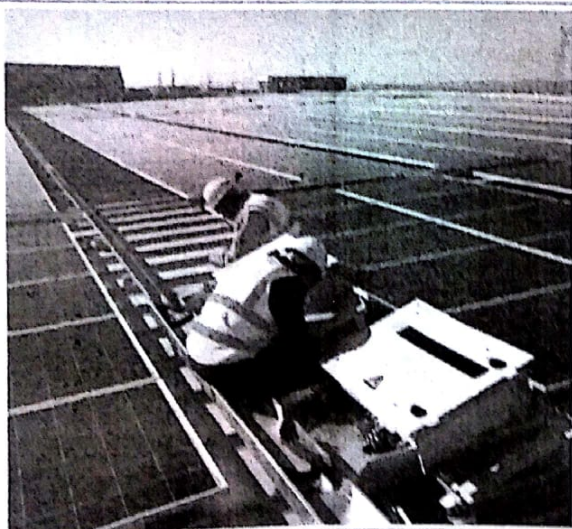
填报人：郭光强 审核人：梅波 时间：2018 年 3 月 29 日

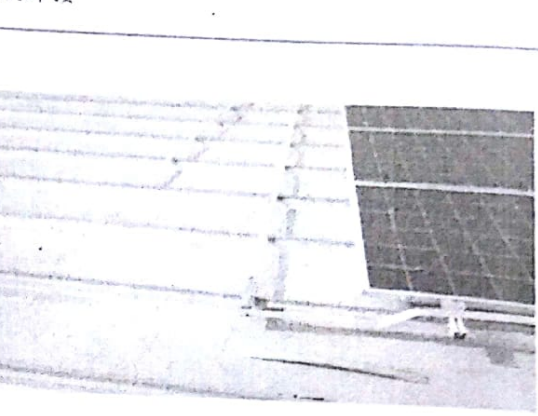
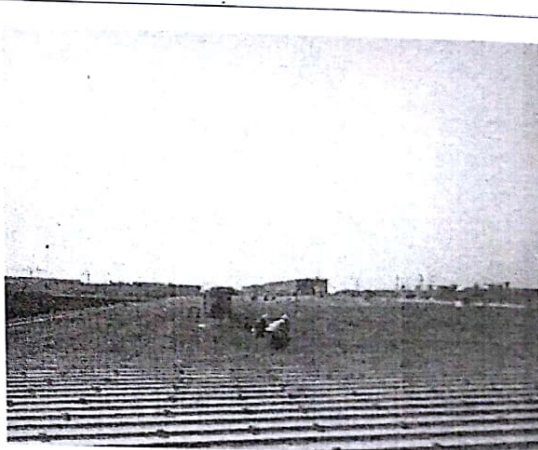
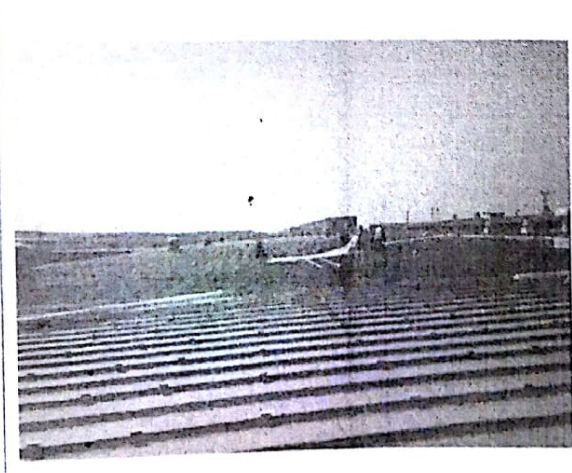


工程现场照片（含文字描述）：

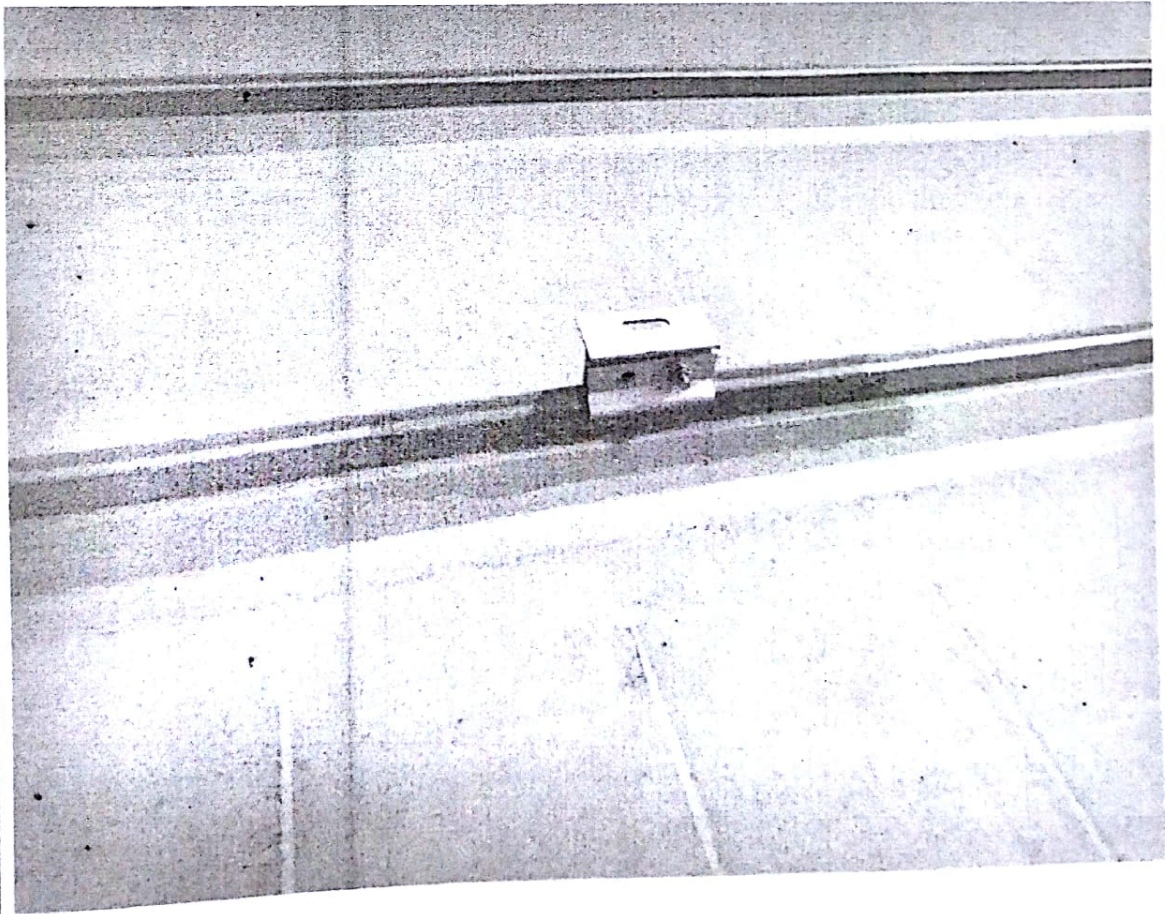
项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	制作电缆井盖板		组件到场运输	
图片				
文字描述	总装车间桥架安装			
图片				
文字描述	总装车间汇流箱安装			
图片				

文字描述	焊装车间扁铁焊接	
图片		
文字描述	生产车间夹具安装	
图片		
文字描述	生产车间檩条分散安装	
图片		

二、其他施工事宜影像

文字 描述	屋顶垃圾未及时清理
图 片	
文字 描述	夹具安装不规范
	

文字
描述

正泰领导巡视

