


正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018年 第十六期

项目：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2018 年 3 月 11 日—3 月 17 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
至 2018 年 3 月 17 日止，焊装车间扁铁接地完成 10%；总转车间屋顶夹具安装已完成 90%，檩条安装已完成 90%，组件安装完成 90%，桥架安装完成 50%；生产车间护栏完成 100%，刷防锈漆完成 60%，夹具安装完成 30%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、组件安装	焊装车间，扁铁接地 10%；总装车间夹具安装 90%，檩条安装 90%，组件安装完成 90%，桥架完成 50%；生产车间夹具安装 30%			
6、逆变器及箱变	箱变基础修筑完工，箱变已全部吊装到位，电缆沟完工			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	暂无			
9、出图情况	已出			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

11、人员/机械情况	吊车一辆 施工人员 70			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	无	无	无	
2、首套组件安装	无	无	无	
3、线路倒送电	无	无	无	
4、首个发电单元并网	无	无	无	
5、全容量并网	无	无	无	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	焊装车间，扁铁接地 10%；总装车间夹具安装 90%，檩条安装 90%，组件安装完成 90%，桥架完成 50%；生产车间夹具安装 30%			
5、逆变/箱变工程	箱变基础修筑完工，箱变已全部吊装到位，电缆沟完工			
6、外线工程	无			
7、其他	无			

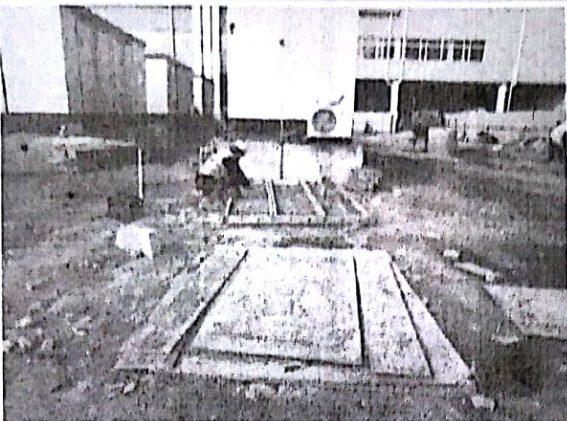
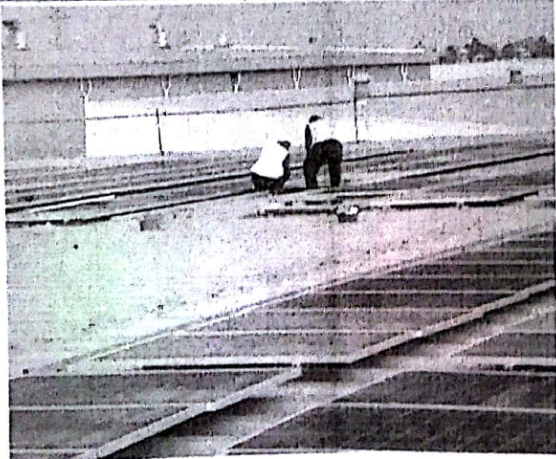
填报人：邵光强 审核人：梅波 时间：2018 年 3 月 17 日

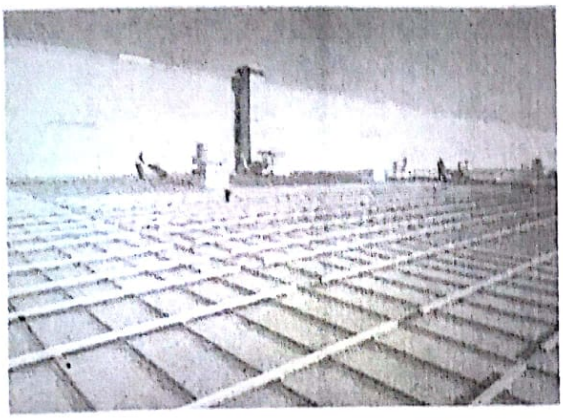
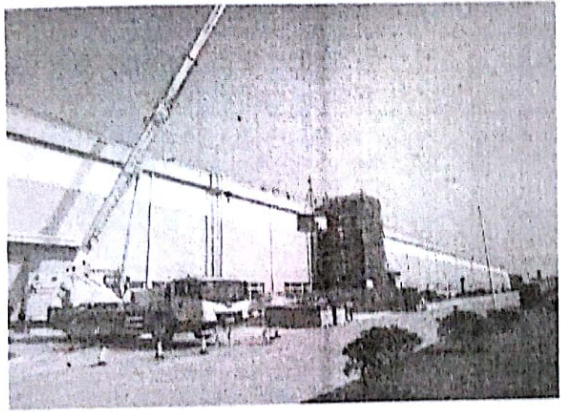
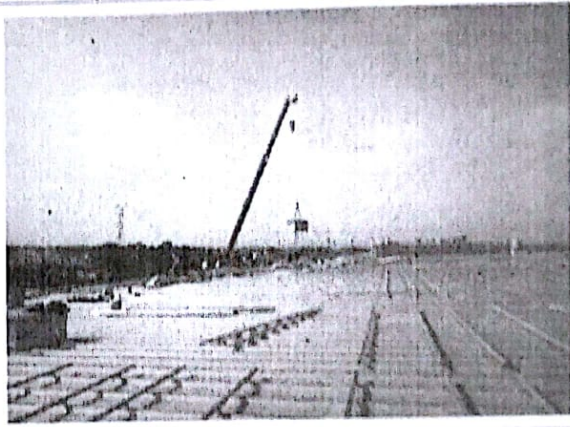
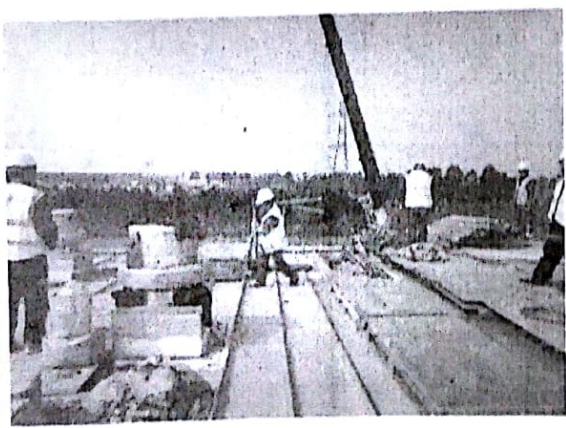
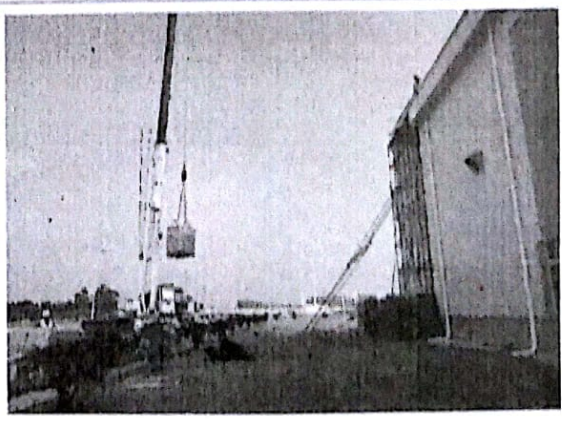


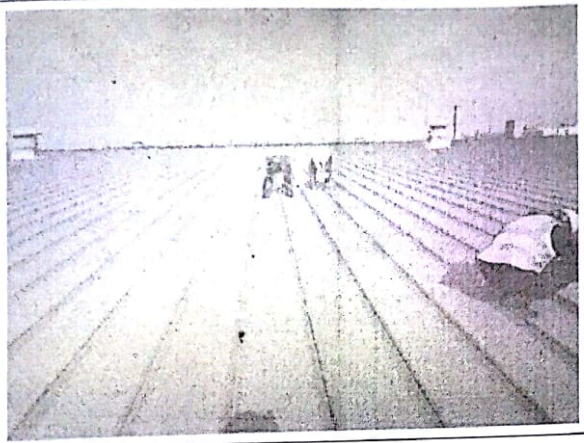
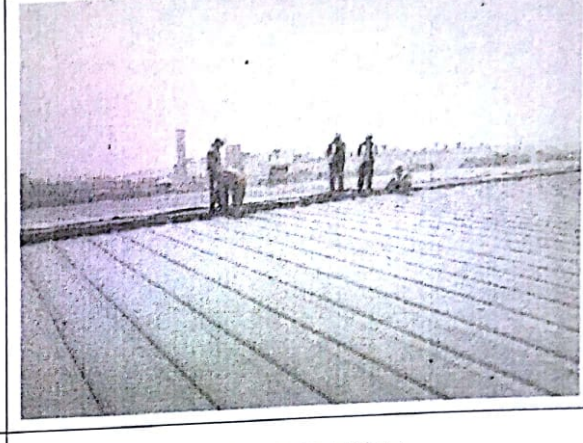
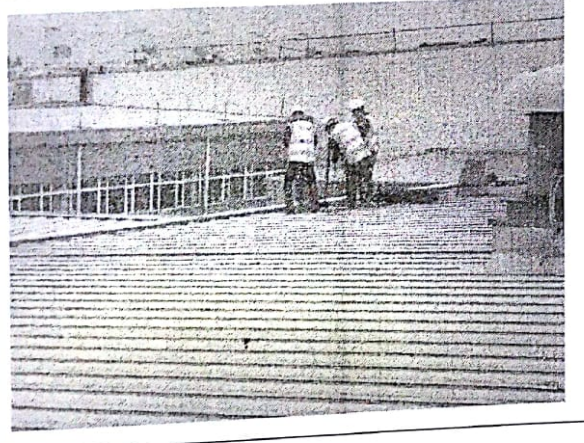
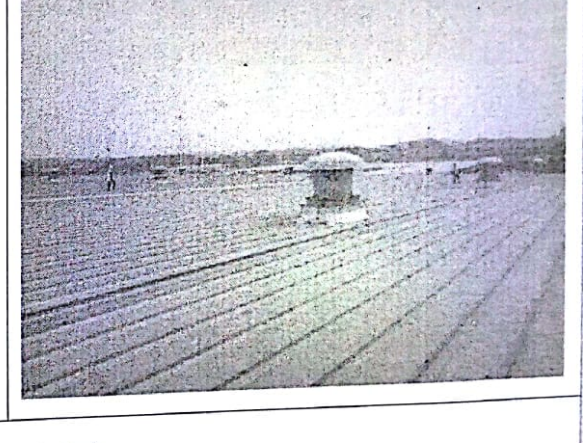
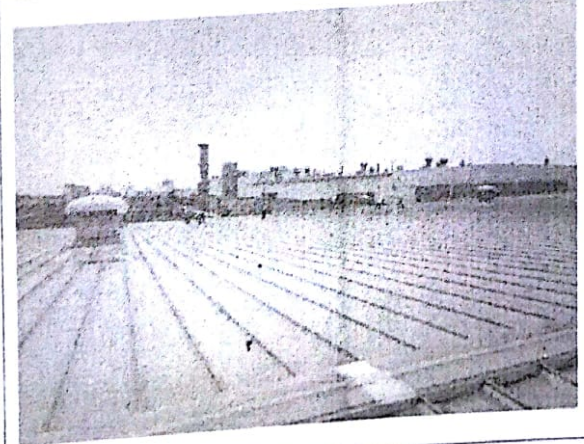
工程现场照片（含文字描述）：

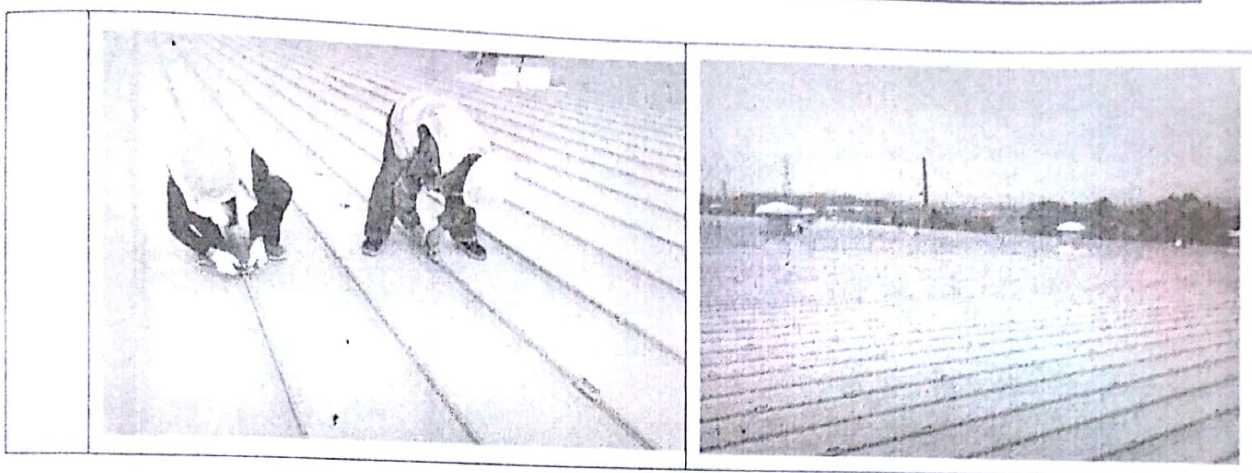
项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字 描述 图片	制作电缆井盖板	
		
文字 描述 图片	总装车间桥架安装	
		
文字 描述 图片	总装车间组件安装	
		

文字描述	总装车间组件运输	
图片		
文字描述	总装车间组件吊运	
图片		
文字描述	生产车间材料吊运	
图片		
文字描述	生产车间夹具定位	

		
文字描述	生产车间护栏安装	生产车间垃圾清理
		
文字描述	生产车间刷防锈漆	
		
文字描述	生产车间夹县安装	



二、其他施工事宜影像

文字描述	屋顶垃圾未及时清理
图片	
