

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

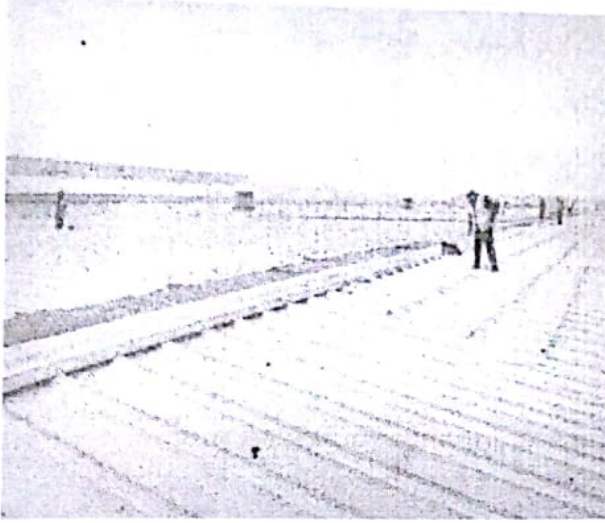
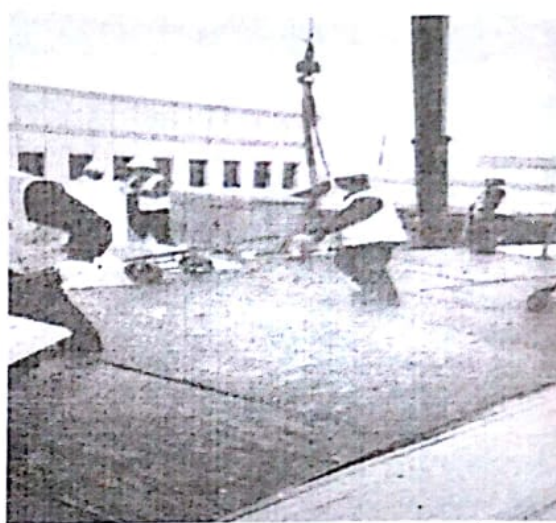
2017 年 第 十 期

项目：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2017 年 12 月 24 日—12 月 30 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
至 2017 年 12 月 30 日止，焊装车间卸料平台搭建完成，屋面围栏搭建完成，屋面夹具安装完成 100%，檩条安装完成 90%，组件安装 40%，桥架安装 40%；总装车间西侧箱变基础开挖完成，基础垫层浇筑完成，基础地梁浇筑完成，基础圈梁浇筑完成，逆变箱变 9 台全部吊装完工，电缆沟开挖完成，镀锌钢管敷设已完成 100%，卸料平台搭建完成，屋面围栏搭建完成 90%，屋面定点划线完成 80%，夹具安装已完成 20%，檩条已分散；辅料库后侧箱变基础挖土完成，基础地梁浇筑完成，基础圈梁浇筑完成，基础墙面粉刷完成，三台箱变已吊运开始接线，电缆沟开挖完工，高低压电缆、光纤已敷设完工，高压柜已拼接完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、组件安装	焊装车间安装檩条 90%，组件安装 40%；总装车间定位画线 40%，夹具安装 10%			
6、逆变器及箱变	箱变基础修筑完成 100%，吊装十二台箱变			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	高压柜耐压试验			
9、出图情况	已出			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施

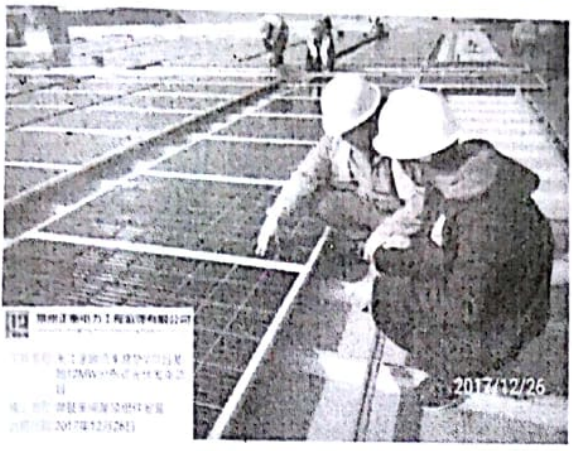
	组件	2017.12.30	2017.12.30	20%
11、人员/机械情况	吊车一辆 施工人员 70			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析:				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施(简述)
1、首个基础施工	无	无	无	
2、首套组件安装	无	无	无	
3、线路倒送电	无	无	无	
4、首个发电单元并网	无	无	无	
5、全容量并网	无	无	无	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	焊装车间安装檩条 90%，组件安装 40%；总装车间定位画线 40%，夹具安装 10%			
5、逆变/箱变工程	箱变基础修筑完成 100%，吊装十二台箱变			
6、外线工程	无			
7、其他	无			

填报人: 孙光强 审核人: 梅波 时间: 2017 年 12 月 30 日

图片	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称: 浙江宝隆汽车零部件有限公司 12MW炉内气化发电工程 EPC总承包项目 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理日期: 2017年12月27日	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称: 浙江宝隆汽车零部件有限公司 12MW炉内气化发电工程 EPC总承包项目 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理日期: 2017年12月27日
文字描述	箱变基础防腐处理	高压电缆头制作
图片	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称: 浙江宝隆汽车零部件有限公司 12MW炉内气化发电工程 EPC总承包项目 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理日期: 2017年12月27日	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称: 浙江宝隆汽车零部件有限公司 12MW炉内气化发电工程 EPC总承包项目 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理日期: 2017年12月27日
文字描述	桥架安装	焊装车间屋顶涂刷防锈漆
图片		 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称: 浙江宝隆汽车零部件有限公司 12MW炉内气化发电工程 EPC总承包项目 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理日期: 2017年12月27日

文字 描述	焊装车间屋顶清理垃圾	组件吊装运输
图 片		
文字 描述	焊装车间组件安装	破路敷设管道
	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称：常州正衡电力工程监理有限公司 地址：常州市武进区 2017/12/21	

二、质量检查影像

文字描述	组件安装检查	
图片	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称：常州市武进区... 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 日期：2017年12月26日	

三、安全文明施工影像

文字描述	夜间破路敷设管道旁站	
图片		
