

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 第 十 四 期

项目：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2018 年 1 月 21 日—1 月 27 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
至 2017 年 1 月 27 日止，焊装车间卸屋面夹具安装完成 100%，檩条安装完成 100%，组件安装 100%，桥架安装 100%，四平方线敷设完成 100%，直流电缆敷设完成 100%；总装车间西侧电缆沟回填，路面整平，电缆井砌筑完成 100%，高压电缆敷设完成 100%；总转车间屋顶夹具安装已完成 50%，檩条安装已完成 50%，组件安装完成 20%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、组件安装	焊装车间安装檩条 100%，组件安装 100%，；总装车间夹具安装 50%，檩条安装 50%，组件安装完成 20%			
6、逆变器及箱变	箱变基础修筑完工，箱变已全部吊装到位，电缆沟完工			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	暂无			
9、出图情况	已出			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
11、人员/机械	吊车一辆 施工人员 70			

情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	无	无	无	
2、首套组件安装	无	无	无	
3、线路倒送电	无	无	无	
4、首个发电单元并网	无	无	无	
5、全容量并网	无	无	无	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	焊装车间安装檩条 100%，组件安装 100%，；总装车间夹具安装 50%，檩条安装 50%，组件安装完成 20%			
5、逆变/箱变工程	箱变基础修筑完工，箱变已全部吊装到位，电缆沟完工			
6、外线工程	无			
7、其他	无			

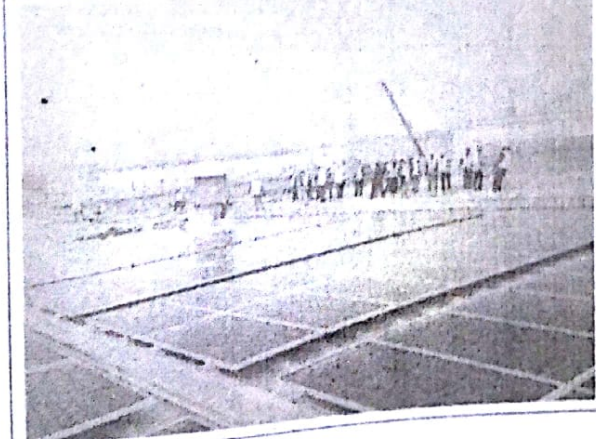
填报人：邵光锦 审核人：梅波 时间：2018年1月27日

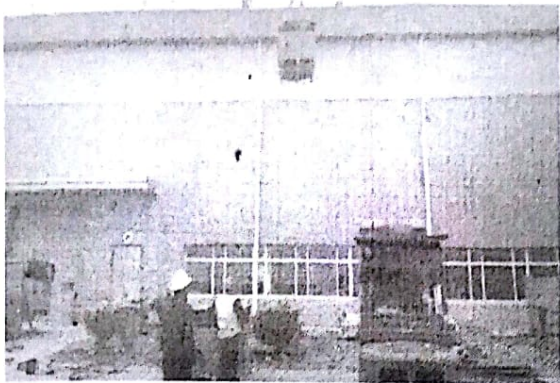
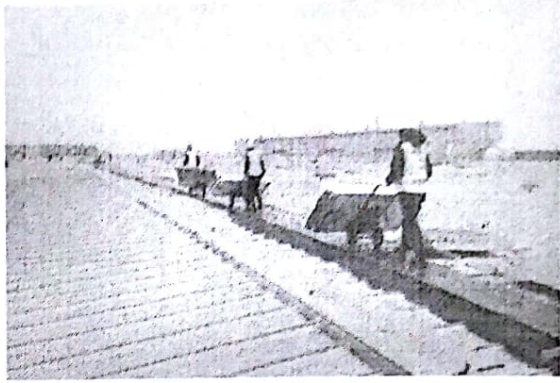
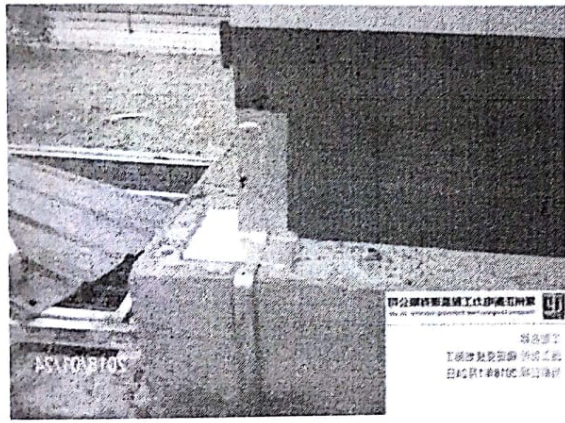
工程现场照片（含文字描述）：

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

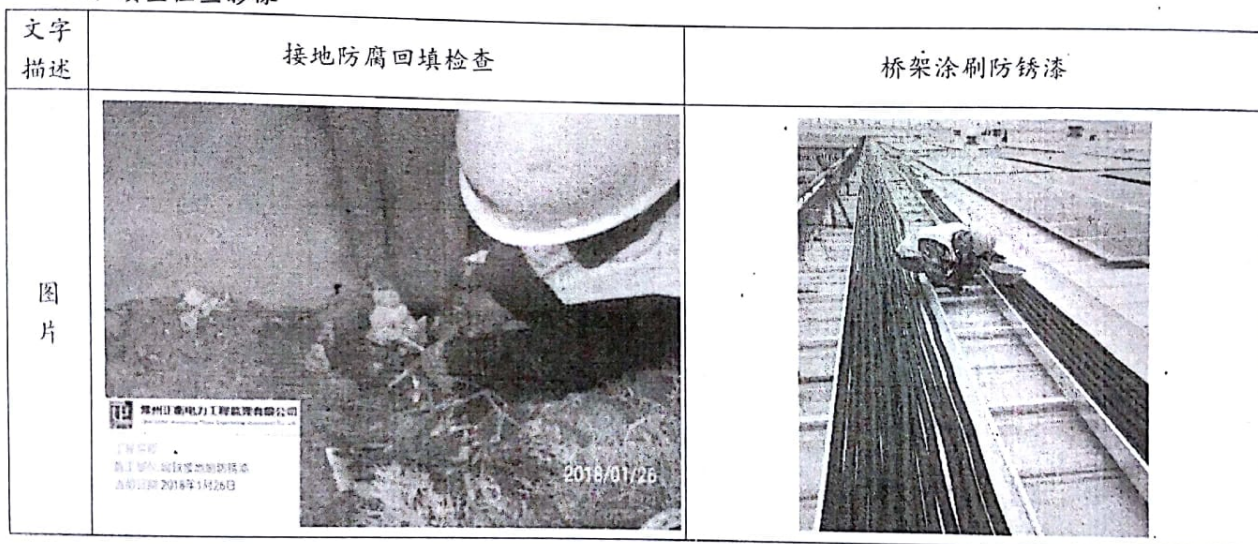
文字描述 图片	焊装车间安装桥架 
文字描述 图片	光纤敷设 
文字描述 图片	电缆头制作 

文字描述	焊装车间组件安装	
图片	 常州正衡电力工程监理有限公司 2018/01/22	 常州正衡电力工程监理有限公司 2018/01/22
文字描述	汇流箱检测接线	
图片		
文字描述	焊装车间直流电缆敷设	
图片		

文字描述	总装车间组件吊装运输	
		
文字描述	箱变接地，防火封堵	
		
文字描述	电缆井路周边整平	
		
文字描述	围栏拆除	接地防腐



二、质量检查影像



三、安全文明施工影像

