

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018年 第三十五期

项目: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目	填报周期: 2018 年 8 月 18 日—8 月 24 日
---------------------------------------	--------------------------------

一、项目总体建设进度汇总:

陕西顺协盈建筑工程有限公司项目部:生产车间、焊装车间、总装车间钢楼梯三处支架已吊装完成,踏步与扶手也已接近施工收尾阶段,还有一个星期全部结束。施工现场发现存在重在质量问题,监理现场督促整改,监理会立即发监理通知单要求立即整改。直到符合要求为止。施工质量在可控制范围内。进场工程材料只提交 H 钢与槽钢报验。过程施工工序资料(基础与钢楼梯支架制作)还未提交,监理发出二份通知单和罚款单(本周 22 日监理发了监理工作联系单,要求尽快提交外,还提出了提交施工资料的要求),并向业主主管部门发了监理报告。信邦建设工程有限公司项目部:总装车间屋面扶栏本月 8 日施工安装结束,检修人行道在收尾整改中。焊装车间屋面扶栏施工安装已结束,检修人行道在收尾整改中。生产准备车间扶栏施工安装已结束,检修人行道安装在收尾整改中。屋面清洗系统已在总装车间屋面安装施工中,今天或者明天结束,继续在焊装车间屋面进行清洗系统施工。业主、监理口头及监理例会上反复强调,并发书面文件:要求及时提交施工过程资料,必须与施工现场施工进度同步。签发了监理工作联系单、监理通知单。监理组织正常的监理例会,安全专题会议,平时一周的安全平行检查和质量平行检查。

二、本周工程建设工作内容及完成情况是

1、总装车间楼梯	本月 2 日基础基坑,已回填。支架已吊装,正在制作钢楼梯中。
2、焊装车间楼梯	本月 2 日基础基坑,已回填。支架已吊装,正在制作钢楼梯中。

3、生产准备车间楼梯	本月2日基础基坑，已回填。支架已吊装，正在制作钢楼梯中。			
4、总装车间扶栏	已完成。			
5、焊装车间扶栏	7月底已完成。			
6、生产准备车间扶栏	7月底已完成。			
7、总装车间检修人行道	7月底已完成。现在收尾整改中。			
8、焊装车间检修人行道	已开始施工。现在收尾整改中。			
9、生产准备车间检修人行道	已开始施工。现在收尾整改中。			
10、屋面清洗系统	总装车间屋面施工。过二天会在焊装车间屋面进行			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（%），已到货数量（%）延误原因及催货措施
				无
				无
				无
11、人员/机械情况	施工人员 28 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工		无	无	
2、首套组件安装	无	无	无	
3、线路倒送电		无	无	
4、首个发电单元并网	无	无	无	
5、全容量并网	无	无	无	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			

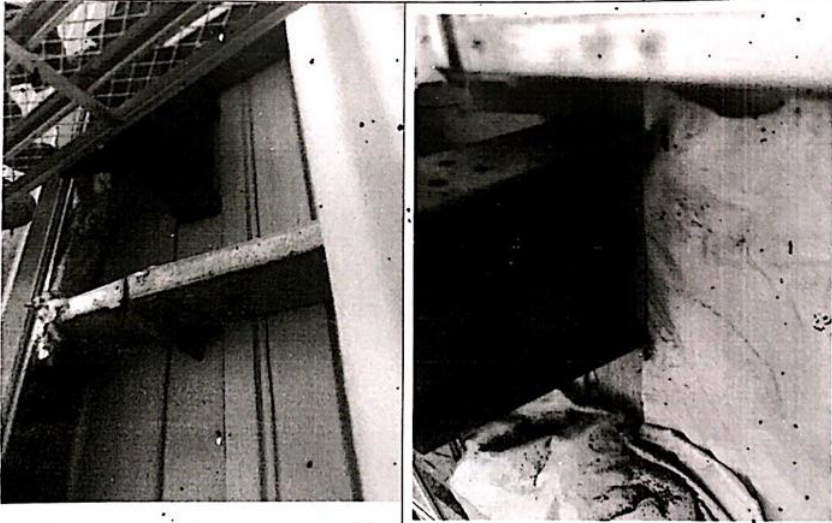
五、下周计划主要工作内容	
1、钢楼梯制作	三个车间的钢楼梯的制作。
2、屋面检修道安装	焊装车间屋面、生产准备车间屋面检修道安装。
3、屋面清洗系统施工	开始施工车直径 32 镀锌管与屋面安装水管。
4、组件区域工程	已完成
5、逆变/箱变工程	已完
6、引线工程	已完成
7、其他	

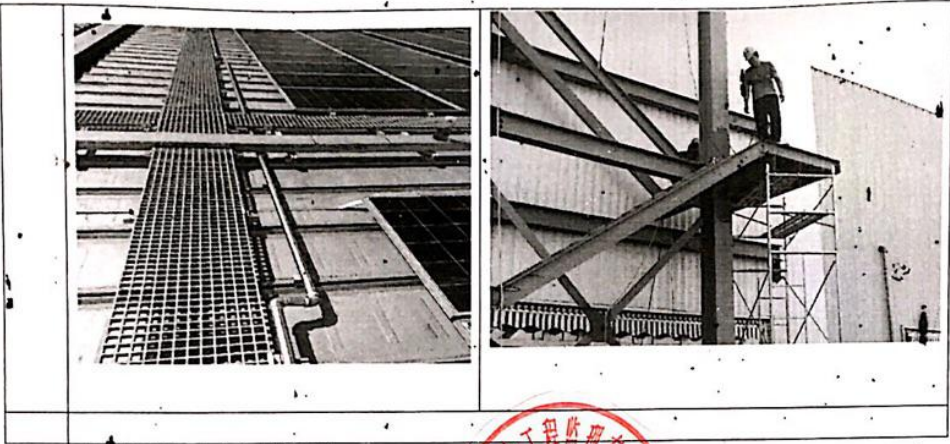
填报人：郭光禧 审核人：梅波 时间：2018 年 8 月 24 日

工程现场照片（含文字描述）：

项目监理周报影像文件

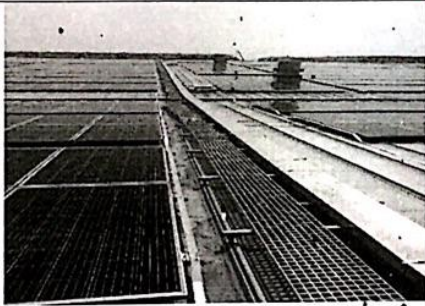
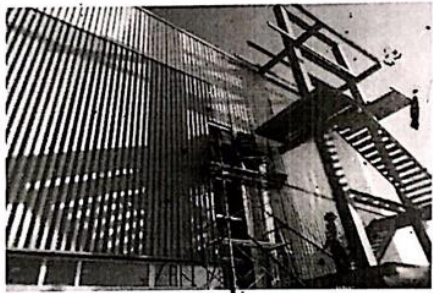
一、形象进度影像

文字描述	生产准备车间钢楼梯制作施工		生产准备车间钢楼梯制作一焊接
图片			
文字描述	总装车间检修人行道与清洗系统		总装车间钢楼梯踏步与扶手施工



工程现场照片（含文字描述）：

一、形象进度影像

文字描述	总装车间屋面检修人行道与水管安装	焊装车间钢楼梯制作施工
图片		
文字描述	车清洗系统直径镀锌水管丝扣	生产准备车间钢楼梯制作施工
图片	
