

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 5 期

项目：滕州优上新能源有限公司 5.62MW 分布式光伏电站项目		填报周期：2017 年 11 月 11 日—11 月 17 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、3 号厂房屋顶组件安装完成。				
2、1 号厂房屋顶支架安装完成 95%。				
3、2 号厂房屋顶组件安装完成 90%。				
4、2 号厂房过道屋顶加固完成 60%。				
5、箱变基础底板浇筑完成 1、4、5 号；3 号箱变消防管道改完；2 号箱变改挖基础且底层浇筑完成。				
6、开关站筏板基础浇筑完成。				
7、3 号厂房屋顶 1*4 电缆放线完成 70%。				
8、计划下周 2 号厂房过道屋顶加固完工，1 号厂房过道加固完成 60%。				
9、计划下周开关站基础完成。				
10、计划下周 5 个箱变基础完成。				
11、计划下周 1 号厂房屋顶支架完成。				
12、计划下周三个厂房屋面组件安装完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、开关站/升压站	开关站基础筏板浇筑完成。			
2、场内箱变基础施工	1，4，5 号箱变基础底板浇筑完成。			
3、支架及组件安装	1、3 号厂房屋顶组件安装完成。 2、2 号厂房屋顶组件安装完成 90%。 3、1 号厂房屋顶支架安装完成 95%。			
4、逆变器及箱变	无			
5、送出工程（含对侧）	进行开挖。			
6、现场调试	无			
7、出图情况	大部分电子版和纸质图纸。			
8、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	光伏组件	2017.11.07	2017.11.07	21000 块

	汇流箱	2017.11.13	2017.11.13	20 台
	1*4 电缆	2017.11.13	2017.11.13	12 盘
9、人员/机械情况	20 人；商砼车 2 辆，运输车 2 辆，挖掘机 1 辆。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2017.11.22		2017.11.22	
2、首套组件安装	2017.11.22		2017.11.22	
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网	2017.12.30		2017.12.30	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、现场场内业主阻工问题需要尽快协商解决。 2、现场施工人员不够需要尽快增加。			
未解决的协调问题解决进展	1、现场场内业主阻工问题需要尽快协商解决。 2、现场施工人员不够需要尽快增加。			
五、下周计划主要工作内容				
1、加固工程	2 号厂房过道屋顶加固完工；1 号厂房过道屋顶加固完成 60%。			
2、箱变基础施工	5 个箱变基础完工。			
3、升压站及开关站工程	开关站基础完工。			

4、组件区域工程	3个厂房屋顶组件安装完成。
5、逆变/箱变工程	无
6、外线工程	继续施工。
7、其他	无

填报人： 常庆斌 审核人： 常庆斌 时间： 2017 年 11 月 17 日

工程现场照片（含文字描述）：


开关站基础开挖：



3号厂房屋顶组件安装：



开关站基础筏板进行浇筑：

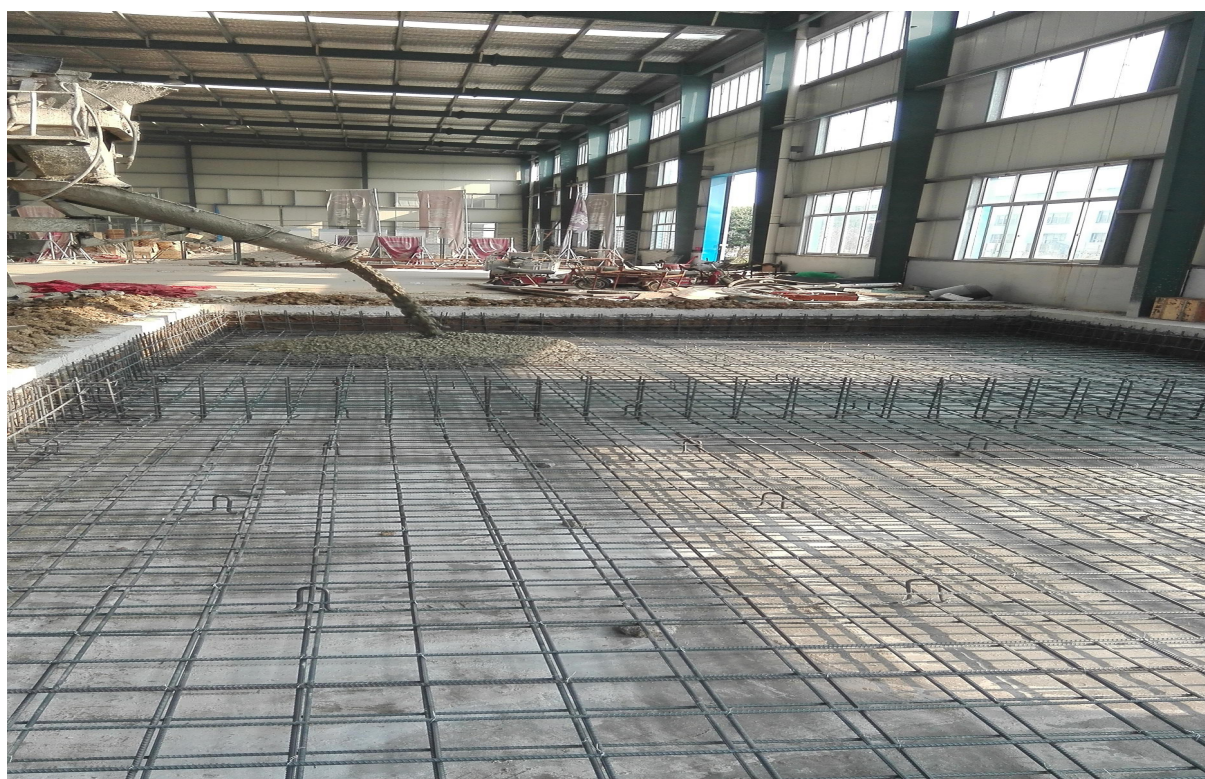

箱变基础底板进行浇筑：

