

华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

周报第 22 期 (2018 年 04 月 29 日-2018 年 05 月 05 日)

1、本周项目进展情况

1) 施工准备工作及手续办理

业务报装	宜昌电网客服中心	已报装完成
图纸评审	宜昌电网客服中心	已完成
设备命名	宜昌电网客服中心	已完成
计量方案	宜昌电网发策部	已完成
产权分解点	宜昌电网发策部	无需办理
保护定值计算。	宜昌电网客服中心	已完成
调度协议	宜昌电网客服中心	已完成
供用电合同	当阳电网营销部	已完成
发电机组并网运行 批复	宜昌市经信委	已完成
并网经济协议	湖北电网发策部	已完成
外送线路验收联系 单	宜昌电网客服中心	已完成
开关站、对侧间隔 验收联系单	宜昌电网客服中心	已完成
送电通知书	宜昌电网公司	已完成

2) 设计工作

1、外线图纸完成;



2、升压站图纸完成部分；

3、光伏区图纸完成部分；

3) 土建工程

1、综合楼：大楼主体已完成；外墙保温粉刷已完，目前在装修准备阶段。

2、配电楼：土建、电气完成，运维入住，已并网；

3、室外设备基础：SVG、避雷针、高压预制仓、构架基础完成；

4、围墙砌筑完成 100%，站内道路、接地、排水管道施工完成；

5、光伏区：1-11 区、13-30 区箱逆变基础浇筑完成（完成 29 基）；

4) 机电安装工程

开关站

1、室外小电阻接地变安装完成，SVG、SVG 动态无功补偿装置、高压预制仓安装完成，避雷针，门支架安装完成，已送电并网；

2、二次设备、高压设备安装、接线完成，以送电并网；

3、开关站已并网发电；

光伏区

1、光伏区：沉桩累计完成 43511 根、总量完成 71.03%，支架安装累计完成 5769 组，组件安装完成 4943 组（64.02MW），汇流箱累计安装 724 台；箱逆变基础完成 29 个，箱变就位 29 台逆变 28 台。

2、1-7 区、9-11 区、13-16 区、18 区-19 区、21 区、25 区、28 区部分送电完成，

3、2017 年 12 月 27 日 16:58 分并网成功，累计并网 44.06MW；

5) 送出工程



1、外线塔基开挖完成 52 基，塔基基础浇筑完成 52 基，完成 100%，铁塔组立完成 52 基、完成 100%；

2、导线放线完成 11.02 公里、完成 100%，紧线完成 11 公里、完成 100%，塔基附件安装、挂牌完成 52 基，完成 100%，G3-G4、G17-G18 电缆上塔安装完成，已送电；

3、对侧站：a. 华强变施工完成；b. 凤凰变施工完成；c 长坂坡施工完成；

6) 主设备到货情况

1、升压站：二次设备累计到货 26 台货齐，高压设备到货 12 台货齐，高低压及控制电缆到场 10 盘，避雷针到货 2 基，构架到货 2 基，小电阻接地变到货 2 台货齐，高压预制仓到货 4 台货齐；

2、光伏区：2*70 电缆到货 85012 米、2*50 电缆到货 44861 米、3*240 电缆到货 4278 米，3*70 电缆到货 8247 米，3*120 累计到货 10021 米，4mm²光伏电缆红线累计到货 367854 米，黑线累计到货 367854 米，通讯光缆累计到货 16204 米，通讯线缆累计到货 36152 米；组件 64.9MW (220480 片)、支架到货 75MW。

3、外线：设备材料货齐；

7) 安全、文明生产情况

1、检查安全帽佩戴，安全防护隔离措施落实。

2、检查临时用电规范化。

3、检查起重吊装过程中的安全措施是否到位。

4、开关站、光伏区 1-7 区、9-11 区、13-16 区、18 区-19 区、21 区、25 区、28 区均带电，消缺施工持工作票、专人监护已落实到位。

5、现场临时用电符合 JGJ46-2005 规范要求；



- 6、现场垃圾及时清理；
- 7、场区车辆行驶不得超速；
- 8) 阶段验收

无

2、下周工作计划

- (1) 上海伏光：16 区 25 区 29 区 30 区如无特殊原因可全额并网，11 区消缺完成。
- (2) 中冶华亚：21 区支架安装完成，22 区 26 区组件安装完成，27 区组件开始安装，17 区 23 区低压接线完成，22 区 26 区低压安装开始，22 区 23 区 26 区箱逆变接线完成，23 区 26 区集电线路完成。
- (3) 江苏天目：20 区汇流箱并网发电，基本完成结束，光伏区（9、10、18、19 区）消缺完成 90%。
- (4) 宜昌富豪：综合楼楼层地砖铺设完成，综合楼内墙挂白、地板、吊顶开始施工，综合楼外墙真石漆完成，综合楼散水施工，联络线间隔改造开始，导线展放完成不需停电部分。

3、存在问题及需要协调事宜

- (1) 场区道路不符合进场标准。
- (2) 现场消缺进度缓慢。
- (3) 组件边压块现已更换，已安装部分监督更换。


4、里程碑节点执行情况

里程碑节点名称	完成时间	备注
首个光伏发电单元基础开始施工	2017 年 12 月 2 日	
首个光伏发电单元开始安装	2017 年 12 月 12 日	
开关站基础开始浇筑	2017 年 11 月 3 日	




综合楼屋面封顶	2018 年 2 月 2 日	
开关站受电	2017 年 12 月 27 日	14:08 分
首个光伏发电单元发电	2017 年 12 月 27 日	16: 58 分
全部光伏发电单元整套启动开始 240 小时并网试运行		
项目整体正式移交生产		

5、现场影像资料

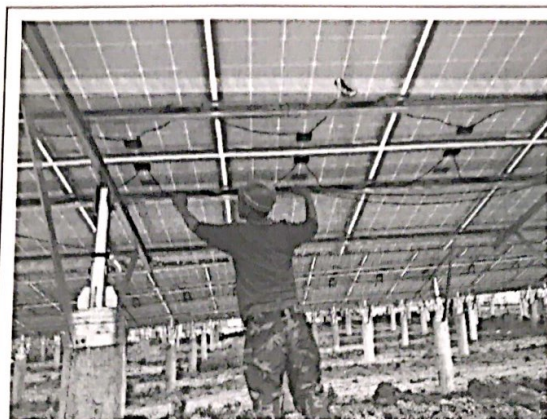

23 区 1×4 平方线展放

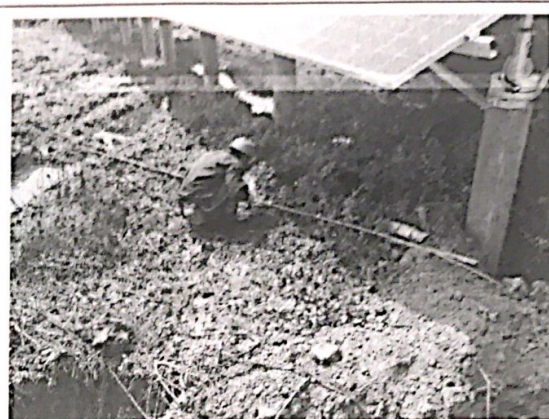


28 区接地扁铁焊接




23 区汇流箱接线



电缆沟开挖

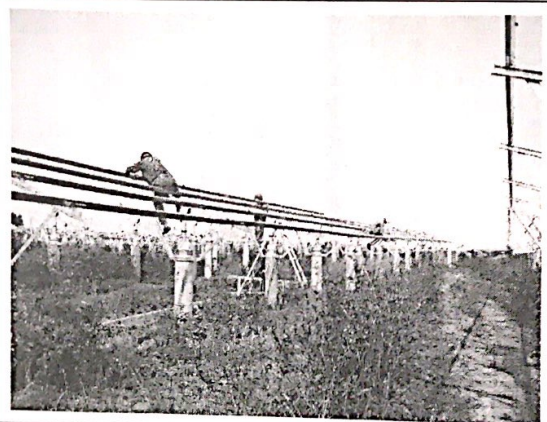

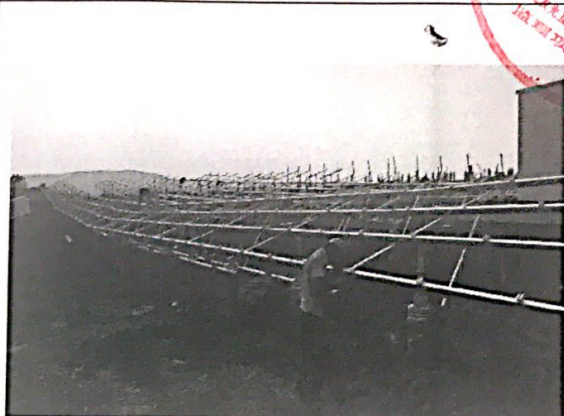24 区支架安装	接地扁铁焊接
	
29 区组件安装	17 区电缆头制作
	
29 区支架安装	汇流箱消缺施工

