

扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

# 监 理 周 报

## 第 九 期




(2017 年 12 月 28 日 - 2018 年 1 月 3 日)




由 扫描全能王 扫描创建

工程名称	扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目	建设单位	扶沟县光伏扶贫工作领导小组办公室
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	河南金信电力集团有限公司 河南省万通阜康建筑有限公司 河南峰帆安装工程有限公司 河南省康泰建筑工程有限公司	河南省华岩建设工程有限公司 河南颖淮建工有限公司 河南洪峰建筑安装有限公司 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司	
本周施工内容及进度	1、光伏组件安装剩余极个别场地未完成。 2、管桩支架已全部安装完成，组件安装完成。 3、电力局调试接线并网。		
下周计划	1、进行发电调试，并将数据传输。 2、光伏组件安装所有场地都要完成。 3、数据传输覆盖全部站点。		
安全文明施工情况	1、要求进场工人进行安全三级教育（进行中）。 2、现场竖立好安全文明标牌。 3、天气严寒，注意施工保暖。		
施工质量	1、并网柜外壳质量达不到要求，让施工单位立即更换。 2、电缆沟深度没有达到设计要求，要求施工单位整改。		
设备材料进场情况	1、场地围栏到场。		
人员机械情况	人员:230 人		




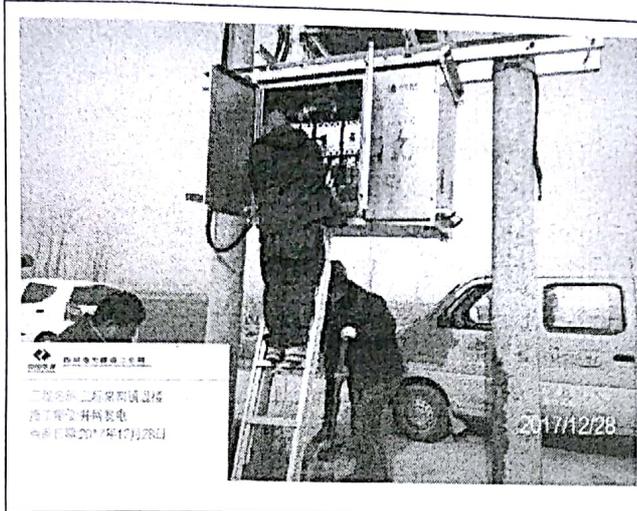

三标汴岗镇安装汇流箱计量柜

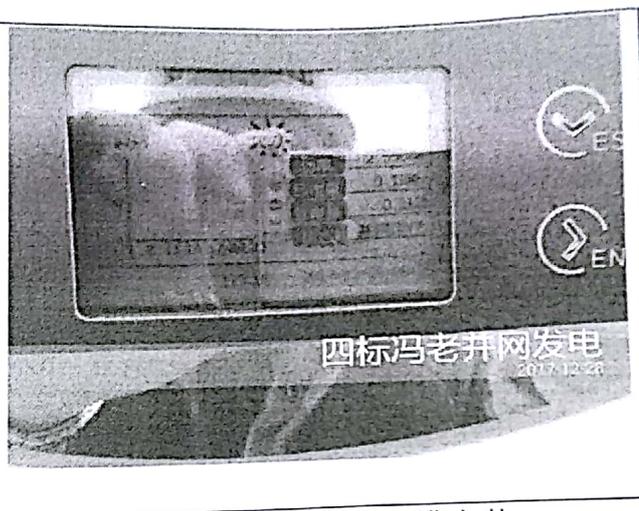

二标丁庄交流电缆安装

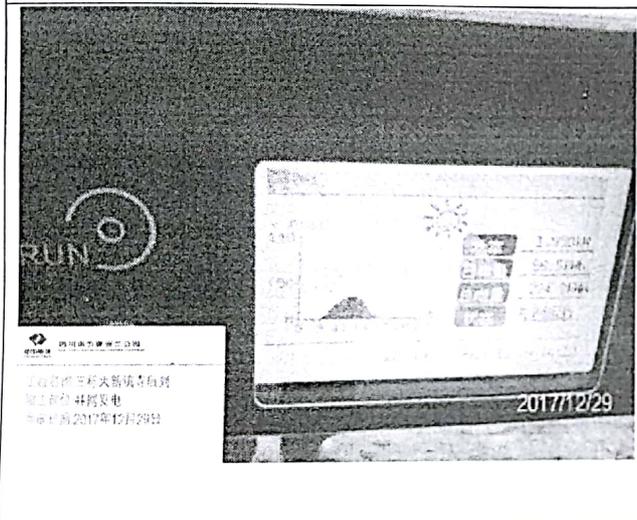

四标何家寨接变压器电缆



四标葛岗安装围栏

