

扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

监 理 周 报

第
十
二
期




(2018 年 1 月 18 日-2018 年 1 月 24 日)



由 扫描全能王 扫描创建

工程名称	扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目	建设单位	扶沟县光伏扶贫工作领导小组办公室
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	河南金信电力集团有限公司 河南省华岩建设工程有限公司 河南省万通阜康建筑有限公司 河南颖淮建工有限公司 河南峰帆安装工程有限公司 河南洪峰建筑安装有限公司 河南省康泰建筑工程有限公司 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司		
本周施工内容及进度	1、附属工程完工，进行一次预检，由业主、监理、运维进行查看，并要求不合格项整改。 2、数控方应加快工程进度，将剩余其它电站调试好。 3、施工方整改预检不合格项。		
下周计划	1、附属工程完成，业主组织相关人员进行第一次验收。 2、数据传输覆盖全部站点。 3、整理竣工资料。		
安全文明施工情况	1、要求进场工人进行安全三级教育（进行中）。 2、现场竖立好安全文明标牌。 3、由于天气原因，注意施工安全及保暖。		
施工质量	1、严格按照设计要求进行整改。		
设备材料进场情况	无		
人员机械情况	人员:130 人		



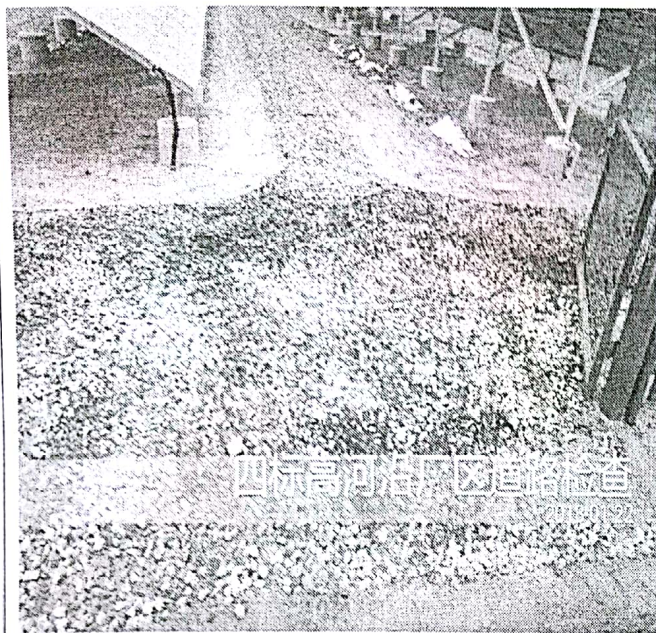


四标高河沿厂区道路检查



四标葛岗逆变器验收



苗总监、年经理、姜主任到五标预验收

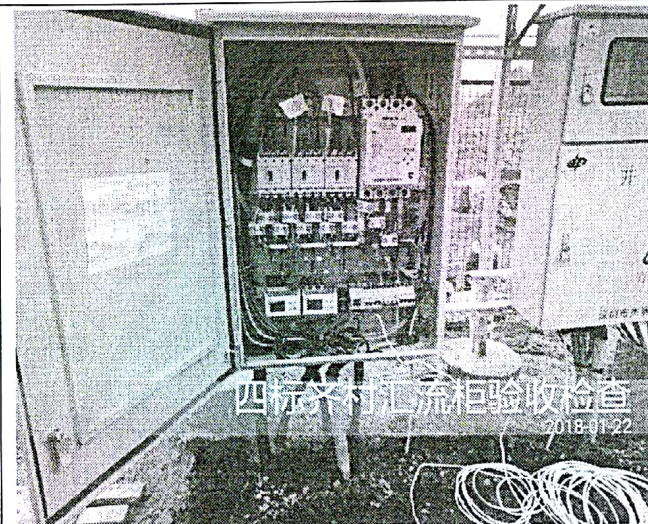

四标齐村汇流柜验收检查

