

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 12 期

项目：山东齐河和乐门业光伏发电工程		填报周期：2018.3.26-2018.4.1		
一、项目总体建设进度汇总：				
夹具支架安装完成 9.5MW				
组件安装完成 9.5MW				
桥架安装完成 8.5MW				
光伏电缆铺设完成 8.5MW				
组串逆变器累计完成 3.55MW				
直流汇流箱安装完成 5.3MW				
并网柜安装累计完成 3.55MW				
5 台箱式变压器就位				
10KV 开关站预制舱就位				
开关设备、一二次设备就位				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	5 台箱式变压器就位；10KV 开关站预制舱就位； 开关设备、一二次设备就位			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	箱变基础完成，预制舱基础完成			
5、支架及组件安装	1#屋面支架夹具安装完成，组件安装完成 100%;3#屋面支架安装 100%， 组件安装 100%；4#屋面支架安装 100%组件安装 100%;5#屋面支架安装 完成，组件安装 100%；6#屋面支架夹具安装完成，组件安装完成 100%			
6、逆变器及箱变	1#屋面逆变器安装完成，3#屋面逆变器安装完成 4#屋面直流汇流箱安装完成，5#屋面直流汇流箱安装完成， 6#屋面直流汇流箱安装完成			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	无			
9、出图情况	部分施工白图			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（）， 已到货数量（）%延误原因及催 货措施


11、人员/机械情况	平均每天 15 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	预制舱就位，开关设备、二次设备就位			
4、组件区域工程	组件安装完成			
5、逆变/箱变工程	3.55MW 逆变器安装完成，5.95MW 直流汇流箱安装 80%、箱式变压器全部就位			
6、外线工程	未开展			
7、其他				

填报人： 任善善 审核人： 苗守明 时间： 2018 年 4 月 1 日

工程现场照片（含文字描述）：



安装桥架

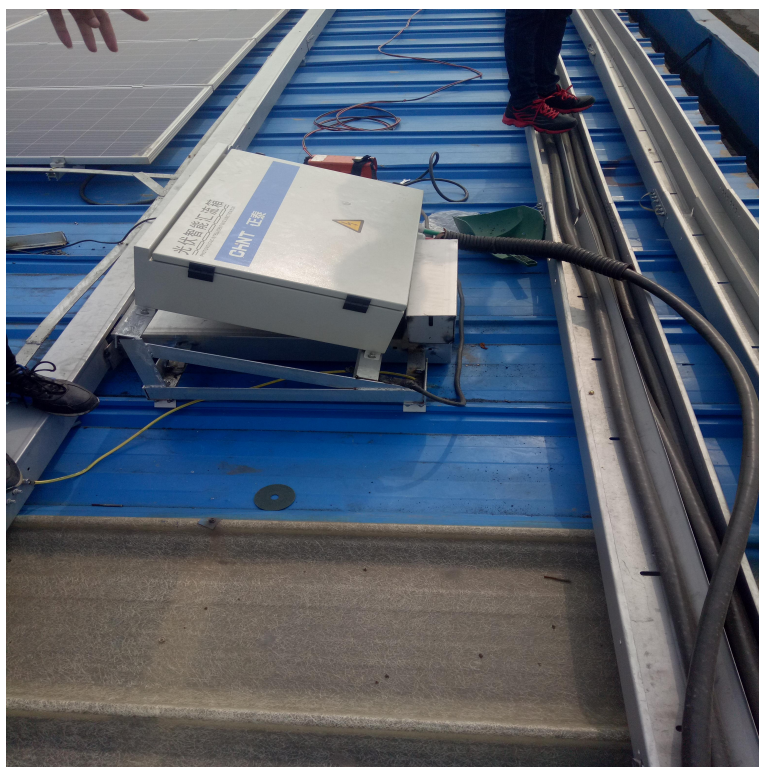

汇流箱桥架全包施工
