

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

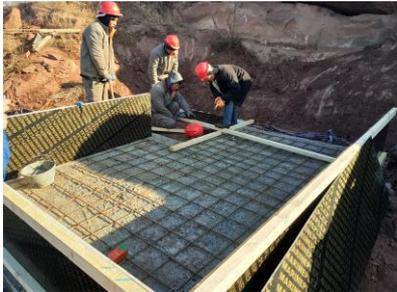
2017 年 第 六 期

项目：郟城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目 一期工程		填报周期：2018 年 01 月 08 日—01 月 14 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、本周开关站设备基础开始施工，箱变基础整平、支模、垫层浇筑 5 个。				
2、支架安装 350 组，共 1568 组，剩余 1218 组，已完成该工序的 22.32%。				
3、本周组件安装 33 组，共 1568 组，剩余 1535 组，已完成该工序的 2.10%。				
4、本周桩基础浇筑 1040 个，共 12544 个，剩余 5733 个，已完成该工序的 54.3%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、支架安装	22.32%			
2、组件安装	2.10%			
3、综合楼/附属建筑	0%			
4、场内桩基浇筑	54.3%			
5、送出工程（含对侧）	0%			
6、现场调试	0%			
7、出图情况	80%			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	12.26	12.28	上周支架材料到货 4 车
	组件		01.04	上周周到货 728 块，本周未到货。
	逆变			未到货
	升压变			未到货
	电 缆			未到货
	电气设备			未到货
11、人员/机械情况	挖机两台，钻机三台。，装载机两台。施工人员共 80 人。			

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、基础施工	11月18日至1月5日			
2、组件安装	12月21日至1月18日			
3、线路倒送电	1月25日			
4、首个发电单元并网	1月25日			
5、全容量并网	2与5日			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、前施工队遗留的彩钢房需要拆除。 2、军标、防空洞影响88亩约3MW，该区域内所有工序无法施工； 3、组件需要尽快进场			
未解决的协调问题解决进展	1、军事标识及防空洞等问题正在协调中。			
五、下周计划主要工作内容				
1、站用临电	进场送电			
2、支架安装	3MW			
3、桩基础浇筑	1200根			
4、围栏施工	700米			
5、组件安装	1.25NW			
6、一、二次设备基础	100%			
7、箱变砖砌体、圈梁浇筑、墙体抹灰	100%			

填报人： 苏军豪 审核人： _____ 时间： 2018年01月07日

工程现场照片（含文字描述）：

<p>组件开始安装</p>	<p>外线基础垫层浇筑完成</p>	<p>箱变基础施工</p>
		
<p>支架倾斜角度检查</p>	<p>第六次监理例会</p>	<p>开挖扁铁钩</p>
		
