

苏交控云杉清能沿海高速互通分布式光伏电站项目

工程周报

(南沈灶, 白蒲)

总包单位: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司

日期: 2017/12/18

一周天气:

时间	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
天气			晴	小雨	小雨	晴	晴
气温			-1℃-9℃	-1℃-9℃	-1℃-9℃	-1℃-9℃	-3℃-3℃

一、本周施工概况:

序号	主要施工事项
1	抽水
2	排水沟开挖
3	场地平整、临时道路
4	坐标定位
5	协调相关备案事宜
6	桩试验

二、总体实施计划: (甘特图)

三、形象进度图:

四、工程施工进度:

序号	工作内容	工程总量	本周完成量	累计完成		下周计划	备注
				完成量	完成率		
1	夹具安装						
2	支架安装						
3	组件安装						
4	逆变器安装						
5	汇流箱安装						
6	室外设备基础施工						

7	箱变安装						
8	一二次预制仓安装						
9	电缆敷设						
10	根据实际情况细化						

五、物资到货进度:

序号	物资名称	数量	单位	本周到货	累计到货	计划全部到货时间	已使用数量
1	组件		块				
2	支架		组				
3	逆变器		台				
4	箱变		台				
5	汇流箱		台				
6	一次预制仓		台				
7	二次预制仓		套				
8	电缆		米				
			米				
			米				
			米				
9	管桩	3811	根	199	199	2018. 1. 7	

六、图纸状态:

序号	图纸名称	计划出图	当日进展	是否满足当前进度	备注
1	组件布置图				
2					
3					

七、安全质量闭环统计:



序号	事由	发件单位	收件单位	是否闭环	备注
1					
2					
3					

八、手续办理情况:

序号	手续类别	相关部门	办理进度	跟踪人员
1				

九、需要协调事项:

十、工程图片:

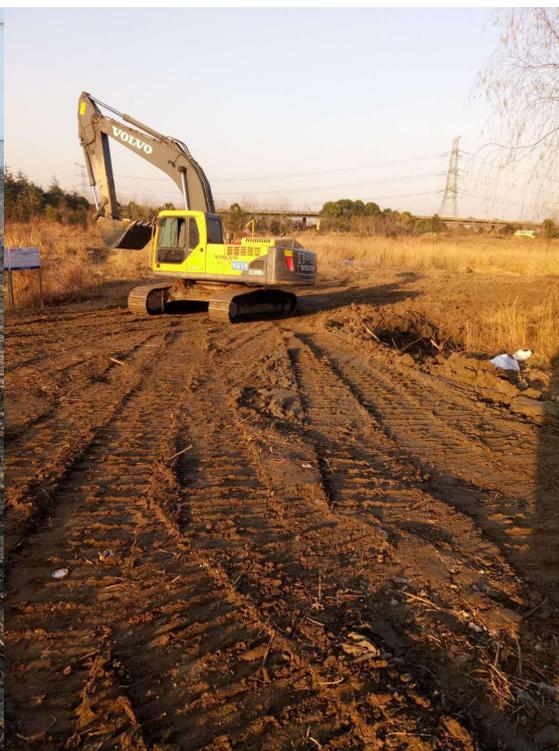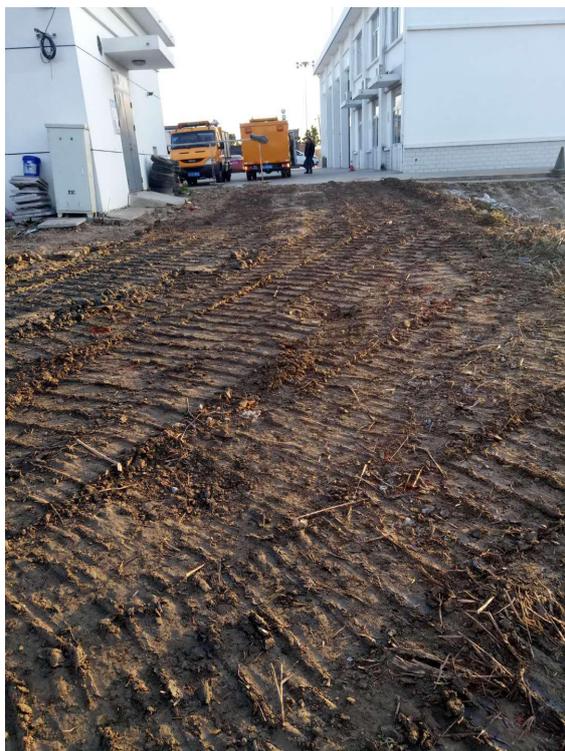



十一、 下周工作计划:

南沈灶打桩约 1000 根

完成白蒲场区路基施工

完成白蒲场地平整

完成备案手续事宜

供电公司外供电手续事宜

十二、 本周大事记
