

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 1 月 28 日 第五期

项目：华锐风电大重曲轴 1.5 兆瓦光伏项目		填报周期： 2018 年 01 月 22 日— 01 月 28 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、 屋面防水卷材施工完毕				
2、 南北屋面主次梁安装完成 100%，组件安装完成 100%				
3、并网柜接线完成 100%				
由于临近春节，工人处理好现场，年后进行消缺及未完成工程量继续作业				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、屋面防水	完成工程量 100%			
2、支架基础浇筑	完成工程量 100%			
3、支架、组件安装	完成工程量 49%			
4、防雷接地	完成 100%			
5、直流、交流电缆敷设	完成 100%			
6、逆变器安装	41 台安装完成			
7、汇流箱安装	12 台安装完成			
8、现场调试并网	无			
9、出图情况	电子版图纸，部分蓝图			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	2018.01.15	2018.01.16	全部到位
	组件	2018.01.12	2018.01.10	全部到位
	汇流箱	2018.01.16	2018.01、21	全部到位
	逆变器	2018.01.16	2018.01.15	全部到位


	电缆	2018.01.19	2018.01.18	全部到位
	并网柜	2018.01.21	2018.01.21	全部到位
11、人员/机械情况	吊车一辆，叉车一辆，施工人员 25 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2018.01.05		2018.01.05	
2、首套组件安装	2018.01.17		2018.01.17	
3、线路倒送电	2018.01.28			
4、首个发电单元并网	2018.01.28			
5、全容量并网	2018.01.28			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、屋面防水				
2、支架基础浇筑				
3、支架、组件安装				
4、防雷接地				
5、直流、交流电缆敷设				
6、逆变器安装				
7、汇流箱安装				

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报

8. 现场调试并 网	

填报人： 李金聚 审核人： 李维军 时间： 2018 年 1 月 28 日

工程现场照片（含文字描述）：

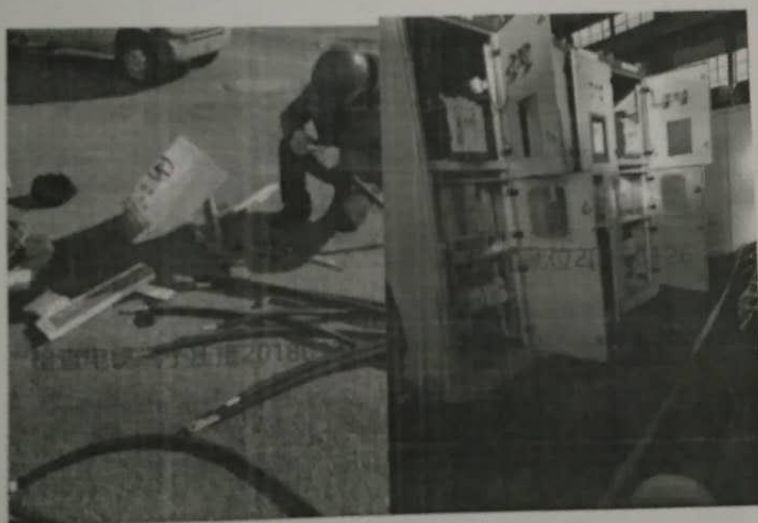



检查母排穿孔20180128



电缆放线20180128



逆变器就位20180125



商议28号停电20180125
