

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 4 月

011 期

项目：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目	填报周期： 月 22 日	2018 年 4 月 16 日— 4
---------------------	-----------------	--------------------

一、项目总体建设进度汇总：

一、黄柏镇

- 1、凯丰村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 2、合溪村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。
- 3、直坑村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 4、马莽村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 5、瑞兰村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 6、瑞律村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。

二、大柏地乡

- 7、大柏地村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 8、礮头村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 9、小岭村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 10、白坑村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

三、壬田镇

- 11、车头村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。

四、叶坪乡

- 12、寨下村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。
- 13、腰布村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。
- 14、新院村光伏扶贫电站，电站已建设完成，待并网。
- 15、福水村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。
- 16、黄沙村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 17、岭脑村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 18、谢排村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。
- 19、王屋村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。
- 20、石岗村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 21、松山村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。
- 22、均田村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。

五、日东乡

- 23、贡潭村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 24、樟坑村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 25、炉坑村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

六、云石山乡

- 26、沿坝村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

- 27、梅坑村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 28、云石山村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 29、石背村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

七、万田乡

- 30、东坑村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 31、井垅村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 32、青坝村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

八、沙洲坝镇

- 33、莲江村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 34、七堡村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

九、九堡镇

- 35、山坑村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 36、丰塘村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

十、冈面乡

- 37、上田村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。
- 38、沙排村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。

十一、瑞林镇

- 39、龙卧村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。
- 40、瑞红村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。
- 41、大汾村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。
- 42、安全村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。
- 43、里布村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。
- 44、水口村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。
- 45、民主村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。
- 46、盖州村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。
- 47、保卫村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。
- 48、廖坳村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。

十二、丁陂乡

- 49、山溪村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。
- 50、里田村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。
- 51、山龙村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。

十三、拔英乡

- 52、红门村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。
- 53、高岭村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。
- 54、荣新村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 55、大富村光伏扶贫电站，逆变器已完成安装。

十四、武阳镇

- 56、罗石村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

- 57、中赖村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 58、陈布村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 59、武阳村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 60、粟田村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 61、龙门村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 62、下洲村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

十五、谢坊镇

- 63、大嵊背村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 64、谢坊村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 65、云龙村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 66、水南村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 67、新建村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 68、塘背村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

十六、泽覃乡

- 69、明星村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 70、石水村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 71、新丰村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 72、陶林村光伏扶贫电站，逆变器、配电箱已安装完成，待并网。
- 73、兰崇村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 74、永红村光伏扶贫电站，组件已完成安装。
- 75、希平村光伏扶贫电站，组件已完成安装。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程	无
2、开关站/升压站	无
3、综合楼/附属建筑	无
4、场内桩基施工	无
5、支架及组件安装	75 个空壳村扶贫电站组件已全部安装完成。
6、逆变器及箱变	无
7、送出工程（含对侧）	无
8、现场调试	无

9、出图情况	图纸不全，部分图纸有电子档			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
11、人员/机械情况				
三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	蓝图未出，只有电子版施工图。个别村委仍未与电力部门签署相关文件。			
未解决的协调问题解决进展	个别村的光伏扶贫电站，并网接入点距离电站太远、变压器容量小、新建幼儿园无接入点，需要跟电力部门协商解决。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开	无			


关站工程	
4、组件区域工 程	无
5、逆变/箱变工 程	无
6、外线工程	无
7、其他	无

填报人： 李云 审核人： 苗守明 时间： 2018 年 4 月 22 日




工程现场照片（含文字描述）：



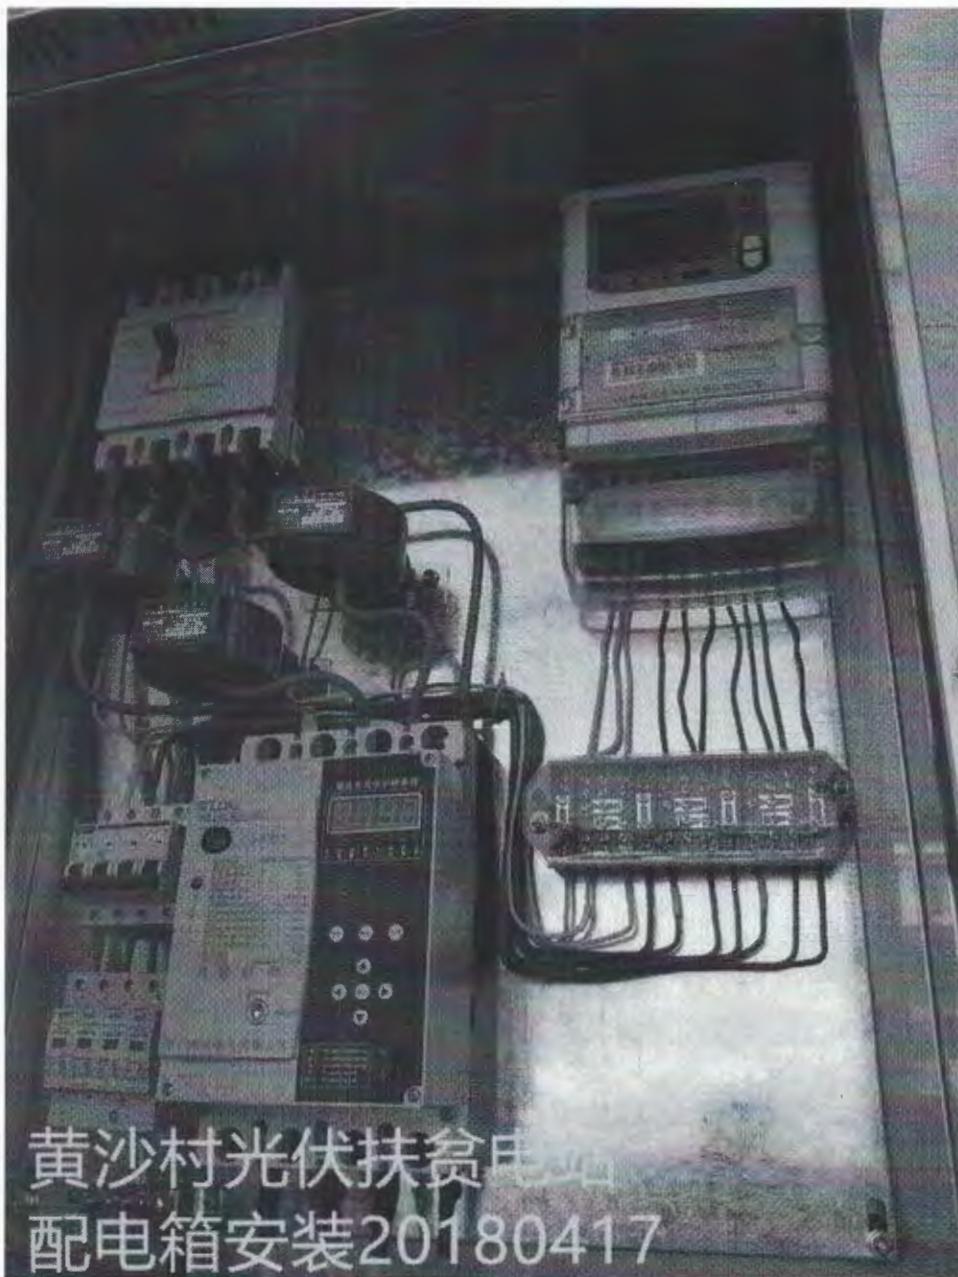






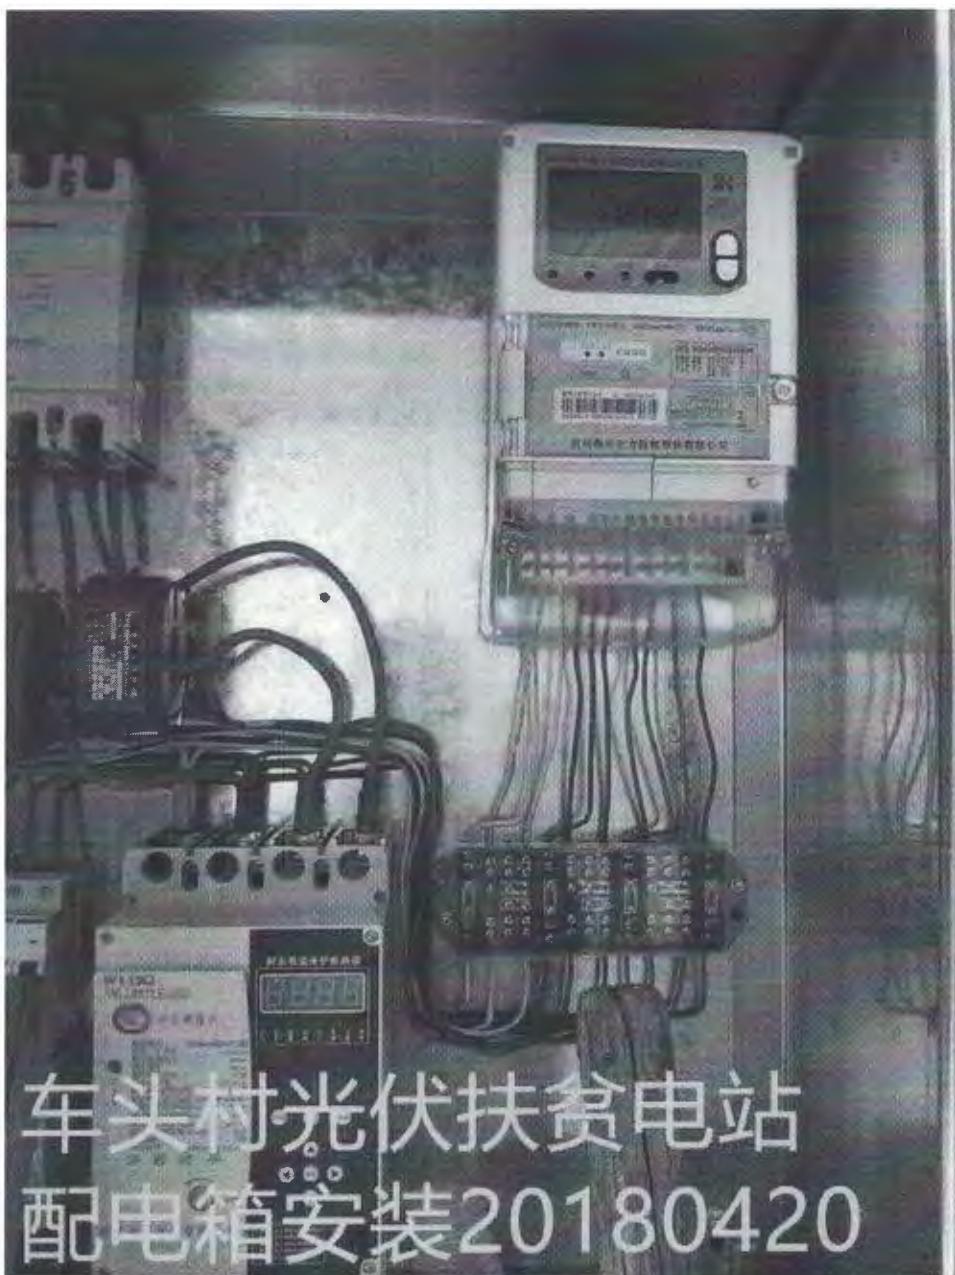



荣新村光伏扶贫电站
现场巡视光伏电站20180421



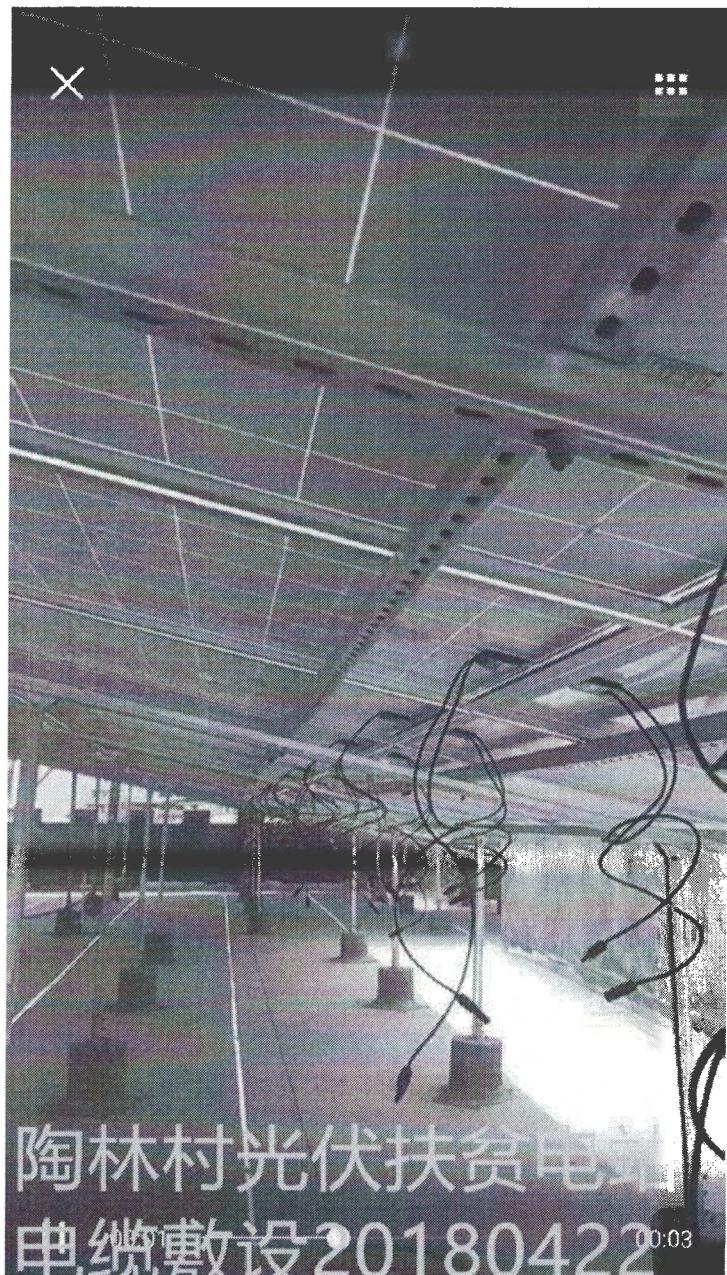

陶林村光伏扶贫电站
电缆敷设20180422

05:01

20:03
