

监 理 周 报

项目名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号 FXNGHB-ZHJL-003

项目地：徐州丰县师寨镇汪屯村

时间：2018/03/23

本周 施工 概况	1、光伏区桩基础浇筑完成（不包括坟地处）； 2、光伏区围栏完成 37%； 3、箱逆变基础完成 4 套，累计完成 6 套； 4、道路平整完成；
下周 施工 计划 情况	1、光伏区支架安装完成 2MW； 2、围栏全部安装完成； 3、箱逆变基础 4 月 3 日前全部完成； 4、室外设备基础施工完成 5 套；
施工 质量 情况	个别桩基础钢筋绑扎不符合要求；个别地脚螺栓不垂直；
材料进场 情况	支架进场
材料 进场 检验	支架镀锌层厚度符合图纸要求
隐蔽 验收	1#、2#、3#、4#、5#、6#箱逆变基础钢筋模板加工



情况							
发文情况	下发会议纪要 1 份						
收文情况	暂无收文						
安全情况	个别施工人员未戴安全帽，现场口头通知并整改；光伏区临时用电不规范，现场口头通知并整改；						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在 50 人左右。						
天气	19	20	21	22	23	24	25
	小雨	阴	晴	晴	晴	晴	晴

编制人：兰海宇 审核人：


编制时间：2017 年 03 月 23 日




由 扫描全能王 扫描创建



光伏区桩基础混凝土浇筑

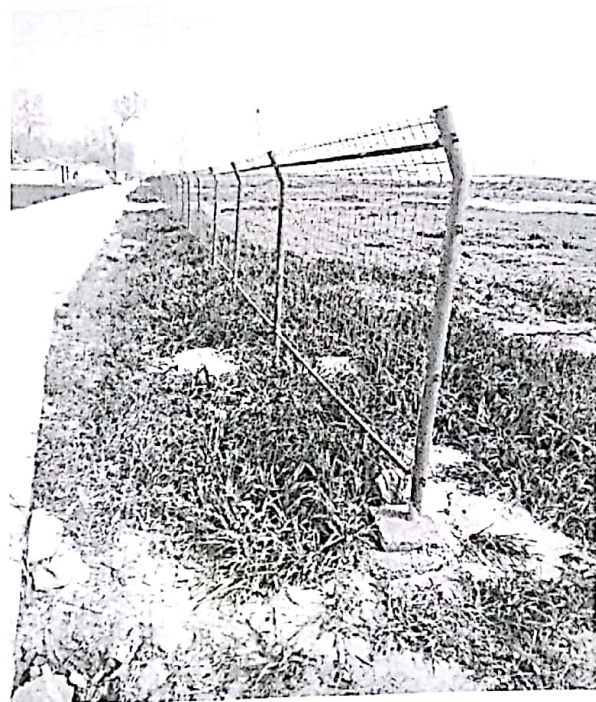

光伏区围栏安装

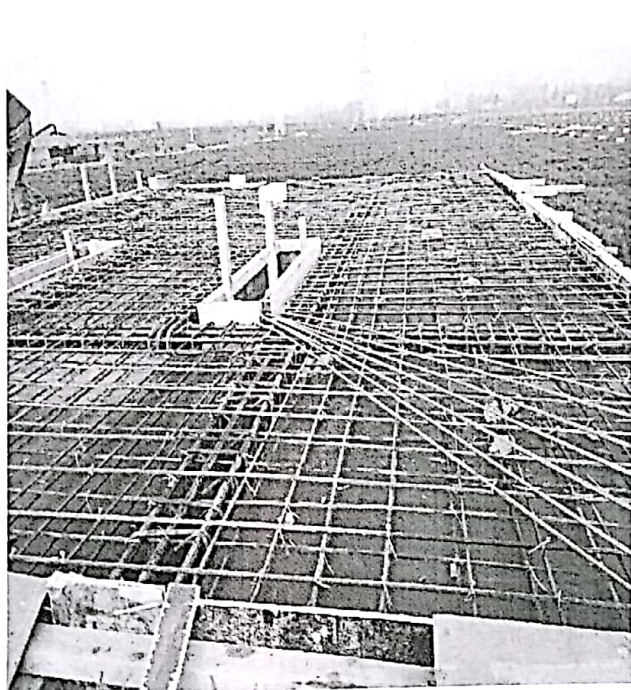

光伏区箱逆变基础钢筋绑扎



光伏区箱逆变基础混凝土浇筑

