

监 理 周 报

项目名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号 FXNGHB-ZHJL-006

项目地：徐州丰县师寨镇汪屯村

时间：2018/04/13

本周 施工 概况	1、光伏区支架安装完成 185 组，累计完成 377 组； 2、组件安装完成 39 组，累计完成 97 组； 3、室外设备基础施工已全部完成；
下周 施工 计划 情况	1、光伏区支架安装完成 2MW； 2、光伏区组件安装完成 3MW； 3、光伏区电缆敷设； 4、光伏区汇流箱开始安装； 5、光伏区光伏线缆敷设；
施工 质量 情况	部分组件安装不顺直，螺帽不紧固；支架安装时，部分檩条不顺直；
材料进场 情况	支架、汇流箱、SVG 设备进场
材料 进场 检验	符合图纸要求
隐蔽 验收 情况	光伏区接地焊接；升压站电缆沟钢筋绑扎；一二区高压电缆敷设；升压站高压电 缆敷设；




由 扫描全能王 扫描创建

发文情况	下发会议纪要 1 份 下发监理通知单 1 份						
收文情况	暂无收文						
安全情况	光伏区组件安装时，个别施工人员未系安全带；现场口头通知并整改；施工现场个别施工人员未戴安全帽，现场口头通知并整改；升压站设备吊装时，未设置安全警戒线，现场口头通知并整改；						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在 80 人左右。						
天气	9	10	11	12	13	14	15
	晴	多云	多云	小雨	小雨	多云	晴

编制人：兰海宇 审核人：平永顺 编制时间：2018 年 04 月 13 日



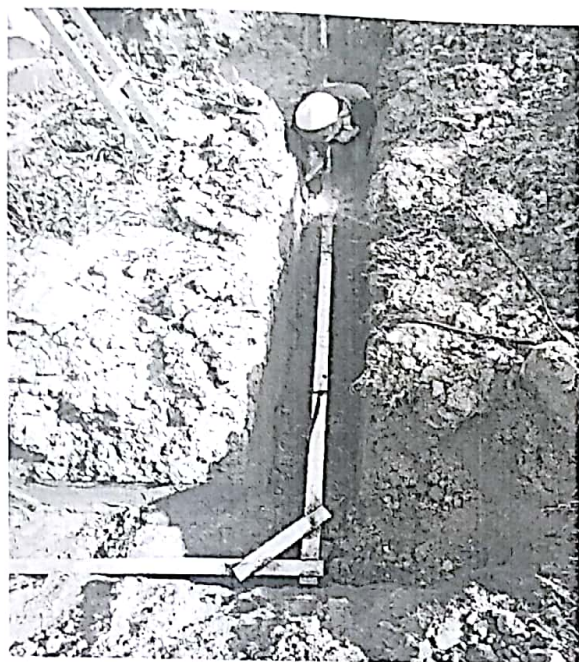


光伏区接地焊接



光伏区高压电缆敷设



光伏区支架安装

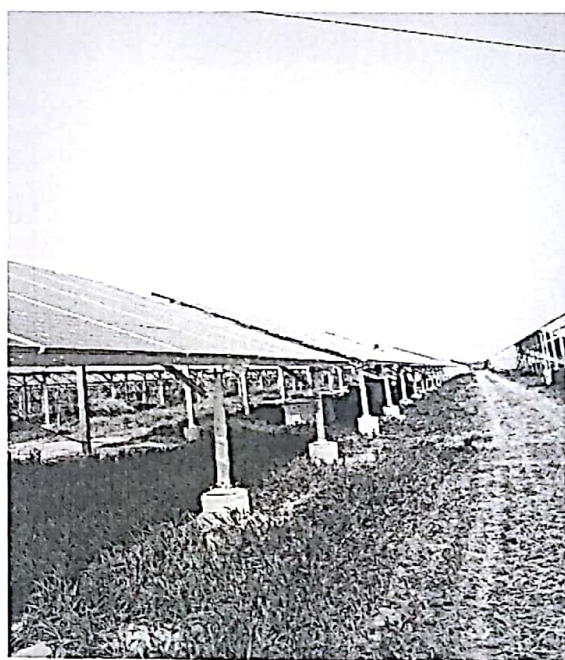

光伏区组件安装

