

正衡监理光伏项目工程建设监理周报


2018 年 第 17 期

项目：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目			填报周期：2018 年 07 月 22 日—07 月 29 日	
一、项目总体建设进度汇总：				
1、汇集站、箱变基础完成 100%，汇集站、箱变、并网柜试验调试完成 100%。2、电缆沟、电缆井 100%完成 3、安全通道搭设完成 100%。4、一期支架、组件、桥架、汇流箱、逆变器安装完成 100%，电缆敷设、电缆端头制作安装完成 100%，檩条加固 3#、4#、5#车间完成 100%。5、三期换瓦、支架、组件、逆变器、汇流箱桥架安装完成 100%、线路敷设端头制作安装完成 100%，10#、12#、11#屋顶围栏安装完成 90%。6、二期 7#、8#、9#车间屋顶彩钢瓦更换完成 100%，6#车间更换彩钢瓦完成 65%，7#8#9#车间组件安装完成 100%，桥架、逆变器、汇流箱安装完成 100%,7#8#车间 3*25、3*35 电缆敷设完成，8#车间直流线缆敷设完成 100%。7、6 月 29 日顺利并网（4MW），安全试运行 31 天。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程		二期、三期道路两侧垃圾清理个别未完成		
2、开关站/升压站/箱变		箱变变压器型号与图纸不符，更换完成。		
3、支架及组件安装		三期安全围栏安装完成 11#车间 90%。二期 7、8#车间屋顶组件、桥架安装完成 100%，7#车间 3*35 电缆完成 100%，8#车间电缆敷设完成 100%。		
4、逆变器及箱变/汇流箱		逆变器 9 日进场 99 台、汇流箱 19 日进场 50 台、5 月 19 日汇集站/箱变 2 台进场，二期 7、8#车间汇流箱、逆变器安装完成。		
5、安全围栏及消缺		三期防护栏安装完成 90%，接地网连接完成 90%；		
6、现场调试		箱变、汇集站、并网柜调试完成		
7、出图情况		结构、电气蓝图已完成，业主、设计、监理、总包、施工队会审完成，4 月 8 日设备二次图纸完成。一期钢构加固图纸完成，二期三期荷载报告完成，护栏设计院不按业主要求出图，电气二次蓝图完成。维修通道、清洗图纸未出图		
8、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	彩钢瓦	2018、4、18	2018、19	100%（三期）、二期 100%
	汇流箱	2018、5、14	2018、4、19	50 台
	支架	2018、4、25	2018、4、27	一、二期、三期支架进场完成
	组件	2018、6、15	2018、7、21	组件已全部进场（18624 块）
	桥架	2018、5、13	2018、5、27	一、二、三期进场完成

	逆变器	/	2018、4、9	99 台
	箱变	2018、5、25	2018、5、19	4 台
	直流电缆	2018、5、13	2018、5、25	100%
	高压电缆	2018、5、8	2018、5、25	100%
	汇集站	2018、5、13	2018、5、16	1 台
	加固材料	2018、4、22	2018、5、17	全部进场
	接地扁铁	2018、5、15	2018、6、7	6T
9、人员/机械情况	现场施工人员达到 16 人，小型使用工具运转正常，彩钢瓦加工设备、吊车等大型机械进场使用。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	/	/	2018、3、17	
2、首套组件安装	2018、5、15	2018、5、20	2018、5、21	
3、线路倒送电	2018、6、8	2018、5、30	2018、6、2	
4、首个发电单元并网	2018、6、10	2018、6、10	2018、6、29	
5、全容量并网	2018、6、30	2018、6、28		
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、三期安全防护	检查三期安全防护栏安装质量			
2、换瓦工程	检查二期车间屋顶换瓦安全防护			
3、消缺	检查项目整体存在质量问题，进行消缺			
3、其他	检查各个施工区域劳保用品使用安全工作，降温防暑物品发放情况。			

填报人：黎建光 审核人：_____ 间：2018年07月29日

保温棉更换

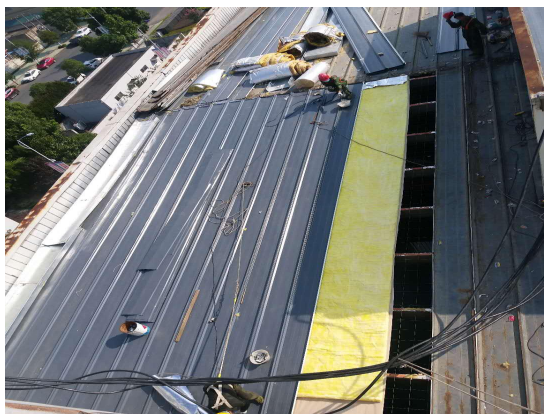

变压器更换



彩钢瓦更换



工程例会



桥架敷设



安全检查

