

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 第六期

项目：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目			填报周期：2018 年 05 月 5 日—05 月 12 日	
一、项目总体建设进度汇总：				
1、汇集站、箱变基础完成 100% 。2、电缆沟、电缆井 100%完成。3、安全通道搭设完成 100%。4、一期支架安装完成 100%。5、三期换瓦完成 80%、支架夹具安装完成 80%				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	二期、三期道路清理完成			
2、开关站/升压站/箱变	汇集站、箱变基础完成			
3、支架及组件安装	一期安装支架安装完成，三期开始安装支架。			
4、逆变器及箱变/汇流箱	逆变器 9 日进场 99 台、汇流箱 19 日进场 50 台			
5、送出工程（含对侧）	/			
6、现场调试	/			
7、出图情况	结构、电气蓝图已完成，业主、设计、监理、总包、施工队会审完成，4 月 8 日设备二次图纸完成。一期钢构加固图纸完成，二期三期荷载报告完成，护栏设计院不按业主要求出图。维修通道、清洗图纸未出图			
8、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	彩钢瓦	2018、4、18	2018、19	60%
	汇流箱	2018、5、14	2018、4、19	50 台
	支架	2018、4、25	2018、4、27	一、三期支架进场完成
	组件	2018、5、12		
	桥架	2018、5、13		
	逆变器	/	2018、4、9	99 台
	箱变	2018、5、25		
	直流电缆	2018、5、13		
	高压电缆	2018、5、8		

	加固材料	2018、4、22		
9、人员/机械情况	现场施工人员达到 40 人，小型使用工具运转正常，彩钢瓦加工设备、吊车等大型机械进场使用。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	/	/	2018、3、17	
2、首套组件安装	2018、5、15			
3、线路倒送电	2018、6、8			
4、首个发电单元并网	2018、6、10			
5、全容量并网	2018、6、30			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、旧彩钢瓦及时清运。 2、一期加固配合施工、组件及时进场。			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、三期安全防护	检查三期安全防护栏加工安装质量			
2、换瓦、加固工程	检查三期 10#(西侧)、12#(东侧) 厂房屋顶彩钢瓦换瓦完成情况，一期厂房加固质量。			
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程	三期厂房屋顶支架安装质量验收、组件进场检查。			
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程	无			
7、其他	检查各种材料进场规格及各个施工区域安全工作，			

填报人：黎建光 审核人：_____ 时间：2018年05月12日

工程现场照片（含文字描述）：



安装彩钢瓦



安装彩钢瓦




监理王经理巡视



支架安装



支架进场检查

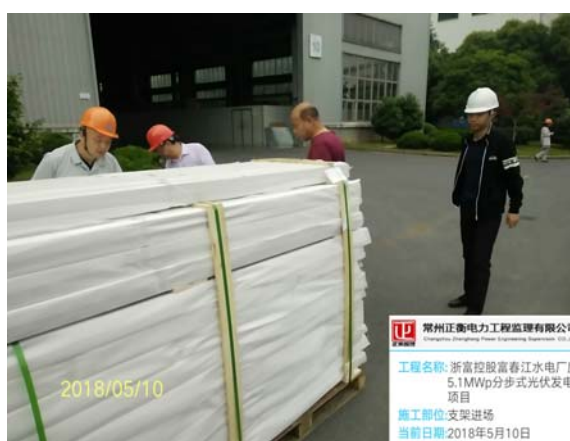

支架进场检查



现场夹具拉拔



工程例会



一期加固指挥员



安全防护材料



夹具拉拔实验



箱变接地电阻测试
