

湖南湘阴县4×20兆瓦渔光互补扶贫项目 周报

2018年06月23日

—

2018年06月30日

湖南湘阴县4×20兆瓦渔光互补扶贫项目

监理单位
监理项目部

2018年06月30日

1、本周项目进展情况

1) 施工准备工作及手续办理

序号	项目手续	完成情况
1	项目立项批准文件	已完成
2	升压站国土预审	已完成
3	压覆矿产资源报告（调查表）及审查意见	已完成
4	规划批复	已完成
5	土地审查意见	已完成
6	林业审查意见	已完成
7	水利审查意见	已完成
8	建设工程规划申请、许可证	办理中
9	建设用地规划申请、许可证	办理中
10	建设工程文物调查评价报告及文物古迹勘探、发掘、保护工作等报告	办理中
11	环保批复	已完成
12	并网调度协议	已完成
13	购售电合同	已完成
14	调度编号、调度命名及管辖范围	已完成
15	省质监站验收及并网受电通知书	已完成
16	高压供用电合同	已完成
17	水保批复	办理中
18	消防验收	办理中
19	土地证	办理中
20	安评批复	已完成
21	发电许可证	办理中

2) 设计工作

外线已出施工蓝图，升压站、光伏区提供部分电子版图纸。

3) 土建工程

光伏区工程：本周打桩完成249根，累计完成1391根，完成率4.4%；立柱焊接，电缆牵引管施工。

升压站工程：站内土方回填2%，累计完成87；配电楼主体累计完成90%；配电楼室内墙粉刷累计完成80%，照明管线累计完成80%；电缆沟支架安装累计完成100%；户外电缆沟砌筑10%，累计完成90%；避雷器、电压互感器、隔离开关、电流互感器、断路器、主变中性点等设备基础浇筑累计完成100%；接地变、FC、SVG基础完成10%，累计完成100%；事故

油池累计完成100%；围墙施工完成21%，累计完成25%。

4) 机电安装工程

光伏区支架安装完成34组，累计完成36组，完成率0.21%；组件安装完成34组，累计完成36组，完成率0.21%；汇流箱安装完成20台，完成率1.43%；箱变就位完成6台，累计完成8台，完成率12.5%；逆变器就位完成6套，累计完成8套，完成率12.5%；电缆桥架安装完成13%，累计完成20%；35kV集电线路敷设完成55%；35kV集电线路电缆头制作完成16个；箱逆变控制电缆接线完成8个，完成率12.5%；光伏线敷设完成4%；直流电缆敷设完成4%。

升压站主变附件安装完成100%；FC设备安装完成95%；SVG设备安装完成95%；接地变就位完成；电缆沟支架安装累计完成90%；高压开关柜接线完成80%，累计完成100%；二次继保屏柜接线完成90%，累计完成100%；蓄电池安装完成80%，累计完成100%；母线安装完成100%；计算机设备安装完成100%；设备调试完成100%。

6月29日14:59升压站倒送电，6月30日9:00光伏区集电线路送电，并网0.2MW。

5) 送出工程

总计 35 座铁塔。塔基坑开挖累计完成 35 基，完成率 100%；塔基基础浇筑累计完成 35 基，完成率100%；铁塔组立累计完成 35 座，完成率100%；铁塔导线架设累计完成率100%；光缆架设累计完成率100%；地线架设累计完成率100%。

对侧间隔改造工程户外一次设备基础浇筑及立杆累计完成100%；一次设备安装完成50%，累计完成100%；二次设备安装完成100%。

6) 主设备到货情况

序号	名称/型号	总数量	本周到货	累计到货	生产厂家
1	光伏组件	380160 块	0块	8696块	环欧国际
2	支架	80MWp	0.1MW	5.3MW	中信博
3	逆变器	64 套	0套	10套	和望电气
4	箱式变压器	64 台	0台	10台	山东泰开

5	管桩	43200 根	552根	2078根	大华、晟宇
6	汇流箱	1152 台	0台	148台	科比特
7	主变	1 台	0台	1台	山东达驰
8	接地变	2 套	0台	1台	唐山东唐
9	二次继保屏柜	32台	0台	32台	深瑞
10	高、低压柜	18台	0台	18台	向荣集团
11	SVG成套装置	1套	0套	1套	合容电气
12	FC成套设备	1套	0套	1套	永锦电气

7) 安全、文明生产情况

施工人员均配戴安全帽；高空作业人员均佩戴安全带；水上作业人员穿戴救生衣；电焊机有可靠接地；临时用电规范。现场安全管控符合安全规定要求。

8) 阶段验收

未开始阶段验收工作。

2、下周工作计划

1) 土建工程

光伏区部分：打桩完成1400根。

开关站部分：配电楼内墙涂料施工，外墙粉刷完成，屋面防水施工；站内围墙施工。站内土方回填，综合楼地基开挖。

2) 机电安装工程

光伏区工程：立柱焊接、支架安装，组件安装，汇流箱安装、接线，光伏线敷设，直流电缆敷设。

升压站工程：SVG、FC、接地变接线完成。

3) 送出工程

对侧间隔设备安装、接线、调试已全部完成。

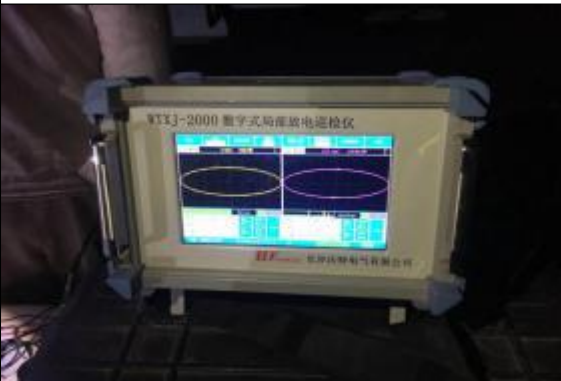
3、存在问题及需要协调事宜

4、里程碑节点执行情况

里程碑节点名称	完成时间	备注
首个光伏发电单元基础开始施工	2018年6月2日	

首个光伏发电单元开始安装	2018年6月22日	
开关站基础开始施工	2018年5月1日	
配电楼屋面封顶	2018年6月1日	
综合楼屋面封顶		
开关站受电	2018年6月29日	14:59
首个光伏发电单元发电	2018年6月30日	9:00
全部光伏发电单元整套启动开始 240 小时 并网试运行		
项目整体正式移交生产		

5、现场影像资

	
主变油池底板绑扎钢筋	光伏区支架、组件安装
	
35kV电缆头制作	主变局部放电试验
	
升压站倒送电启动委员会	升压站启动倒送电



升压站倒送电操作



并网成功

