

# 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目周报

2018 年 04 月 29 日

---

2018 年 05 月 05 日

湖南汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部

2018 年 05 月 05 日



由 扫描全能王 扫描创建

## 1、本周项目进展情况

### 1) 施工准备工作及手续办理

序号	项目手续	完成情况
1	核准、备案批复	已取得备案
2	选址意见书、审查、批复	已取得选址意见
3	建设用地评估报告、用地预审批复	已取得用地预审
4	环保评价报告、批复	环评报告出版已出具，已完成评审，正在修改报告
5	水保设计、批复	水保报告已完成评审，已提供修改后报告
6	消防设计报告、图纸、审查意见	
7	安全条件论证及备案	安评已委托，正在编制
8	节能评估报告及批复	
9	地质灾害危险性评估审查意见	已完成
10	压覆重要矿产资源审查意见	已完成
11	征占林地、林木砍伐、审查、许可	不涉及林地
12	社会稳定风险审查意见	
13	文物勘察	已完成
14	防洪评估	报告已完成评审，已提供修改后报告
15	接入系统设计报告、方案	已完成
16	接入系统设计评审意见	双河坝项目已取得接入系统批复，南河坝项目已取得会议纪要
17	土地证	
18	建设用地规划许可证	
19	建设工程规划许可证	
20	施工许可证	
21	施工图设计文件审查合格书	
22	防雷接地	



由 扫描全能王 扫描创建

23	电力质监验收	
24	水保验收	
25	安监验收	
26	环保验收	
27	消防备案验收	
28	并网协议	
29	调度命名及编号	
30	并网调度协议	
31	供用电合同	
32	购售电合同	
33	电价批复	
34	电力业务许可证	
35	调度证明文件(证明满足电网稳定运行文件)	
36	线路运维协议	
37	启动并网批准书	

## 2) 设计工作

综合办公楼电子版图纸已出。

## 3) 土建工程

光伏区工程：

本周进场道路路基施工，临建项目部地坪施工完成。

35kV 开关站工程：

本周配电综合楼条形基础浇筑、墙体砌筑、基础圈梁浇筑，办公综合楼条形基础浇筑、放线，临时道路铺设道渣。

## 4) 机电安装工程

## 5) 送出工程

本周铁塔组立完成 13 基：G6、G7、G8、G12、G13、G15、G16、



由 扫描全能王 扫描创建

G18、G19、G20、G21、G22、G25。

### 6) 主设备到货情况

序号	名称/型号		总数量	本周到货	累计到货	生产厂家
1	组件		片	片	片	
			片	片	片	
2	支架		MW	MW	MW	
			MW	MW	MW	
3	逆变器		套	套	套	
			套	套	套	
4	箱变		台	台	台	
			台	台	台	
5	管桩 (包括箱逆 变基础桩)		根	根	根	
			根	根	根	
6	汇流箱		台	台	台	
			台	台	台	
7	一次设备		100%	0	%	
8	主变		台	台	台	
9	SVG		套	套	套	
10	接地变		台	台	台	
11	塔材		32 基	3 基	28 基	
12	金具		32 基	32 基	32 基	

### 7) 安全、文明生产情况

施工人员佩戴安全帽，现场安全文明施工良好；现场起吊卸货及现场安全管控符合安全规定要求。

### 8) 阶段验收

### 2、下周工作计划



由 扫描全能王 扫描创建

## 1) 土建工程

光伏区部分：

35kV 开关站部分：

计划配电综合楼基础土方回填、一层墙体砌筑、一层内支模安装、一层顶板安装完成，办公综合楼砖基础砌筑、圈梁钢筋绑扎、模板安装完成。

## 2) 机电安装工程

光伏区部分：

35kV 开关站部分：

## 3) 送出工程

完成剩余铁塔组立，紧固铁塔螺栓，完成导线架设前的自检工作。

## 3、存在问题及需要协调事宜

1. 配电综合楼电缆沟及设备基础图纸尽快出图。

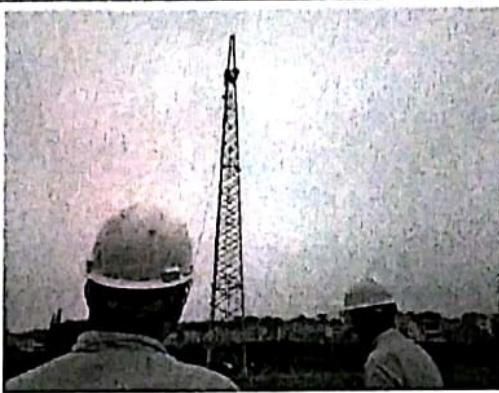
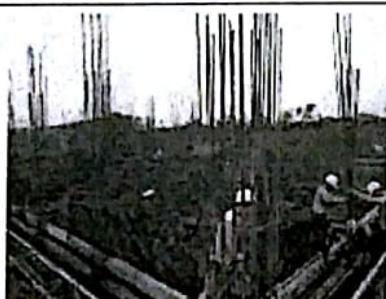
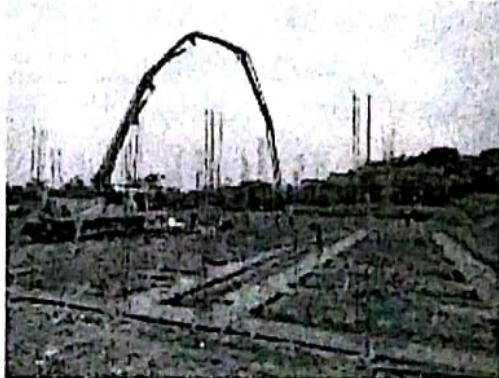
## 4、里程碑节点执行情况

里程碑节点名称	完成时间	备注
首个光伏发电单元基础施工		
首个光伏发电单元安装		
开关站基础开始施工		
综合楼屋面封顶	2018.5.14	
开关站受电		
首个光伏发电单元发电		
全部光伏发电单元整套启动开始 240 小时并网试运行		
项目整体正式移交生产		



由 扫描全能王 扫描创建

## 5、现场影像资料

	
7#铁塔组立	8#铁塔组立
	
12#铁塔组立	19#铁塔组立
	
配电综合楼钢筋绑扎	配电综合楼基础浇筑
	
配电综合楼基础墙砌筑	办公综合楼基础浇筑



由 扫描全能王 扫描创建
