

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目周报

2019 年 1 月 20 日

2019 年 1 月 26 日

湖南汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



2019 年 1 月 26 日

1、本周项目进展情况

1) 手续办理情况

序号	事项	进展情况	复印件收到情况
1	项目公司注册	已完成	无
2	开发协议	已完成	无
3	备案	已完成	有
4	指标	已取得 35 兆瓦扶贫指标	无
5	租赁协议	已完成	有
6	可研	已完成	无
7	勘测定界	已完成	有
8	地灾	已完成	有
9	压覆矿	已完成	有
10	土地预审	双河坝 20MW 土地预审已完成	有
11	建设用地报批	正在办理	
12	环评	已完成	有
13	水保	已完成	有
14	接入系统	已完成	有
15	防洪	已完成	有
16	安全预评价	报告已完成	有
17	军事	已完成	有
18	文物	已完成	有
19	开工许可证	待建设用地报批完成后办理	
20	高压供电合同	已完成	无
21	购售电合同	已完成	有
22	电力工程并网通知书	已完成	无
23	送出工程核准	双河坝送出线路核准预计近期取得	

24	发电业务许可证	尚未办理	
25	节能评估报告及批复		
26	设计报告、方案	已完成	无
27	土地证		
28	施工图设计文件审查合格书	已完成	无
29	安监验收		
30	防雷接地验收		
31	消防验收		
32	并网调度协议	已完成	有
33	规划选址意见	已完成	有
34	土地规划	已完成	有
35	林业审查	已完成	有
36	项目公司及母公司证照	已完成	有

2) 设计工作

已完成设计交底和图纸会审工作。

3) 本周工程完成情况

光伏区工程：

箱逆变平台钢框架本周完成 1 套，累计完成就位 9 套；逆变器本周完成 0 台，累计完成就位 8 台；箱变本周完成 0 台，累计完成就位 8 台；预制桩打桩本周完成 1174 根，累计完成 7847 根；光伏组件安装本周完成 1642 块，累计完成 19817 块；支架安装本周完成 1.29MW，累计完成 8.21MW；汇流箱安装本周完成 0 台，累计完成 76 台；2*50 直流电缆敷设本周完成 0 米，累计完成 2107 米；2*70 直流电缆敷设本周完成 0 米，累计完成 849 米；2*95 直流电缆敷设本周完成 0 米，累计完成 348 米；100 桥架敷设本周完成 0 米，累计完成 594 米；300 桥架敷设本周完成 0 米，累计完成 255 米；400 高压桥架敷设本周完成 0 米，累计完成 938 米；本周并网 0MW，累计并网容量 3.36MW。

35kV 开关站工程:

污水处理池管道安装完成; 办公综合楼橱柜, 吊柜制作安装完成; 站内场地平整完成; 电缆移交; 办公综合楼、配电综合楼土建电气自检消缺; 办公综合楼装饰装修完成、卫生清理完成, 具备入住条件。

第二条送出线路(南琴线):

2#、5#塔基桩位完成浇筑, 4#塔基桩位开挖完成。

4) 送出工程

第一条送出线路(双桃线)已全部完成; 第二条送出线路(南琴线)

已于1月8日开工。

5) 主要设备到货情况

序号	名称/型号	总数量	累计到货	生产厂家
1	光伏组件	150606 块	23244 块	天津环欧
2	支架	52MW	20.8MW	江苏中信博
3	逆变器	32 台	15 台	禾望电气
4	箱式变压器	32 台	13 台	山东泰开
5	管桩	约 17736 根	8819 根	
6	汇流箱	720 台	261 台	湖南科比特/苏州长风/珠海瓦特
7	主变	无		
8	接地变	2 台	2 台	河北博为

6) 安全、文明生产情况

施工人员佩戴安全帽等安全用品, 现场起吊卸货及现场安全管控符合安全规定要求, 总体上现场安全文明施工基本良好。

7) 阶段验收

2018 年 6 月 28 日并网, 2018 年 11 月 08 日二次并网。

8) 里程碑节点执行情况

里程碑节点名称	完成时间	备注
首个光伏发电单元基础施工	2018.7.8	

首个光伏发电单元安装	2018. 7. 25	
开关站基础开始施工	2018. 4. 19	
综合配电楼屋面封顶	2018. 5. 19	
开关站受电	2018. 6. 28	
首个光伏发电单元发电	2018. 6. 28	
全部光伏发电单元整套启动开始 240 小时并网试运行	/	
项目整体正式移交生产	/	

2、下周工作计划：

光伏区：

码头及料场整理，因春节放假，无施工计划。

35kV 开关站：

办公综合楼、配电楼自检消缺；做好春节放假的各项工作。

第二条送出线路（南琴线）：

因春节放假，无施工计划。

3、存在问题及需要协调事宜

1)、光伏区：

1. 受雨雪天气影响，进度缓慢；
2. 进场材料报验不及时。


2)、开关站：

1. 受雨雪天气影响，进度较缓慢；
2. 现场施工资料报验滞后。


3) 第二条送出线路（南琴线）：

- 1、受雨雪天气影响，进度较缓慢；
- 2、施工方有关资料报验滞后。

4、现场影像资料

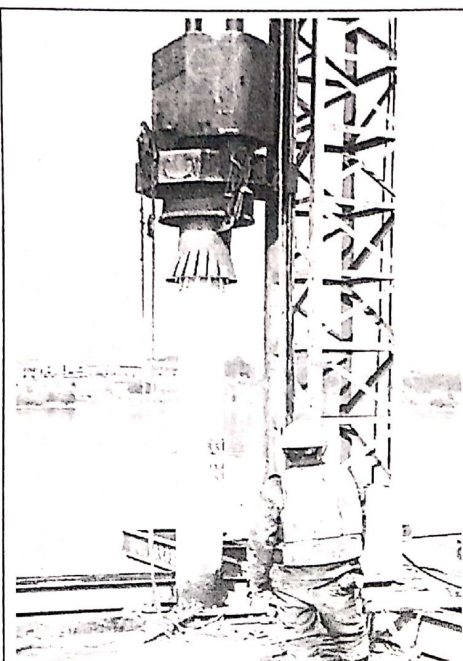

光伏区打桩施工

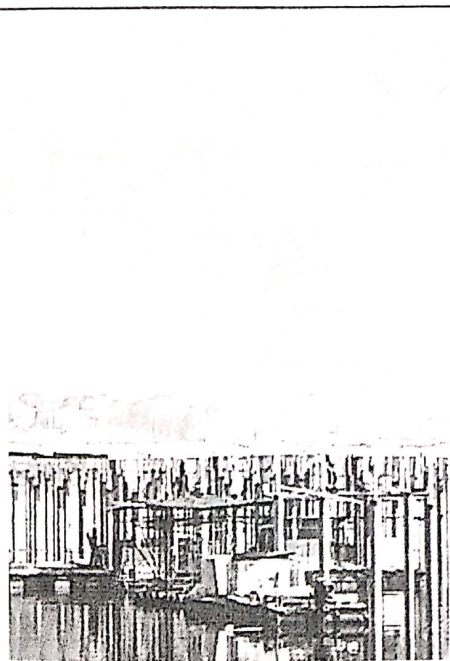

光伏区组件安装



南琴线 2#塔基混凝土浇筑



业主领导、监理人员琴棋变查看



监理人员外线施工情况检查



监理人员巡视检查
