

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目周报

2019 年 1 月 6 日

——

2019 年 1 月 12 日

湖南汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



2019 年 1 月 12 日

1、本周项目进展情况

1) 手续办理情况

序号	事项	进展情况
1	项目公司注册	已完成
2	开发协议	已完成
3	备案	已完成
4	指标	已取得 35 兆瓦扶贫指标
5	租赁协议	已完成
6	可研	已完成
7	勘测定界	已完成
8	地灾	已完成
9	压覆矿	已完成
10	土地预审	已完成
11	建设用地报批	正在办理
12	环评	已完成
13	水保	已完成
14	接入系统	已完成
15	防洪	已完成
16	安全预评价	报告已完成
17	军事	已完成
18	文物	已完成
19	开工许可证	待建设用地报批完成后办理
20	高压供电合同	已完成
21	购售电合同	已完成
22	电力工程并网通知书	已完成
23	送出工程核准	双河坝送出线路核准预计近期取得
24	发电业务许可证	尚未办理
25	节能评估报告及批复	

26	设计报告、方案	已完成
27	土地证	
28	施工图设计文件审查合格书	已完成
29	安监验收	
30	防雷接地验收	
31	消防验收	

2) 设计工作

已完成设计交底和图纸会审工作。

3) 本周工程完成情况

光伏区工程：

箱逆变平台钢框架本周完成 2 套，累计完成就位 7 套；逆变器本周完成 1 台，累计完成就位 6 台；箱变本周完成 2 台，累计完成就位 6 台；预制桩打桩本周完成 969 根，累计完成 5538 根；光伏组件安装本周完成 1294 块，累计完成 13981 块；2*50 直流电缆敷设本周完成 0 米，累计完成 2107 米；2*70 直流电缆敷设本周完成 0 米，累计完成 849 米；2*95 直流电缆敷设本周完成 0 米，累计完成 348 米；400 高压桥架敷设本周完成 45 米，累计完成 842 米；100 桥架敷设本周完成 126 米，累计完成 594 米；300 桥架敷设本周完成 0 米，累计完成 255 米；支架安装本周完成 2.02MW，累计完成 6.42MW；汇流箱安装本周完成 4 台，累计完成 76 台；桩头防腐本周完成 0 个，累计完成 668 个。接地扁铁焊接施工 0 米，累计完成 390 米；本周并网 0.52MW，累计并网容量 3.36MW。

35kV 开关站工程：

- 1、污水处理池模板拆除，污水处理池回填等其他后续所有工程基本完成。
- 2、站内开关采用电脑制作标牌标识完成，办公综合楼宿舍门牌制作安装完成；
- 3、办公综合楼橱柜制作安装完成；
- 4、站内场地平整完成，站内道路平整施工浇筑砼完成 40%；（因天气下雪造成现场无法施工）

- 5、开关站伸缩大门制作完成。
- 6、办公综合楼、配电综合楼土建电气自检消缺。
- 7、办公综合楼装饰装修基本完成、卫生清理完成。

第二条送出线路（南琴线）：

7#、8#、9#塔基桩位刨挖、装模施工已完成。

4) 送出工程

第一条送出线路（双桃线）已全部完成；第二条送出线路（南琴线）

已于1月8日开工。

5) 主要设备到货情况

序号	名称/型号	总数量	累计到货	生产厂家
1	光伏组件	150606 块	23244 块	天津环欧
2	支架	52MW	14MW	江苏中信博
3	逆变器	32 台	13 台	禾望电气
4	箱式变压器	32 台	13 台	山东泰开
5	管桩	约 17736 根	6672 根	
6	汇流箱	720 台	135 台	湖南科比特/苏州长风/珠海瓦特
7	主变	无		
8	接地变	2 台	2 台	河北博为

6) 安全、文明生产情况

施工人员佩戴安全帽等安全用品，现场起吊卸货及现场安全管控符合安全规定要求，总体上现场安全文明施工基本良好。

7) 阶段验收

2018年6月28日并网，2018年11月08日二次并网。

8) 里程碑节点执行情况

里程碑节点名称	完成时间	备注
首个光伏发电单元基础施工	2018.7.8	
首个光伏发电单元安装	2018.7.25	

开关站基础开始施工	2018. 4. 19	
综合配电楼屋面封顶	2018. 5. 19	
开关站受电	2018. 6. 28	
首个光伏发电单元发电	2018. 6. 28	
全部光伏发电单元整套启动开始 240 小时并网试运行	/	
项目整体正式移交生产	/	

2、下周工作计划：

光伏区：

- 1) 厂区打桩 750 根；
- 2) 光伏板安装 6528 块；
- 3) 箱逆变及钢平台就位 1 套；
- 4) 支架安装 92 组；
- 5) 立柱焊接 528 根。

35kV 开关站：

- 1、站内道路平整施工浇筑砼完成；站内道路硬化、站外排水、站内绿化完成；
- 2、完成围墙和围墙站外排水沟；
- 3、开关站伸缩大门安装完成。
- 4、办公综合楼、配电综合楼土建电气自检消缺。

第二条送出线路（南琴线）：

10#、12#基位施工

3、存在问题及需要协调事宜

1)、光伏区：

1. 受雨雪天气影响和现场施工人员、设备不足等原因，进度缓慢；
2. 进场材料报验不及时。

2)、开关站：

1. 受雨雪天气影响，进度较缓慢；


2. 现场施工资料报验滞后。

3) 第二条送出线路（南琴线）：


1、受雨雪天气影响，进度较缓慢；

2、施工方有关资料报验滞后。

4、现场影像资料




光伏区打桩施工



光伏区支架安装




第二条送出线路（南琴线）施工

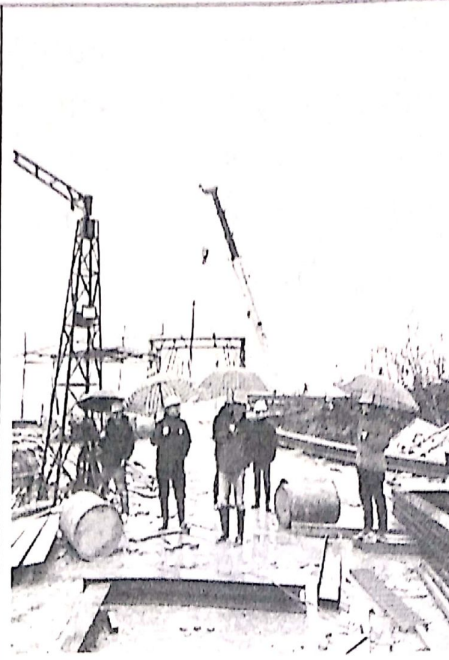

业主领导现场检查工作



监理人员巡视检查



监理人员材料检查
