

# 工程建设监理周报

2018 年 4 月 15 日 第一期

项目增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程	填报周期： 2018 年 4 月 9 日— 4 月 15 日			
<p>一、项目总体建设进度汇总：</p> <p>1、目前线路开展工作，6#7#8#塔基基础定点放线，开挖基础</p> <p>2、光伏区打桩方案未确定，目前没有开展工作</p> <p>3、升压站目前开展工程，定点放线，基础开挖</p>				
二、本周工程建设工作及完成情况				
1、升压站定点放线	15%			
2、升压站基础浇注				
2、线路基础定点放线	85%			
3、线路塔基基础开挖	35%			
4、光伏区基础	无			
5、出图情况	电子版图纸，部分图纸			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架			
	组件			
	汇流箱			
	逆变器			

	箱变			
<b>11、人员/机械情况</b>	挖机 2 台、引孔机 2 台，冲击桩一台，打桩机一台，施工人员 23 人			
<b>三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：</b>				
<b>项目主节点</b>	<b>计划日期</b>	<b>调整日期</b>	<b>完成日期</b>	<b>延误原因及赶工措施（简述）</b>
<b>1、首个基础施工</b>				
<b>2、首套组件安装</b>				
<b>3、线路倒送电</b>				
<b>4、首个发电单元并网</b>				
<b>5、全容量并网</b>				
<b>四、主要协调问题及解决情况</b>				
<b>提出需要协调的问题</b>	光伏区打桩确定方案			
<b>未解决的协调问题解决进展</b>	未解决			
<b>五、下周计划主要工作内容</b>				
<b>1、升压站定点放线</b>	35%			
<b>2、升压站基础浇注</b>	10%			
<b>2、线路基础定点放线</b>	100%			
<b>3、线路塔基基础开挖</b>	55%			
<b>4、光伏区基础</b>	15%			
<b>5、出图情况</b>	电子版图纸，部分图纸			

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报

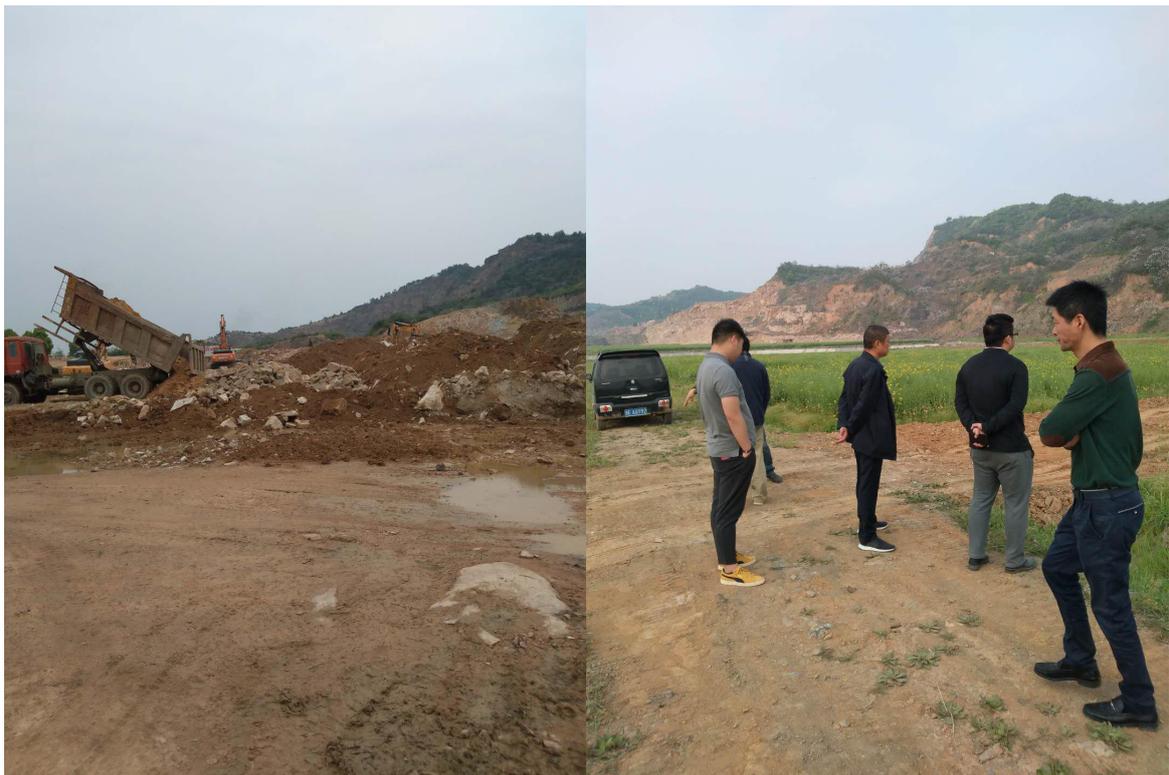

填报人： 李金梁 审核人： 郭莹 时间： 2018 年 4 月 15 日



工程现场照片（含文字描述）：



光伏区试桩



升压站回填土及查看光伏区试桩
