

工程建设监理周报

2018 年 5 月 14 日 第五 期

项目增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程		填报周期：2018 年 5 月 8 日— 5 月 14 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、光伏区桩定位，打桩共约 1450 根、箱变基础开挖完成 6 个，基础浇注完成 4 个				
2、升压站设备基础浇注完毕，主变设备进场、GIS 设备进场、35kV 开关柜进场，电气施工人员进场施工，主控楼二次拼柜设备基础制作，场区电缆沟、接地施工及回填土				
3、线路 1#2#6#7#8#9#基础浇注完成，3#4#5#基础开挖备料				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、升压站定点放线	90%			
2、升压站基础浇注	97%			
2、线路基础定点放线	100%			
3、线路塔基基础开挖	95%			
4、线路基础浇注完成	66%			
4、光伏区基础放线	40%			
5、光伏区管桩施工	22%			
6、主变、GIS 设备	35%			
7、出图情况	电子版图纸，部分图纸			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措

				施
	支架	2018、05、10	2018.05.12	支架柱头 1400 个
	组件			
	汇流箱			
	逆变器			
	箱变			
	主变、GIS	2018、05、12	2018、05、12	满足施工条件，部分附件未到货
11、人员/机械情况	挖机 2 台、引孔机 2 台，打桩机 2 台，施工人员 95 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个管桩施工	20180422		20180422	
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	升压站土地问题			
未解决的协调问题解决进展	满足施工条件，业主已解决			
五、下周计划主要工作内容				
1、升压站定点放线	100%			
2、升压站基础浇注	100%			

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报

2、线路基础定 点放线	100%
3、线路塔基基 础开挖	100%
4、光伏区基础 放线	60%
5、光伏区管桩 施工	35%
6、主变、GIS	85%
7、出图情况	电子版图纸，部分图纸

填报人： 李金梁 审核人： 郭莹 时间： 2018 年 5 月 14 日




工程现场照片（含文字描述）：



召开监理例会



光伏区箱逆变基础钢筋检查

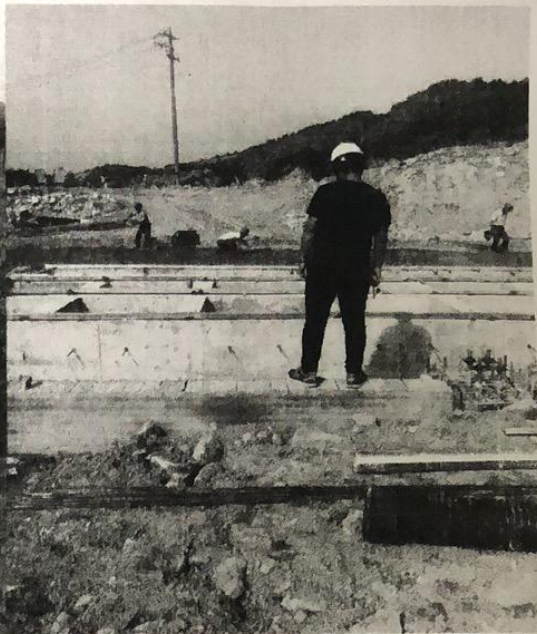

二次设备垫层浇筑



光伏区箱逆变基础浇筑



升压站接地变基础检查
