

监 理 周 报

项目名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

项目地：广东省佛山时三水区金港路 16 号

时间：2018/6/25—2018/7/1

编号：ZH-JXMB-005

本周 施工 概况	1、屋面桥架吊装完成 100%；安装完成 30%。 2、组件吊装完成 100%；安装完成 60%。
施工 质量 情况	组件安装过程中个别压块安装不到位，个别压块螺栓未拧紧； 桥架个别位置安装不顺直；
材料 进场 情况	本周无材料进场
材料 进场 检验	无
隐蔽 验收 情况	无隐蔽工程
发文 情况	本周下发编号为 ZH-JXMB-005 的监理会议纪要 下发编号为 ZH-JXMB-006 的通知单 下发编号为 ZH-JXMB-006 的联系单
收文 情况	未收到相关文件


安全情况	1、屋面采光带周围未设置安全警戒线。 2、现场给个别施工人员安全帽佩戴不符合要求，安全帽帽带未系。 3、现场临时用电不符合规范； 4、现场材料堆积散乱，施工方对材料整理不及时； 5、屋面垃圾清理不及时；						
下周工作要点	1、严格检查组件安装质量和电缆敷设质量，对存在质量问题的及时让施工方整改。 2、加强现场施工人员的安全意识，做好施工人员的安全交底工作。 3、督促施工单位上报开工前期资料、过程资料及材料进场的相关资料。 4、严格把管理现场的施工安全和施工质量。						
现场施工人员班组情况	现场施工人员 12 人						
天气	25	26	27	28	29	30	1
	多云转暴雨	晴	晴	晴	晴	晴	多云

编写人：吉海平

编制时间：2018 年 7 月 1 日



附现场照片

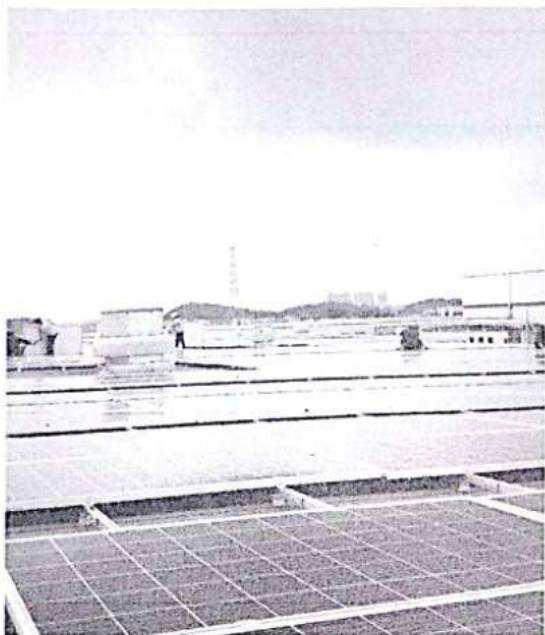


组件安装



桥架安装



组件吊装

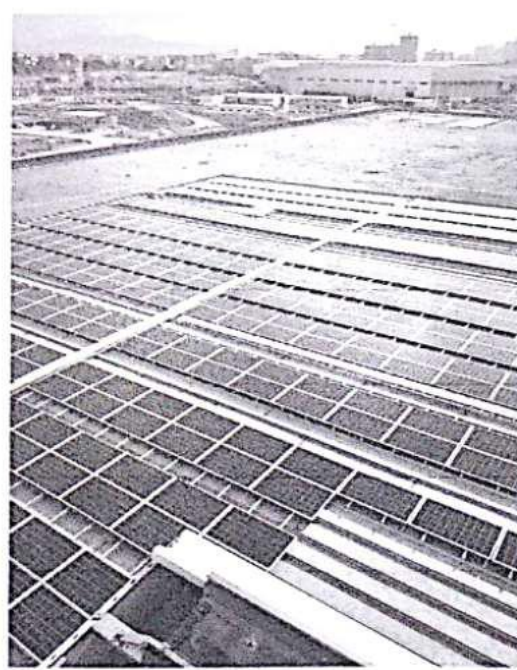

已安装完成区域

