

监 理 周 报

项目名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

项目地：广东省佛山时三水区金港路 16 号

时间：2018/7/16—2018/7/22

编号：ZH-JXMB—008

本周 施工 概况	1、四平方直流电缆敷设完成 100%。 2、接地扁铁施工完成 80%。 3、交流电缆敷设完成 85%。
施工 质量 情况	1、四平方线缆和交流电缆敷设后裸露的线头未做保护；
材料 进场 情况	本周无材料进场
材料 进场 检验	无
隐蔽 验收 情况	无隐蔽工程
发文 情况	本周下发编号为 ZH—JXMB—008 的监理会议纪要
收文 情况	未收到相关文件
安全 情况	现场施工人员未戴安全帽进行施工作业。

下周工作要点	1、严格检查四平方电缆 MC4 头子的制作质量，对存在质量问题的及时让施工方整改。 2、加强现场施工人员的安全意识，做好施工人员的安全交底工作。 3、督促施工单位上报开工前期资料、过程资料及材料进场的相关资料。 4、对施工中存在的施工质量问题及时整改。 5、加强现场施工人员安全的管理及技术交底工作。						
现场施工人员班组情况	现场施工人员 8 人						
天气	16	17	18	19	20	21	22
	晴	晴	多云	多云	多云	晴	晴


编写人：吉海平

编制时间：2018 年 7 月 22 日

附现场照片



4 平方线缆穿管

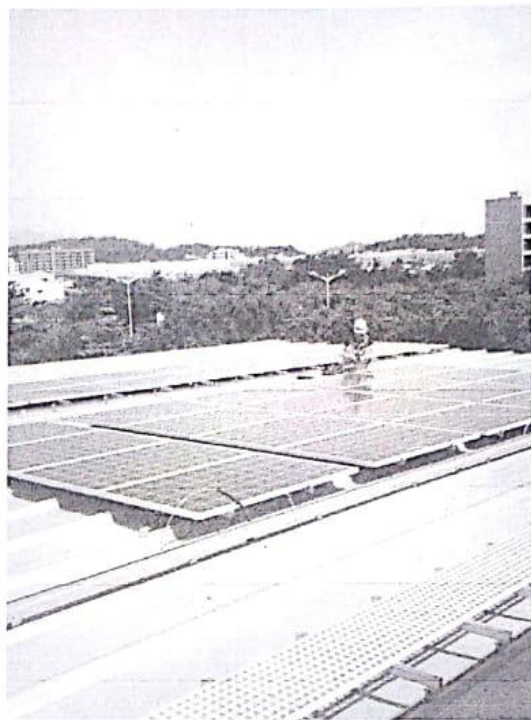

MC4 头子制作



垂直桥架安装



交流电缆敷设
