

编号：ZHJL-JLZB-2018004

监 理 周 报

工程名称：慈溪汇丽 2138.4KW_p、翔环 1354.32KW_p 分布式光伏电站项目

2018 年 06 月 第四期（总 12 期）

总监理工程师：胡德林

监理项目部（章）

报告日期：2018 年 06 月 03 日

监 理 周 报

一、本周工程实施情况

1. 施工进度：

本周四周五两天雨水天气无法施工，汇丽项目本周进度缓慢，主要原因是材料无法及时到位，人员数量不足，六月一日之前每天只有四人现场施工，六月一号后每天六人，现阶段更换六号楼屋顶彩钢瓦。翔环项目本周更换了三号楼彩钢瓦，做导水槽。本周6月3日建设单位下发了项目停工令。由于汇丽六号楼七号楼已经施工，等六号楼和七号楼换瓦完成进行全面停工。

2. 设计图纸情况

电子版图纸四份。

3. 工程资料情况

未见

4. 质量，安全情况

- (1)部分人未佩戴安全帽，现场已要求整改。
- (2)汇丽项目和翔环项目屋顶临边安全防护措施未做。
- (3)翔环屋顶的上下通道存在不安全因素，需要重新开通安全上下通道，确保安全。
- (4)本周通知单一份，联系单一份。

5. 需要协调事宜

材料无法及时到场，工程进度缓慢。

二、本周监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

1、工程进度控制：

督促施工单位计划实施情况

2、工程质量控制

每日现场进行巡检，发现问题现场要求整改。

3、安全生产管理控制


监督施工单位做好现场安全文明管理工作，确保现场工人的个人防护用品穿戴整齐

三、工程存在问题

- 4、工程资料和施工现场不同步。

四、下周监理工作重点

监督屋顶及上下通道安全防护措施工作的落实情况

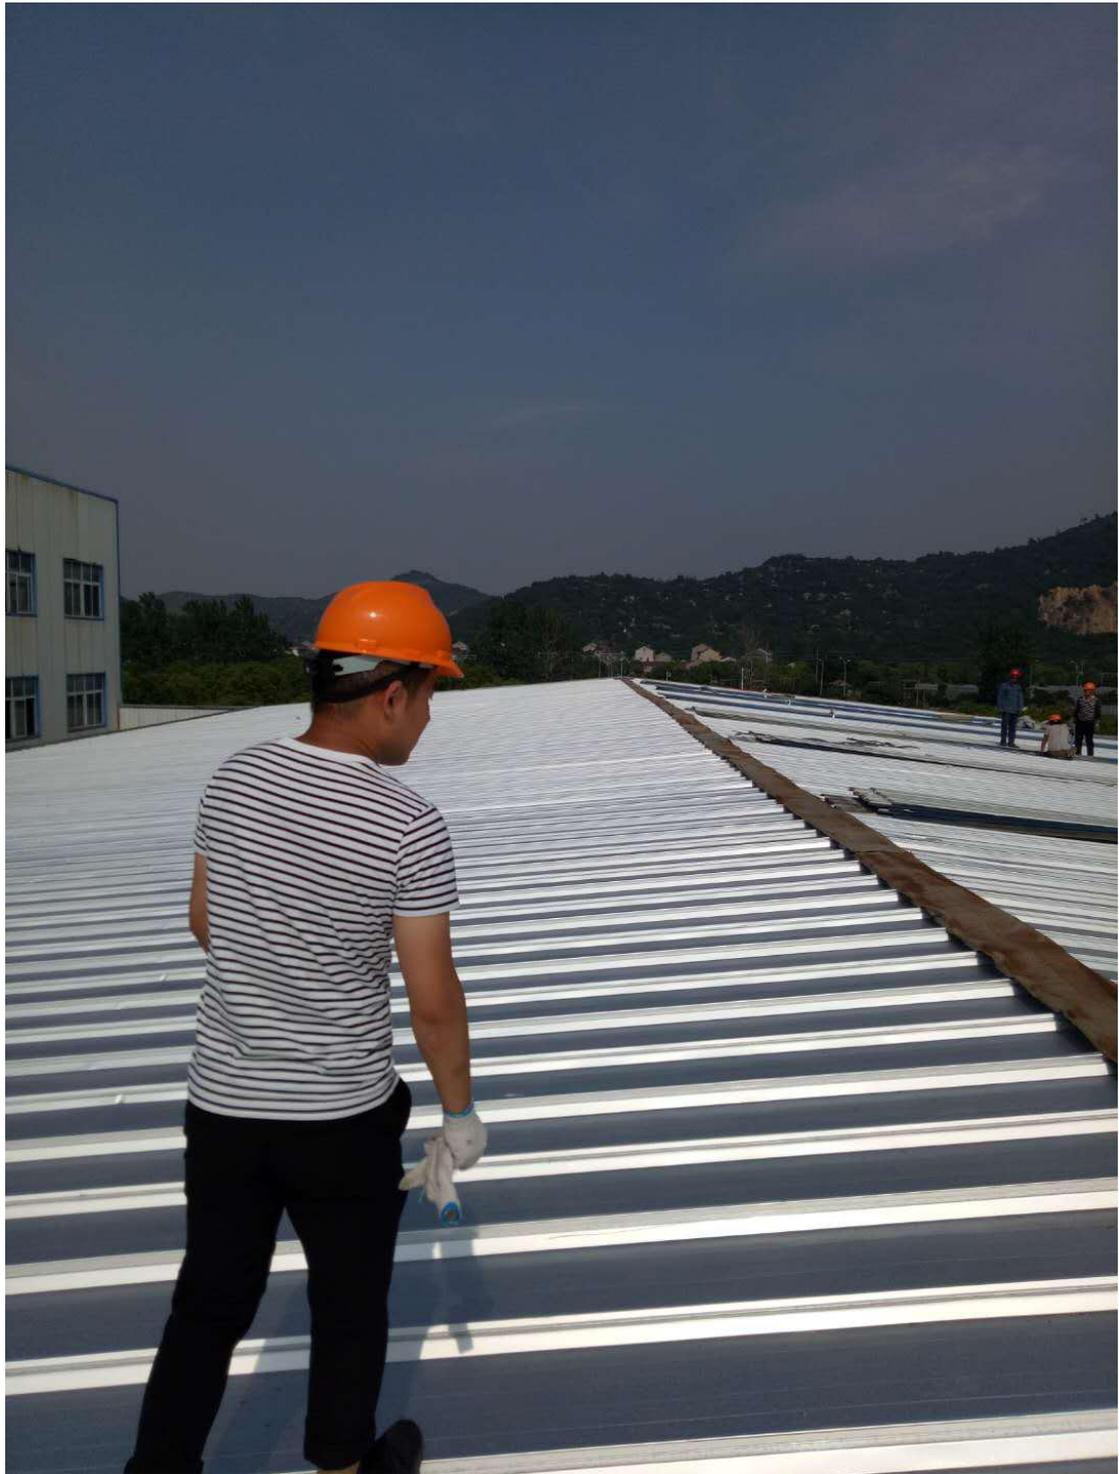



常州正衡电力工程监理有限公司

慈溪汇丽 2138.4KWp、翔环 1354.32KWp 分布式光伏电站项目

2018 年 06 月 3 日
