

虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目

监 理 周 报

第 一 期



(2018 年 5 月 2 日-2018 年 5 月 9 日)




由 扫描全能王 扫描创建

工程名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目	建设单位	虞城阿特斯新能源发展股份有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	河南省同信电力工程有限公司	江苏锡安机电建设有限公司	
本周施工内容及进度	1、施工现场对施工人员进行质量安全技术交底技术交底。 2、110kv 外线路基础浇筑施工, 支架钢筋绑扎施工, 一次二次预制舱基础施工, 部分验收。 3、光伏区管桩到货, 到货卸货, 并进行试桩。		
下周计划	1、110kv 外线路开始接地网线焊接并回填。 2、一次二次预制舱砌筑墙体。 3、光伏区加快打桩速率。		
安全文明施工情况	1、要求进场工人进行安全三级教育。 2、进场工人佩戴好安全帽, 并配有其它安全措施。 3、现场已竖立好安全文明标牌。		
施工质量	1、符合施工要求及规范, 现场施工质量可控		
设备材料进场情况	1、管桩、压桩机、进场。		
人员机械情况	人员:60 人 挖机 2 台、打桩机 2 台、		



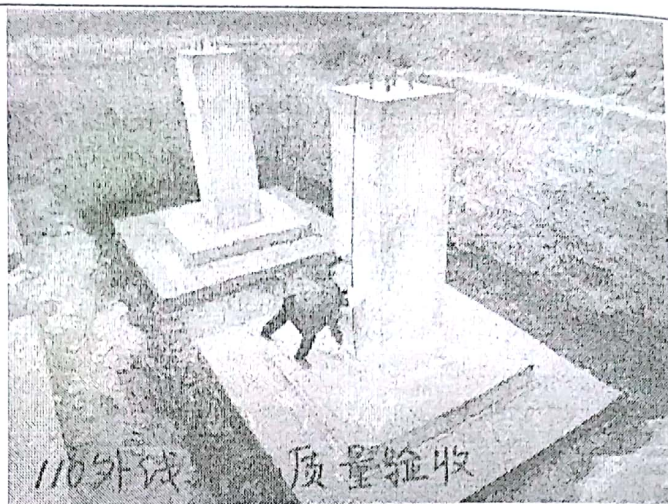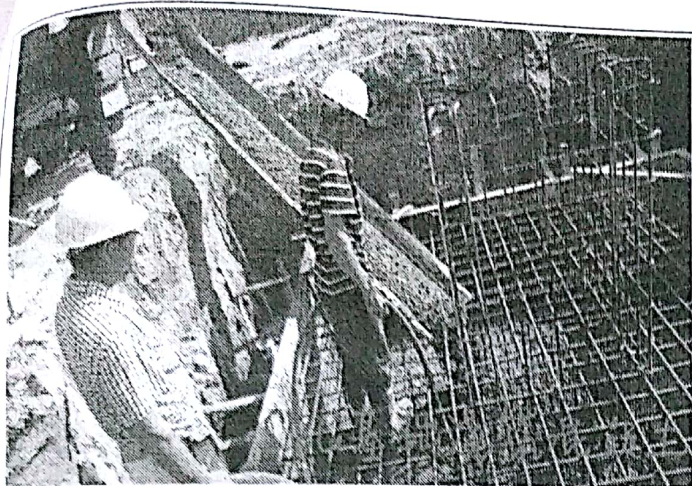

110外线 质量验收

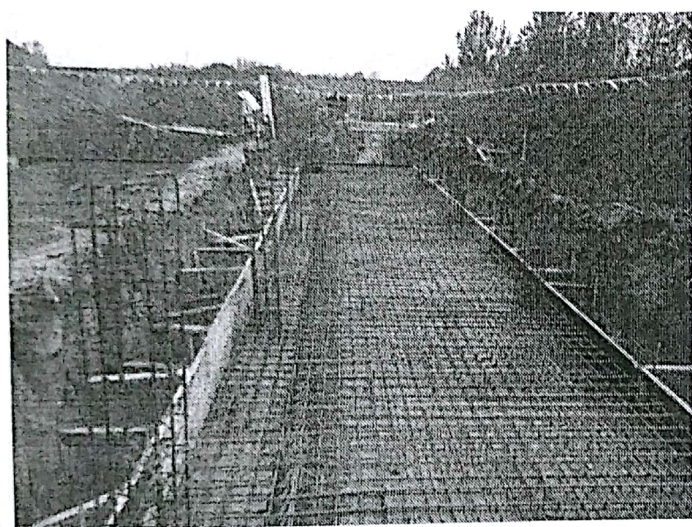

利农镇农村饮水工程

