

虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目

监 理 周 报

第 十 六 期

(2018 年 8 月 17 日-2018 年 8 月 24 日)




由 扫描全能王 扫描创建

工程名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目	建设单位	虞城阿特斯新能源发展股份有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司 河南省同信电力工程有限公司 江苏锡安机电建设有限公司 中 石化工建设有限公司		
本周施工内容及进度	利民镇： 1、利民镇光伏区消缺整改。 升压站： 1、生产楼屋顶避雷带焊接安装完成，卫浴隔墙砌筑，室外墙体保温板铺装。站外桥涵定位放线。 乔集、张集光伏区： 1、已打管桩 25787 根，完成总工作量的 64.2%。围栏完成 1660 米，箱变基础浇筑完成 23 个单元，支架安装 1311 组，累计完成 26.3%;组件安装 769 组，累计完成 15.4%; 2、截止到目前已进场材料：组件到货 29.1MW，支架到货 34.54MW，汇流箱 528 台，箱变 24 台，逆变 40 台。 开关站：1、受暴雨影响，无进展。 35KV 外线：线路、塔身消缺整改 。		



下周计划	利民光伏区：利民镇光伏区整改消缺。 升压站：站内外墙面砖铺贴，室外草坪地坪平整。 1、监控、消防、室外电，红外线对射，市政生活给水系统接入施工，卫浴间水管道敷设。 110KV 外线、对侧站：线路消缺。 张集、乔集光伏区： 1、场区排水。 2、打桩暂未工作面。 3、箱变浇筑 5 个。 4、支架、组件、电气安装视现场情况安排施工。 开关站：站内道路、散水工程、视频监控基本结束。 35KV 外线：全部施工完。
安全文明施工情况	1、要求进场工人进行安全三级教育。 2、进场工人佩戴好安全帽，并配有其它安全措施。 3、现场已竖立好安全文明标牌。
施工质量	1、符合施工要求及规范，现场施工质量可控
设备材料进场情况	1、管桩、压桩机、挖掘机、组件、支架进场。
人员机械情况	人员:张集乔集光伏区 400 人，开关站 30 人。 挖机 2 台、打桩机 11 台、叉车 4 台。



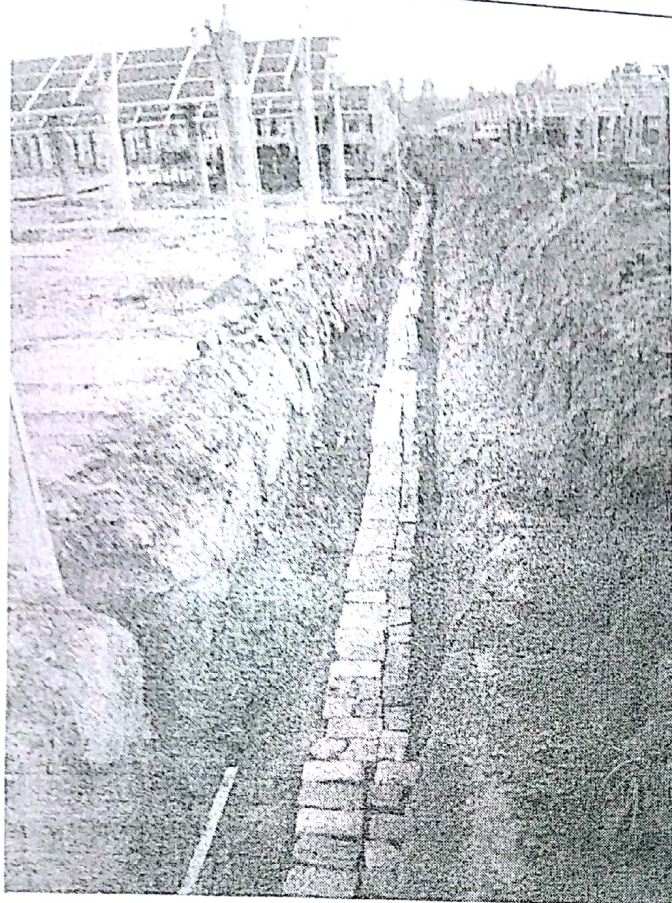

电缆铺砂盖砖



桩头至地面高度



场区排水工作



查看雨水浸泡设备情况

