

监 理 周 报

第 二 十 九 期

(2018 年 11 月 17 日-2018 年 11 月 23 日)



由 扫描全能王 扫描创建


工程名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目	建设单位	虞城阿特斯新能源发展股份有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司 河南省同信电力工程有限公司 江苏锡安机电建设有限公司 中石化工程建设有限公司		
本周施工内容及进度	利民镇： 1、初步验收，施工单位对不合格项进行整改。 升压站、110 外线： 1、初步验收不合格项消缺整改。 乔集、张集光伏区： 本周完成管桩 889 根（约 1.3MW），共计完成管桩 37439 根，完成总工作量的 90%（约 55.2MW）。箱变平台累计浇筑完成 47 个单元，完成总工作量的 98%。本周支架安装 97 组（约 1.35MW），支架共计安装 4565 组（约 54.3MW），完成总工作量的 90.6%。本周组件安装 114 组（约 1.3MW），组件共计安装 4544 组（约 54MW），完成总工作量的 90.2%。围栏共计完成 6000 米，完成总工作量的 70%。本周场区道路修建 0m²，场区道路共计修建 23326m²，完成总工作量的 74%。 电气部分：汇流箱接线共计完成 574 台，完成总工作量的 85.4%。箱逆变共计安装 47 台，完成总工作量的 98%。高压电缆敷设共计 7470 米，完成总工作量的 83%。 2. 截止到目前已进场材料：太阳能板 55.4MW，支架 57MW，汇流箱 672 台，箱变 48 台（含报废 8 台），逆变 48 台。 开关站：初步验收不合格项消缺整改。 35KV 外线：初步验收不合格项消缺整改。		
下周计划	利民光伏区：利民镇光伏区对初步验收不合格项整改消缺。		




	升压站：对初步验收不合格项整改消缺。 110KV 外线：对初步验收不合格项消缺整改 张集、乔集光伏区： 1. 场区道路修建 3500m²，占总量 10%。 2. 69、70 支架组件安装，其他区域视征地解决情况。 3. 箱变平台浇筑 1 台。 4. 已送电区域汇线绑扎，消缺整改，桩头防腐，警示标示张贴，质量安全检查。 5. 视频监控施工。 6. 箱变安装维修，逆变安装。 7. 高压电缆敷设。 8. 施工资料完善。 开关站：对初步验收不合格项整改消缺。 35KV 外线：对初步验收不合格项整改消缺 存在问题：1、光伏区部分单元及周边树木待砍伐。 2、部分发电单元征地问题急需解决。（已有部分安装队伍、电气施工队伍窝工） 3、69、70 发电单元常年积水，土质极差，电缆沟开挖困难，能否改为架空线路？ 4、泡水箱变维修事宜。
安全文明施工情况	1、要求进场工人进行安全三级教育。 2、进场工人佩带好安全帽，并配有其它安全措施。 3、现场已竖立好安全文明标牌。
施工质量	1、符合施工要求及规范，现场施工质量可控
设备材料进场情况	1、管桩、压桩机、挖掘机、组件、支架进场。



人员机械情况	人员:张集乔集光伏区 170 人。 挖机 1 台、打桩机 2 台、叉车 2 台。
--------	---

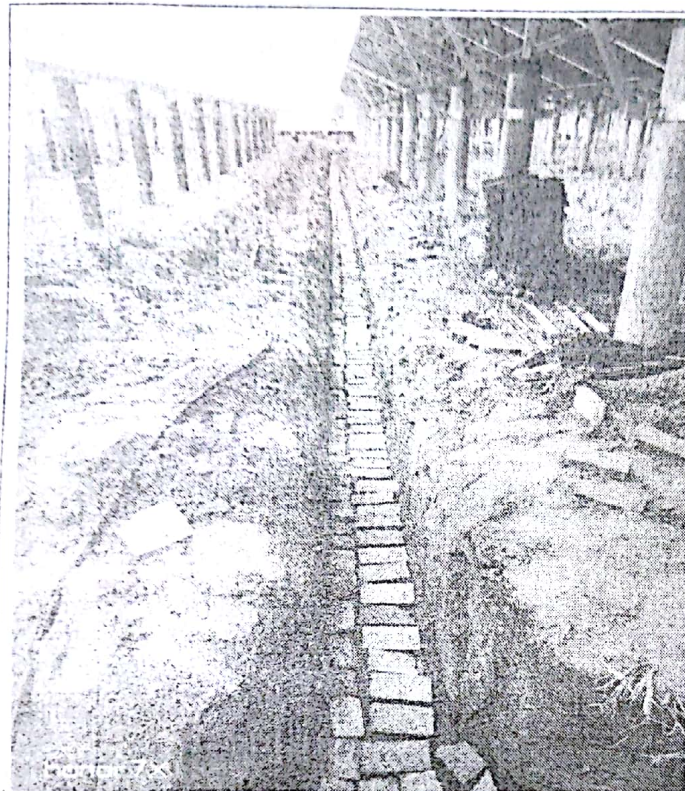

41 区直流电缆沟验收

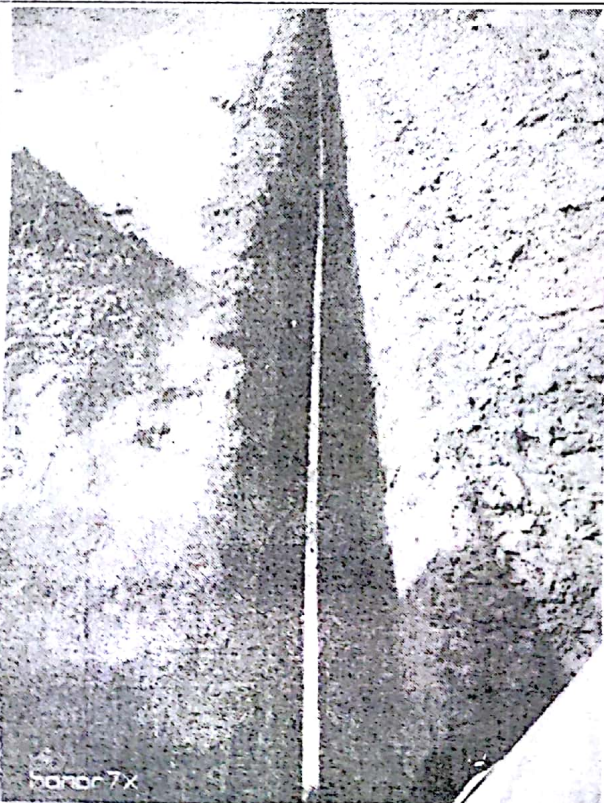

40#接地扁铁沟验收

40 直流电缆沟验收

