

监 理 周 报

第 三 十 三 期



(2018 年 12 月 16 日-2018 年 12 月 21 日)




工程名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目	建设单位	虞城阿特斯新能源发展股份有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司 河南省同信电力工程有限公司 江苏锡安机电建设有限公司 中石化工程建设有限公司		
本周施工内容及进度	利民镇： 1、压块边距不符合设计要求，消缺整改。 升压站、110 外线： 1、竣工验收合格。 乔集、张集光伏区： 本周完成管桩 127 根（约 0.4MW），共计完成管桩 39298 根，完成总工作量的 96.6%(约 58.4MW)。箱变平台累计浇筑完成 48 个单元，完成总工作量的 100%。本周支架安装 77 组（约 0.9MW），支架共计安装 4739 组（约 56.4MW），完成总工作量的 94%。本周组件安装 49 组（约 0.5MW），组件共计安装 4666 组（约 55.5MW），完成总工作量的 92.6%。围栏共计完成 6000 米，完成总工作量的 70%。本周场区道路修建 0m²，场区道路共计修建 23326m²，完成总工作量的 74%。 电气部分：汇流箱接线共计完成 610 台，完成总工作量的 91%。箱逆变共计安装 48 台，完成总工作量的 100%。高压电缆敷设共计 9000 米，完成总工作量的 100%。 2. 截止到目前已进场材料：太阳能板 57.5MW，支架 59MW，汇流箱 672 台，箱变 48 台，逆变 48 台。 开关站：竣工验收合格。 35KV 外线：竣工验收合格。		




下周计划	利民光伏区：利民镇光伏区对竣工验收不合格项整改消缺。 升压站：竣工验收合格 110KV 外线：竣工验收合格 张集、乔集光伏区： 1. 69、70 支架组件安装。 2. 已送电区域汇线绑扎，消缺整改，桩头防腐，警示标示张贴，质量安全检查。 3. 视频监控施工。 4. 低压侧未送电区域并网发电。 5. 全场消缺，成品保护。 开关站：竣工验收合格 35KV 外线：竣工验收合格 存在问题： 1、拟舍弃部分图纸待更新。
安全文明施工情况	1、要求进场工人进行安全三级教育。 2、进场工人佩戴好安全帽，并配有其它安全措施。 3、现场已竖立好安全文明标牌。
施工质量	1、符合施工要求及规范，现场施工质量可控
设备材料进场情况	1、管桩、压桩机、挖掘机、组件、支架进场。



人员机械情况	人员:张集乔集光伏区 60 人。 挖机 1 台、打桩机 2 台、叉车 2 台。
--------	--

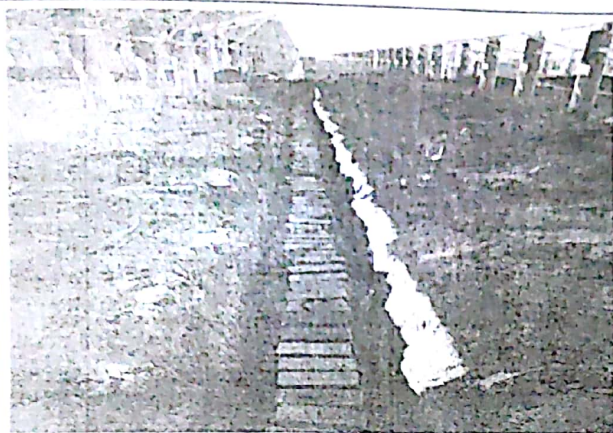

47#-48#高压电缆沟验收回填



49#接地沟验收回填

