

虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目

监 理 周 报

第 十 期

(2018 年 7 月 7 日-2018 年 7 月 13 日)



由 扫描全能王 扫描创建

工程名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目	建设单位	虞城阿特斯新能源发展股份有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司 河南省同信电力工程有限公司 江苏锡安机电建设有限公司 中石化工程建设有限公司		
本周施工内容及进度	1、利民镇光伏区桩基施工完成 44.7MW；利民镇光伏区支架安装完成 44.2MW；利民镇光伏区组件安装完成 44.2MW；围栏到货完成，围栏施工累计完成 8200 米；防雷接地施工完成 23 个单元。汇流箱接线 55 台。；箱变试验完成 36 台，已全部完成。 2、生产楼墙体砌筑，过梁模板加工，道路养护，室外照明线缆敷设完成，路缘石铺装。 3、110KV 线路检查消缺。 张集、乔集光伏区： 1、已打管桩 1786 根，南区试验检测桩 $\phi 300$ 的 24 根，已合格。 2、截止到目前已进场材料：$\phi 300$ 的 5M 长 5516 根、$\phi 300$ 的 10M 长 1764 根、$\phi 400$ 的 5 米 292 根、$\phi 400$ 的 10 米 10 根、$\phi 400$ 的 11 米 39 根、组件到货 78 箱 (0.734MW)，电缆 63 盘。 开关站：围墙抹灰完成，基础桩完成并检测完成。 35KV 外线：浇筑完成 57 级；组塔完成 3 级。		
下周计划	光伏区：汇流箱安装和接线完成。支架、组件安装剩余量安装完成。直流电缆敷设、接线完成。1*240 接线全部结束。 升压站：生产楼墙体砌筑完成；生产楼地面基层面完成；生产楼满堂架体完成；屋面底模支模完成。 110KV 外线、对侧站：线路消缺。 张集、乔集光伏区： 1、打管桩 10000 根、围栏安装 2000 米、道路修建 200 米。		



	2、组件安装 100 组、箱逆变桩基完成 20 个；浇筑完成 10 个。 开关站：设备基础完成，设备、线材到场 35KV 外线：塔基浇筑完成；组塔完成 35 级。
安全文明施工情况	1、要求进场工人进行安全三级教育。 2、进场工人佩戴好安全帽，并配有其它安全措施。 3、现场已竖立好安全文明标牌。
施工质量	1、符合施工要求及规范，现场施工质量可控
设备材料进场情况	1、管桩、压桩机、挖掘机、组件、支架进场。
人员机械情况	人员:70 人 挖机 2 台、打桩机 2 台。





工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯100MWp光伏发电项目

施工部位:损坏路面切割重修

2018/07/10 13:27

日期:2018年07月10日



工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯100MWp光伏发电项目

施工部位:生产楼墙体砌筑

2018/07/12 06:16

日期:2018年07月12日




工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯100MWp光伏发电项目

施工部位:35kV开关站设备平台

2018/07/13 10:33

日期:2018年07月13日

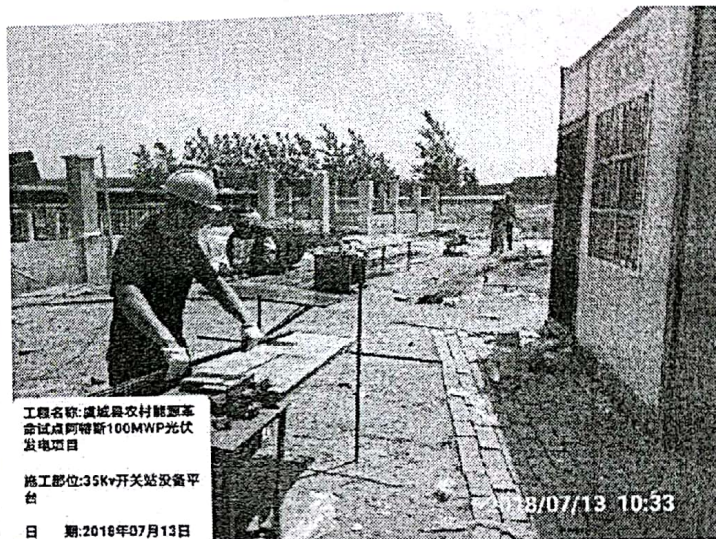

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯100MWp光伏发电项目

施工部位:35kV开关站设备平台

2018/07/13 10:33

日期:2018年07月13日



由 扫描全能王 扫描创建
