

虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目

监 理 周 报

第 十 二 期



(2018年7月21日-2018年7月27日)




由 扫描全能王 扫描创建

工程名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目	建设单位	虞城阿特斯新能源发展股份有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司 河南省同信电力工程有限公司 江苏锡安机电建设有限公司 中石化工程建设有限公司		
本周施工内容及进度	<p>利民镇光伏区 20、26 区补桩，组件支架安装，其它发电单元消缺整改。围栏施工累计完成 9000 米。箱变基础平台翻沿整改；箱变基础围栏和爬梯施工；箱变防水封堵。1-13 区支架组件整改；19-36 区电气消缺施工。</p> <p>升压站：</p> <p>1、生产楼屋梁模板安装完成，屋面梁板钢筋加工及安装，电工顶板敷设电线穿管及线盒。</p> <p>张集、乔集光伏区：</p> <p>1、已打管桩 7750 根（合计 12MW），围栏完成 1660 米，箱变基础浇筑完成 5 个单元，支架安装 100 组，组件安装 39 组；安装人员总计 110 人，65 区水平接地完成。</p> <p>截止到目前已进场材料：ϕ300 的 5M 长 13859 根、ϕ300 的 10M 长 4132 根、ϕ400 的 5 米 299 根、ϕ400 的 10 米 10 根、ϕ400 的 11 米 72 根、组件到货 15.6MW，支架到货 18.6MW。</p> <p>开关站：一二次设备、住人预制舱到货安装。</p> <p>35KV 外线：浇筑完成 60 基；立塔施工完成 58 基。接地完成 53 基；放线完成 14-40#。</p>		



下周计划	<p>利民光伏区：利民镇光伏区组件安装完成。利民镇光伏区支架安装完成。汇流箱接线完成；防雷接地施工完成；直流电缆敷设、接线完成。箱逆变平台栏杆安装完成。</p> <p>升压站：生产楼一层屋面浇筑完成，女儿墙砌筑完成。站内地坪石子铺装。</p> <p>110KV 外线、对侧站：线路消缺。</p> <p>张集、乔集光伏区：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、打管桩 5000 根、围栏安装 2000 米。 2、组件安装 5MW、箱、逆变基础平台浇筑完成 10 个。 <p>开关站：设备安装调试完成。</p> <p>35KV 外线：现场所有材料均已到场，在保证安全的情况下，下周完成全部施工任务。</p>
安全文明施工情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、要求进场工人进行安全三级教育。 2、进场工人佩戴好安全帽，并配有其它安全措施。 3、现场已竖立好安全文明标牌。
施工质量	<ol style="list-style-type: none"> 1、符合施工要求及规范，现场施工质量可控
设备材料进场情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、管桩、压桩机、挖掘机、组件、支架进场。
人员机械情况	<p>人员:张集乔集光伏区 120 人，开关站 30 人。</p> <p>挖机 2 台、打桩机 8 台、叉车 4 台。</p>



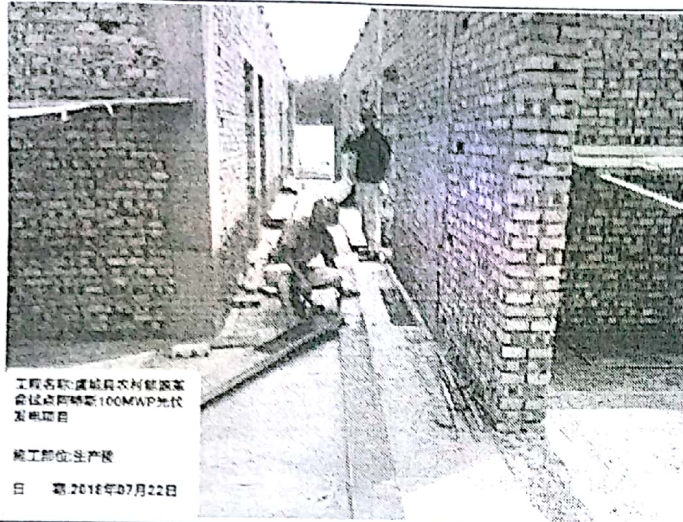

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目

施工部位: 生产楼

日期: 2018年07月22日



工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目

施工部位: 生产楼

日期: 2018年07月24日

2018/07/24 06:34

汇流箱检查



工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯100MW

活动内容: 40号箱变基础验收

日期: 2018年07月24日

2018/07/24 08:22



箱变浇筑

