

# 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 第十二期


|                           |      |                                 |        |                                 |
|---------------------------|------|---------------------------------|--------|---------------------------------|
| 项目：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目     |      | 填报周期：2018 年 08 月 27 日—09 月 02 日 |        |                                 |
| 一、项目总体建设进度汇总：             |      |                                 |        |                                 |
| 1、升压站-综合楼基础回填完成；          |      |                                 |        |                                 |
| 2、升压站-综合楼一层柱筋绑扎完成；        |      |                                 |        |                                 |
| 3、升压站-综合楼一层框架排架搭设完成；      |      |                                 |        |                                 |
| 4、外线开关站围墙基础完成，院墙完成 50%；   |      |                                 |        |                                 |
| 5、外线开关站基础浇筑完成；            |      |                                 |        |                                 |
| 6、升压站-开关站线路基槽开挖完成，垫层浇筑完成； |      |                                 |        |                                 |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况         |      |                                 |        |                                 |
| 1、道路工程                    |      | 风机基础 F14-F09 方向完成 100 米；        |        |                                 |
| 2、中控楼和升压站建筑工程             |      | 基础回填完成，层柱筋绑扎完成，一层框架排架搭设完成；      |        |                                 |
| 3、升压站安装调试过程               |      |                                 |        |                                 |
| 4、风力发电机组工程                |      |                                 |        |                                 |
| 5、场内电力线路工程                |      |                                 |        |                                 |
| 6、现场调试                    |      |                                 |        |                                 |
| 7、出图情况                    |      |                                 |        |                                 |
| 8、设备到货情况                  | 系统名称 | 计划到货日期                          | 实际到货日期 | 本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施 |
|                           |      |                                 |        |                                 |
|                           |      |                                 |        |                                 |
|                           |      |                                 |        |                                 |
|                           |      |                                 |        |                                 |
|                           |      |                                 |        |                                 |
|                           |      |                                 |        |                                 |
|                           |      |                                 |        |                                 |



|                                |                                                                     |      |      |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|
|                                |                                                                     |      |      |               |
| 9、人员/机械情况                      | 现场管理人员 8 人，泥工 20 人，电工 3 人，钢筋工 14 人，模板工 26 人；随车吊 1 台，洒水车 1 台，挖机 4 台。 |      |      |               |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |                                                                     |      |      |               |
| 项目主节点                          | 计划日期                                                                | 调整日期 | 完成日期 | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、道路工程                         | 20180615                                                            |      |      |               |
| 2、中控楼和升压站建筑工程                  | 20181030                                                            |      |      |               |
| 3、风机基础浇筑完成                     | 20190530                                                            |      |      |               |
| 4、外送线路完成                       | 20190530                                                            |      |      |               |
| 5、风机吊装开始-完成                    | 20190415-20190730                                                   |      |      |               |
| 6、升压站倒送电                       | 20190530                                                            |      |      |               |
| 7、风机完成240h 时间                  | 20190830                                                            |      |      |               |
| 四、主要协调问题及解决情况                  |                                                                     |      |      |               |
| 提出需要协调的问题                      |                                                                     |      |      |               |
| 未解决的协调问题解决进展                   |                                                                     |      |      |               |
| 五、下周计划主要工作内容                   |                                                                     |      |      |               |
| 1、道路工程                         |                                                                     |      |      |               |
| 2、中控楼和升压站建筑工程                  | 升压站-综合楼一层梁柱板浇筑完成；                                                   |      |      |               |
| 3、线路倒送电                        |                                                                     |      |      |               |
| 4、风力发电机组工程                     |                                                                     |      |      |               |
| 5、场内电力线路工程                     |                                                                     |      |      |               |
| 6、其他                           |                                                                     |      |      |               |

填报人: 常为 审核人: 叶景鸣 时间: 2018年09月02日

工程图片:

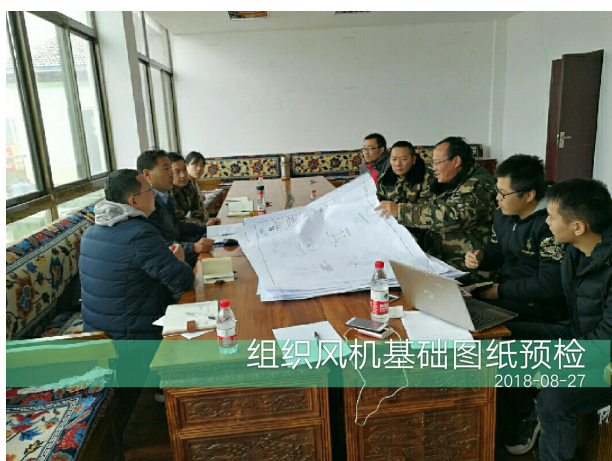





组织安全文明专项检查  
2018-08-30



组织开安全文明专题会议  
2018-08-30



质量月活动启动会  
2018-09-01



质量月活动启动会  
2018-09-01
