

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 第十五期

项目：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目		填报周期：2018 年 09 月 17 日—09 月 23 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、升压站-综合楼屋面具备浇筑条件；				
2、升压站-给水设备房剪力墙钢筋绑扎完成；				
4、升压站门卫房基础承台钢筋绑扎完成 50%；				
5、外线开关站满堂架搭设完成，一层顶板梁钢筋绑扎完成 75%；				
6、外线开关站一层满堂架搭设完成；				
7、外线 N6、N7、N8、N9、N10 塔基础浇筑完成；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程		F08-F01 路线开挖累计 2570 米；		
2、中控楼和升压站建筑工程		综合楼二层框架脚手架、模板、钢筋安装完成，给水设备房基础剪力墙钢筋绑扎完成，门卫房垫层浇筑完成，钢筋绑咋完成一半；外线开关站一层梁板柱钢筋绑扎完成 75%；		
3、升压站安装调试过程				
4、风力发电机组工程				
5、场内电力线路工程		风机基础基槽开挖完成 5 个；		
6、现场调试				
7、出图情况				
8、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施




9、人员/机械情况	管理人员 24 人，施工人员 89 人；随车吊 1 台，洒水车 1 台，压路机 1 台，挖机 5 台，装载机 1 台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、道路工程	20180615			
2、中控楼和升压站建筑工程	20181030			
3、风机基础浇筑完成	20190530			
4、外送线路完成	20190530			
5、风机吊装开始-完成	20190415-20190730			
6、升压站倒送电	20190530			
7、风机完成240h 时间	20190830			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、中控楼和升压站建筑工程	1、升压站综合结构封顶； 2、升压站给水设备房负一层浇筑完成； 3、升压站库房基础承台和圈梁浇筑完成； 4、风机基础土方开完完成 2 个，累计完成 6 个。垫层浇筑完成 3 个，累计完成 3 个。钢筋加工完成 1 个，累计完成 3 个； 5、送出线路开关站柴油发电机房框架结构浇筑完成，配电综合楼柱、梁、楼板钢筋、模板完成达到浇筑条件；			

	6、送出线路开关站围墙砌筑完成 90 米（不包括装修），累计完成 184 米。 7、送出线路开关站旱厕出±0.00； 8、送出线路 N8、N9、N10、G2 浇筑，N11 达到浇筑条件，G1-1 垫层浇筑完成。
3、线路倒送电	
4、风力发电机组工程	
5、场内电力线路工程	
6、其他	

填报人： 张 审核人： 张景鹏 时间： 2018 年 09 月 24 日

工程图片：

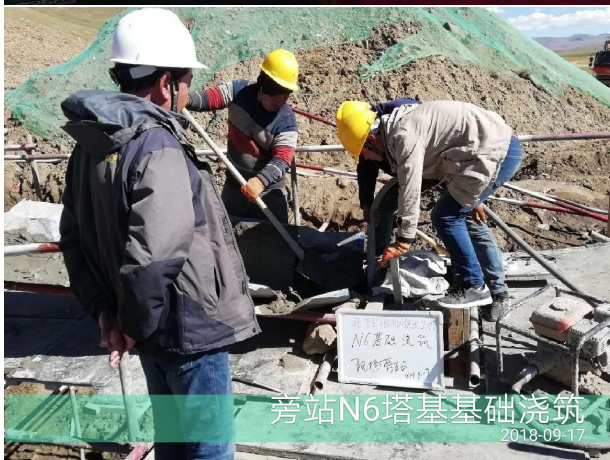



质量月土建交底培训
2018-09-17



验收线路N9塔基钢筋模板
2018-09-22



验收综合楼屋面钢筋模板
2018-09-22



检查外线开关站线管阻燃性能
2018-09-16



G4塔基基础拆模回填
2018-09-17



N6塔基基础浇筑
2018-09-18



送出线路N7塔基基础拆模
2018-09-21



送出线路开关站满堂架搭设
2018-09-17
